



Informe Trimestral

Obras – Presupuesto Participativo.

Primer Trimestre, 2025.





- **Contratista:** Marcell Nayetti Guzmán de la Rosa
Obra en construcción: Continuación de construcción del centro comunal en el sector Cajuilito Norte.
Método de pago: Cheque.





Clave Municipal No.

Ayuntamiento Municipal de Bari

REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO TESORERIA
Cta. INVERSIONES Y OBRAS MUNICIPALESFormulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

No. 027319

DIA	MES	AÑO
20	02	2025

RNC: 4-15-00012-4

DO74BRRD0000000001301023679

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARCELL MAYETTI GUZMAN DE LA ROSA

RD\$

638,748.35

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 35/100

Pesos
Moneda de curso legal

BanReservas

FIRMA(S)

027319 21411272713101301023679

38050

17/02/2025

Prog. Simbolo Fondo Comprobante No. Fecha

CONCEPTO	SIMBOLO	DENOMINACION	VALOR
SECTOR CAJULITO NORTE DE BARI PROV. PERAVIA, A TRAVES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN EL SIG. HIST. FINAN. A) MONTO PRESUP. RD\$ 817,459.45 B) MENOS AVANCE INICIAL DE UN 20% DE UN MONTO DE RD\$ 163,491.89 SEGUN COMP. DE GASTOS NO. 36658 D/F 22/10/2024, C) MENOS CUBICACION 1Y FINAL DE UN MONTO DE RD\$ 653,828.41 MENOS RET. DE LOS IMP. DE LEY DE UN			
TOTAL			

Firma Interesado: Marcell Guzman Cédula No. 402-2001382-1 Sello No.

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

CERTIFICACION DE RETENCION

RNC - 415000124

Número Comprobante: 038050

Fecha Comprobante:

Registrado

Número de Documento:

Fecha Cheque:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

R.N.C.

40220013821

NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:

MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA

DOMICILIO:

BANI, PROV. PERAVIA

PAGADO (RD\$)

MONTO: 638,748.35

EN LETRAS: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 35/100

RETENIDO (RD\$)

MONTO: 15,080.06

EN LETRAS: QUINCE MIL OCHENTA PESOS CON 06/100

CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA

10% ISR Y 100% DEL ITEBIS RETENCION A CONTRATISTAS DE OBRAS (PERSONA FISICA)

Descripción Impuesto	VALOR APLICABLE A RETENCION	PORCIENTO	VALOR
Itbis	9,694.33	100.00	9,694.33
ISR	53,857.37	10.00	5,385.74
Total Retención			15,080.06

FACT. NO. / NCF / REF. INCLUIDO EN EL PAGO

0127/2025,

PAGO INDIVIDUALMENTE

638,748.35

SUMA GLOBAL REPORTADA

653,828.41

RETENCION REALIZADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10, DE LA LEY NO. 253-12, SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO, PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

APROBADO POR:



ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

27319

COMPROBANTE NO.: 038050

FECHA 17/02/2025

COMPROBANTE DEL GASTO

ANTE: PAGO A PROVEEDOR

Etapas: Com ☐Dev ☐Pag ☐DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐Comp. que Modifica: CÓDIGO BENEFICIARIO:

RNC/CEDULA: 40220013821

BENEFICIARIO: MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA

DIRECCION: BANI, PROV. PERAVIA

TELEFONO: 849-201-1484

CUENTA BANCARIA: 130-102367-9 Inversion Obras Municipales

DETALLE

CUBICACION 1 Y FINAL PARA LA CONTINUACION DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR CAJULITO NORTE, BANI, PROV. PERAVIA, A TRAVES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN EL SIG. HIST. FINAN.: A) MONTO PRESUP. RD\$817,459.45 B) MENOS AVANCE INICIAL DE UN 20% DE UN MONTO DE RD\$163,491.89 SEGUN COMP. DE GASTOS NO. 36658 D/F 22/10/2024, C) MENOS CUBICACION 1 Y FINAL DE UN MONTO DE RD\$653,828.41 MENOS RET. DE LOS IMP. DE LEY DE UN MONTO DE RD\$15,080.06. ANEXOS: OFICIO NO.0127/2025 D/F 13/02/2025 EMITIDO POR EL DEPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO, CUBICACION DE LA OBRA, FOTOS DEL TRABAJO. O.S.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
15.03.0064.000	2.7.1.2.01		4302	Obras para edificación no residencial	653,828.41

"REVISION Y CONTROL"

ERIK ELIZABETH LARA VILLALONA
ENC. DPTO. DE CONTABILIDADOSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)JUAN ALEXANDER ZAPATA LARA
CONTRALOR MUNICIPALRAFAEL BALDAME DIAZ SANTANA
TESORERO MUNICIPALSANTO YNOCENCIO RAMIREZ B.
ALCALDE MUNICIPAL

Total General RD\$ 653,828.41

Retenciones

Itbis	100.00 %	9,694.33
ISR	10.00 %	5,385.74

Monto Neto a Pagar RD\$ 638,748.35

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Baní, Provincia Peravia,
13 de febrero del 2025.-

1502030064 271001
INV.

Oficio No.0127/2025.-
Rem/Cubicación.

Al : Señor
Ing. Santo Ramírez,
Alcalde Municipal,
Su Despacho._

Asunto : Remisión Cubicación 1 y Final.



Muy respetuosamente, me dirijo a usted para remitirle La
Cubicación 1 y Final para la **Continuación De Construcción De Centro Comunal**
En el sector Cajulito Norte, Baní, Provincia Peravia.

Total General de **RD\$817,459.45** (Ochocientos diecisiete mil,
cuatrocientos cincuenta y nueve pesos con 45/100).

Total cubicado acumulado de **RD\$817,320.30** (ochocientos diecisiete mil
trescientos veinte pesos con 30/100).

28,819.83

Avance inicial de **RD\$163,491.89** (Ciento sesenta y tres mil, cuatrocientos
noventa y un pesos con 89/100).

115,254.75

Total a pagar de **RD\$ 653,828.41** (Seiscientos cincuenta y tres mil,
ochocientos veintiocho pesos con 41/100).

(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)



**Dirección de Planeamiento
Urbano del**
Ing. Andrés de los Santos
Director Planeamiento Urbano
IADS-AAM/MT

Atentamente,



Proyecto No. CONTINUACION CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL - CAJULITO NORTE
Descripción: CUBICACION 1
Fecha: 2024
Contratista: ING. MARCELL NAYETTI

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
Monto Contrato Original: RD\$817,459.45
Monto Addendum a Contrato:
Monto de Avance : RD\$163,491.89
Contrato +Addendum+ Adicionales:
Inicio Contractual de la Obra:
Adicional Aprobado(%):



A firmarse con la firma del acta de inicio de obra
0.00%




No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Sub-Total	Total	CUBICADO ANTERIOR			CUBICADO ACTUAL			CUBICADO ACUMULADO			% Ejecutado
							CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	
1	PRELIMINARES															
1.1	LIMPIEZA INICIAL	1.00	PA	\$												
1.2	EXC. ZAPATA MURO DE 6" EN ENTRADA 8.00 ML	2.52	M3	\$	1,300.00	\$ 1,300.00										
1.3	EXC. ZAPATA DE COLUMNA	1.02	M3	\$	500.00	\$ 1,260.00										
					500.00	\$ 510.00										
2	Hormigón EN:					\$ 3,070.00										100%
2.1	LOSA HA. 210 KG/CM2 ESP. 0.12 M	15.04	M3	\$	18,500.00	\$ 278,240.00										
2.2	VIGA .25 X 0.45 X 8.00 HORMIGON 210 KG/ CM2	0.90	M3	\$	27,500.00	\$ 24,750.00										
2.3	VIGA DE AMARRE HA. 210 KG/CM2	3.15	M3	\$	38,430.53	\$ 121,056.17										
2.4	ZAPATA DE MURO	0.90	M3	\$	11,014.60	\$ 9,913.14										97%
2.5	ZAPATA DE COLUMNA	0.38	M3	\$	13,300.00	\$ 5,054.00										
2.6	COLUMNA 6 DE 1/2"	1.40	M3	\$	36,300.00	\$ 50,820.00										
2.7	DINTELES	1.28	M3	\$	35,000.00	\$ 44,800.00										
3	BLOCK EN:					\$ 534,633.31										
3.1	ANTEPECHO DE 6"	0.00	M2	\$	1,530.96	\$ -										
3.2	EN MURO 6"	66.28	M2	\$	1,530.96	\$ 101,472.03										
4	TERMINACIONES:					\$ 101,472.03										47%
4.1	PAÑETE EN MURO ANTEPECHO	0.00	M2			\$ -										
4.2	MOCHETA	0.00	ML			\$ -										
4.3	CANTO	0.00	ML			\$ -										
4.4	FINO DE LOSA	0.00	M2			\$ -										
4.4	ZABALETA	0.00	ML			\$ -										
5	INSTALACION ELECTRICA					\$ -										
5.1	CAJA DE BRAKERS (DE 8 A 16)	1.00	UD	\$	4,335.00	\$ 4,335.00										
5.2	LUCES CENTALES	18.00	UD	\$	700.00	\$ 12,600.00										
5.3	SALIDA DE ABANICO	4.00	UD	\$	700.00	\$ 2,800.00										
6	PLOMERIA					\$ 19,735.00										78%
6.1	DESAGUE DE TECHO DE 3" PVC	8.00	UD	\$	1,350.00	\$ 10,800.00										
6.2	VENTILACION EN BAÑOS DE 2" PVC	2.00	UD	\$	1,200.00	\$ 2,400.00										
7	LIMPIEZA					\$ 13,200.00										
7.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	\$	1,250.00	\$ 1,250.00										100%
	PARTIDAS NUEVAS					\$ 1,250.00										100%
	COLUMNAS PARA PÓRICO 12 DE 1/2 (.35".35)	0.74	M3	\$	38,646.30											
	VIGA 0.25*0.45*8.00 2 DE 1/2" Y 6 DE 3/4" (+ ADIC.)	0.90	M3	\$	43,661.56											
	LLENADO DE HUECOS	1.00	PA	\$	3,000.00											
	DEMOLICION DE COLUMNAS, DINTELES Y EXC.	1.00	PA	\$	2,500.00											
	SUB-TOTAL GENERAL			RD\$	673,360.34	\$ 673,360.34										
	GASTOS INDIRECTOS															
	DIRECCION TECNICA Y RESPONSABILIDAD															
	GASTOS ADMINISTRATIVOS			10.00%	\$ 67,336.03											
	FONDO DE PENSIONES			3.00%	\$ 20,200.81											
	CODIA			1.00%	\$ 6,733.60											100%
	SEGUROS Y FIANZAS			0.10%	\$ 673.36											
	TRANSPORTE			3.50%	\$ 23,567.61											
	ITBIS DEL 10%		18%	2.00%	\$ 13,467.21											
					\$ 12,120.49											
	TOTAL GENERAL			RD\$	817,459.45											

Dirección de Planeamiento
Ayuntamiento de Bani

MUNICIPALES
ING. MARCELL NAYETTI
CONTRATISTA
AYUNTAMIENTO DE BANI

AVANCE INICIAL RD\$ 163,491.89
TOTAL A PAGAR RD\$ 653,828.41

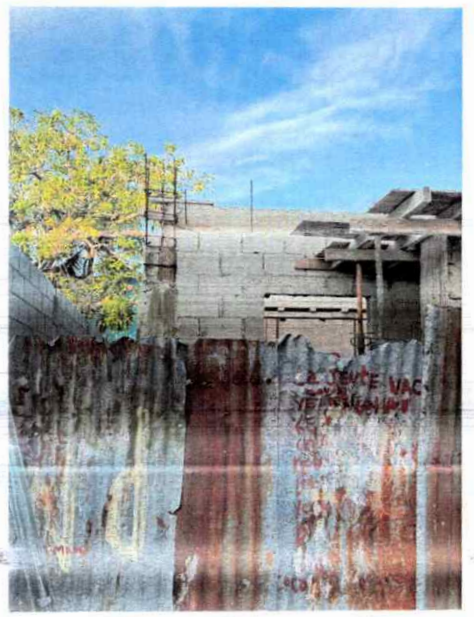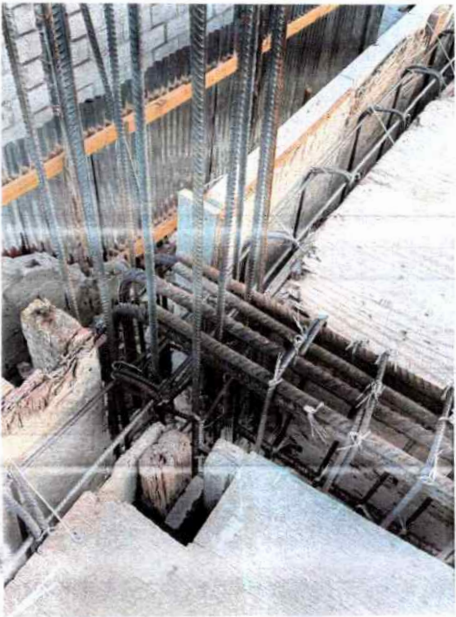

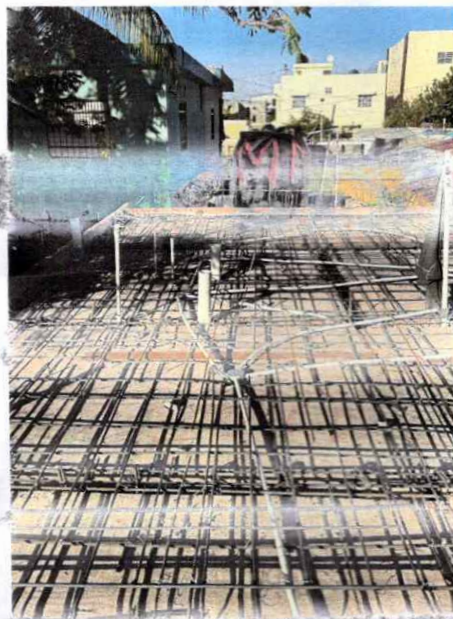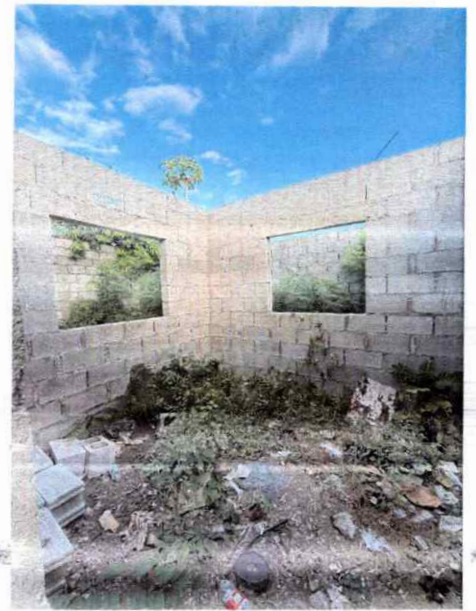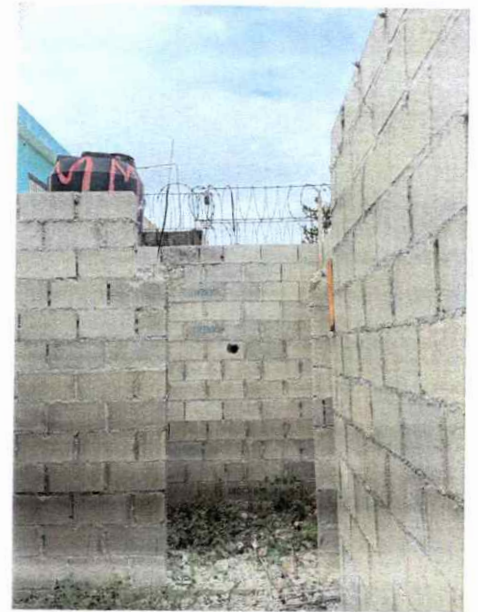



- **Contratista:** KDK Engineering and Design, SRL
- Obra en construcción:** Remozamiento de capilla en la comunidad de Cañafistol.
- Método de pago:** Transferencia





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

CERTIFICACION DE RETENCION

RNC - 415000124

Número Comprobante: 038120

Fecha Comprobante:

Registrado

Número de Documento:

Fecha Cheque:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

R.N.C.

132577231

NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:

KDK ENGINEERING AND DESIGN SRL

DOMICILIO:

C/ LAS MARGARITAS NO 05, BHD, BANI, PROV. PERAVIA

PAGADO (RD\$)

MONTO: 544,278.69

EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 69/100

RETENIDO (RD\$)

MONTO: 2,301.17

EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON 17/100

CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA

RETENCION 30% DEL ITEBIS A CONTRATISTAS DE OBRAS (PERSONA JURIDICA)

Descripción Impuesto

VALOR APPLICABLE A RETENCION

PORCIENTO

VALOR

Itbis

7,670.58

30.00

2,301.17

Total Retención

2,301.17

FACT. NO. / NCF / REF. INCLUIDO EN EL PAGO

AMB-2,

PAGO INDIVIDUALMENTE

544,278.69

SUMA GLOBAL REPORTADA

546,579.86

RETENCION REALIZADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10, DE LA LEY NO. 253-12, SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO, PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

APROBADO POR:



ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE NO.: 038120

FECHA 24/02/2025

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE: PAGO A PROVEEDOR

Etapas: Com

Dev

Pag

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación: ☐

Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO:

RNC/CEDULA: 132577231

BENEFICIARIO: KDK ENGINEERING AND DESIGN SRL

DIRECCION: C/ LAS MARGARITAS NO 05, BHD, BANI, PROV. PERAVIA

TELEFONO: 809-383-0614

CUENTA BANCARIA: 130-102367-9 Inversion Obras Municipales

DETALLE

CUBICACIÓN 1 Y FINAL, PARA EL REMOZAMIENTO DE CAPILLA, EN LA COMUNIDAD DE CAÑAFISTOL, BANI, PROV. PERAVIA. A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGÚN EL SIG. HIST. FINAN.: A) MONTO PRESUP. RD\$685,015.75 B) MENOS AVANCE 20% DE UN MONTO DE RD\$137,003.15, SEGÚN COMPROBANTE DE GASTO NO 036658 D/F 22/10/2024 C) MENOS CUBICACIÓN 1 Y FINAL DE UN MONTO BRUTO RD\$546,579.86 MENOS RET. DE LOS IMP. DE LEY RD\$ 2,301.17 ANEXOS: FACTURA POR PAGAR, OFICIO NO 0155/2025 D/F 21/02/2025 EMITIDO POR PLANEAMIENTO URBANO, CUBICACIÓN DE OBRA, FOTOS DEL TRABAJO REALIZADO Y POR LA COPIA DEL AVANCE INICIAL. A.M. NOTA: TRANSFERENCIA NO 9604748287.

Transf. a
Presupuesto
26-02-2025
25-03-2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RDS
15.03.0051.000	2.7.1.2.01		4302	Obras para edificación no residencial	546,579.86

“REVISIÓN Y CONTROL”

Total General RDS 546,579.86

ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA
ENC. DPTO. DE CONTABILIDADJUAN ALEXANDER ZAPATA LARA
CONTADOR MUNICIPAL

Retenciones

Irbis 30.00 % 2,301.17

OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPALRAFAEL RAHDAME DIAZ SANTANA
TESORERO MUNICIPALSANTO YNILCTO RAMIREZ B
ALCALDE MUNICIPAL

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto


Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RDS

544,278.69

Exento
120,436.46



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

415000124

C/ PRESIDENTE BILLINI # 419 ESQ. MELLA, BANI PROV. PERAVIA.

Tels. 809-346-4300 , Fax. 809-508-2744

FACTURA POR PAGAR

SUPLIDOR : KDK ENGINEERING AND DESIGN SRL
CODIGO No. : 001295
TELEFONO : 809-383-0614
DIRECCION : C/ LAS MARGARITAS NO.05, BHD, BANI, PROV.
RNC/CED : ~~PERAVIA~~

FECHA : 22/10/2024
FECHA. VENC. : 22/11/2024
Fact. No. / REF. : AMB-2
CONDICION :

Documento Num. :- 00021057

Monto Original : DOP 685,014.48

Valor Pend. : DOP 548,011.58

NCF :

RE-IMPRESION

CONCEPTO

DETALLE PRESUPUESTARIO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
15.03.0051.000	2.7.1.2.01	20	4302	Obras para edificación no residencial	548,011.58
Total General RD\$					548,011.58

Tatiana Kias

GARIAS
PREPARADO POR



AUTORIZADO POR
Fecha Impresión 24/2/2025

5



Alcaldía de Bani

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

Bani, Provincia Peravia,
21 de febrero del 2025.-

Oficio No.0155/2025.-
Rem/Cubicación.

Al : Señor
Ing. Santo Ramírez,
Alcalde Municipal,
Su Despacho._

Asunto : **Remisión Cubicación 1 y Final.**



Muy respetuosamente, me dirijo a usted para remitirle La Cubicación 1 y Final, para el **Remozamiento De Capilla**, En la comunidad de cañafistol, Bani, Provincia Peravia.-

Total General de **RD\$685,015.75** (Seiscientos ochenta y cinco mil, quince pesos con 75/100).

Total cubicado acumulado de **RD\$683,583.01** (Seiscientos ochenta y tres mil, quinientos ochenta y tres pesos con 01/100).

Avance inicial de **RD\$137,003.15** (Ciento treinta y siete mil, tres pesos con 15/100).

Total a pagar de **RD\$546,579.86** (Quinientos cuarenta y seis mil, quinientos setenta y nueve pesos con 86/100).

(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)


**Dirección de Planeamiento
Urbano del
Ayuntamiento de Bani**
Ing. Andrés De Los Santos
Director Planeamiento Urbano
IADS-AAM/MT

Atentamente,



Arq. Ángel Mañan
Director Obras Municipales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

Proyecto No. REMOZAMIENTO CAPILLA, CAÑAFISTOL
 Descripción: CUBICACION 1 Y FINAL
 Fecha: 2024
 Contratista: INDISE, SRL

Monto Contrato Original: RD\$685,015.75
 Monto Addendum a Contrato:
 Monto de Avance: RD\$137,003.15
 Contrato +Addendum+ Adicionales:
 Inicio Contractual de la Obra: A firmarse con la firma del acta de inicio de obra
 Adicional Aprobado(%): 0.00%

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Sub-Total	Total	CUBICADO ANTERIOR			CUBICADO ACTUAL			CUBICADO ACUMULADO			% Ejecutado
							CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	
1	PISOS Y REVESTIMIENTOS											\$ -				0%
1.1	PISOS EN CERAMICA ESPAÑOLA	63.00	M2	\$ 1,805.00	\$ 113,715.00						\$ -					
1.2	ZOCALOS EN PISOS	40.00	ML	\$ 319.72	\$ 12,788.80						\$ -					
1.3	DEMOLICION DE PISO PULIDO	63.00	M2	\$ 85.50	\$ 5,386.50						\$ -					
1.4	BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO	8.55	M2	\$ 622.25	\$ 5,320.24						\$ -					
						\$ 137,210.54										
2	IMPERMEABILIZACION:											\$ 196,336.00				103%
2.1	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE AREA. (Incluye SELLAR CON CEMENTO PLASTICO ASFALTICO PUNTOS CRITICOS + APLICAR UNA CAPA DE IMPRIMACION ASFALTICA + IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA ASFALTICA GRANULADA, TIPO APP DE 2.8 MM (4 KG/CM2), CON REFUERZO POLIESTER DE 130 gr/m2 + Limpieza y bote de desperdicio	355.62	M2	\$ 536.98	\$ 190,960.83					365.63	\$ 196,336.00					
						\$ 190,960.83										
3	TERMINACIONES											\$ 235,747.20				100%
3.1	PINTURA ACRILICA SUPERIOR EN TECHOS	354.24	M2	\$ 242.83	\$ 86,020.10					348.22	\$ 84,558.26					
3.2	PINTURA ACRILICA SUPERIOR MUROS	546.80	M2	\$ 242.83	\$ 132,779.44					551.40	\$ 133,896.46					
3.3	PINTURA NEGRA ESMALTE SUMINISTRO	4.00	GAL	\$ 1,828.08	\$ 7,312.32					4.00	\$ 7,312.32					
3.4	THINEER	2.00	GAL	\$ 715.08	\$ 1,430.16					2.00	\$ 1,430.16					
3.5	MANO DE OBRA PINTURA ESMALTE	1.00	PA	\$ 8,550.00	\$ 8,550.00					1.00	\$ 8,550.00					
						\$ 236,092.02										
	PARTIDAS NUEVAS											\$ 131,000.00				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA BOCINAS	2.00	UD	\$ 4,500.00						2.00	\$ 9,000.00					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA PARA PUERTA EN CASETA DE BOMBA (Incluye: 1/2 Plancha de Tola, Materiales de soldadura, Uso de Herramientas, M.O. Herreria, Pintura Negro Esmalte)	1.00	UD	\$ 5,500.00						1.00	\$ 5,500.00					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA CANDADO CON CAPUCHA DE CUBIERTA PARA PROTECCION	1.00	UD	\$ 1,500.00						1.00	\$ 1,500.00					



