



Alcaldía de Baní

¡Tu bienestar, nuestra visión!

INFORME TRIMESTRAL

Pagos de Obras

Presupuesto Participativo.

2DO Trimestre 2026.



Alcaldía de Baní


¡Tu bienestar, nuestra visión!

El presente documento refleja los pagos de las obras en proceso y ejecutadas correspondientes al Presupuesto Participativo durante el segundo trimestre de 2026.

Durante el período comprendido entre abril y junio de 2026, se realizaron desembolsos a favor de los siguientes contratistas, conforme a los compromisos asumidos para la ejecución de obras:

- **MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA**
Método de pago: Transferencia bancaria.
- **CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL**
Método de pago: Transferencia bancaria

Los pagos antes mencionados corresponden a la ejecución de múltiples obras contempladas dentro del Presupuesto Participativo, cuyos nombres de las obras se encuentran documentados en los expedientes anexos.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

CERTIFICACION DE RETENCION

RNC - 415000124

Número Comprobante: 042611

Fecha Comprobante:

Registrado

Número de Documento:

Fecha Cheque:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

R.N.C.

40220013821

NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:

MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA

DOMICILIO:

BANI, PROV. PERAVIA

PAGADO (RD\$)

MONTO: 1,637,087.65

EN LETRAS: UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON 65/100

RETENIDO (RD\$)

MONTO: 68,945.83

EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 83/100

CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA

RETENCION MANUAL

Descripción Impuesto	VALOR APLICABLE A RETENCION	PORCIENTO	VALOR
Itbis	176,784.19	100.00	31,821.15
ISR	176,784.19	10.00	17,678.42
Codia	1,767,841.75	0.10	1,767.84
FONDO DE PENSIONES	1,767,841.75	1.00	17,678.42

Total Retención

68,945.83

FACT. NO. / NCF / REF. INCLUIDO EN EL PAGO

0526/2026,0554/2026,0617/2026,0613/2026,0616/2026,0614/2026,0615/2026,

PAGO INDIVIDUALMENTE

1,637,087.65

SUMA GLOBAL REPORTADA

1,706,033.48

RETENCION REALIZADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10, DE LA LEY NO. 253-12, SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO, PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

28



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

CERTIFICACION DE RETENCION

RNC - 415000124

Número Comprobante: 042611

Fecha Comprobante:

Registrado

Número de Documento:

Fecha Cheque:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

R.N.C.

40220013821

NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:

MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA

DOMICILIO:

BANI, PROV. PERAVIA

PAGADO (RD\$)

MONTO: 1,637,087.65

EN LETRAS: UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON 65/100

RETENIDO (RD\$)

MONTO: 68,945.83

EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 83/100

CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA

RETENCION MANUAL

Descripción Impuesto

VALOR APLICABLE A RENTENCION

PORCIENTO

VALOR

APROBADO POR:

ERIK A ELIZABETH LARA VIELALONA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'P8'.

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: PAGO A PROVEEDOR

Etapas: Com ☐ Dev ☐ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐

Comp. que Modifica: _____

CODIGO BENIFICIARIO: _____

RNC/CEDULA: 40220013821

BENIFICIARIO: MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA

DIRECCION: BANI, PROV. PERAVIA

TELEFONO: 849-201-1484

CUENTA BANCARIA: 130-102367-9 Inversion Obras Municipales

*Transf. a
Aprobado
21-05-2026
J. Bani*

DETALLE

CUB. 1 Y FINALES DE LA TERMINACION DE CENTRO COMUNAL BARRACONES JESUS DE NAZARET, CONT. REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN SANTA ELENA, CONST. DE CONTENES BRISAS DEL NORTE CENTRAL EMMANUEL, CONST. DE ACERAS EN CONTENES SECTOR NUEV. ESPERANZA, REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS MELONES, CONSTR. DE ACERAS EN ALTO DE GUAZUMA NORTE Y REPARACION DE ACERAS FUNDO BARRIO EL PADRE. ATRAVES DE PRESUP. PARTIC Y ADM AÑO 2026. HISTORIAL FINANCIERO A) PRESUPUESTO TOTAL RD\$ 2,133,691.44 B) MENOS AVANCES DEL 20% POR UN MONTO DE RD\$426,738.27 SEGÚN COMPROBANTE DE GASTO NO. 042003 D/F 05/03/2026, C) CUB. 1 Y FINALES POR UN MONTO TOTAL RD\$1,706,033.48 MENOS RETENCION DE LOS IMPUESTOS DE LEY POR UN MONTO RD\$68,945.83. ANEXOS: FACTURAS POR MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2026, RECEPCIONES DE OBRAS, FOTOS, PRESUPUESTOS DE OBRAS Y COPIA DEL AVANCE INICIAL. E.G. CUENTA TRANSFERENCIA NO.762847655

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
15.03.0051.000	2.7.1.2.01		4409	Obras para edificación no residencial	120,849.19
15.03.0057.000	2.7.1.2.01		4409	Obras para edificación no residencial	295,800.00
11.01.0057.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	228,022.47
11.01.0056.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	227,589.64
11.01.0072.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	189,644.05
11.01.0060.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	227,611.20
11.01.0061.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	227,499.51
11.01.0055.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	189,017.42

"REVISION Y CONTROL"

ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA
ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD

YNGRID CAROLINA DIAZ
REGIDORA

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

JUAN ALEXANDER ZAPATA LARA
CONTRALOR MUNICIPAL

RAFAEL RAHOAME DIAZ SANTANA
TESORERO MUNICIPAL

SANTO YNLCIO RAMIREZ B.
ALCALDE MUNICIPAL

Total General RD\$ 1,706,033.48

Retenciones

Itbis	100.00 %	31,821.15
ISR	10.00 %	17,678.42
Codia	0.10 %	1,767.84
FONDO DE P	1.00 %	17,678.42

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,637,087.65

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente 1- Contabilidad 2- Tesorería 3- Contraloría 4- Presupuesto



Alcaldía de Bani

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

Bani, Provincia Peravia,

15 de mayo Del 2026.-

Oficio No.0617/2026.-

Rem/Cubicación.

1502030057 271201

\$295,800.00

1502030051 271201

\$120,849.19

Al

: Señor

Ing. Santo Ramírez,

Alcalde Municipal,

Su Despacho._



Asunto

: Remisión Cubicación 1 y Final.

Muy Respetuosamente, Me Dirijo A Usted Para Remitirle La Cubicación 1 Y Final, Para El Proyecto De **Terminación Centro Comunal**, en el Sector Jesús De Nazaret, Bani, Prov. Peravia, a través de **presupuesto participativo**.

Total General De **RD\$520,963.47** (Quinientos Veinte Mil, Novecientos Sesenta Y Tres Pesos Con 47/100).

Cubicación Actual De **RD\$520,841.89** (Quinientos Veinte Mil, Ochocientos Cuarenta Y Un Pesos Con 89/100).

Avance Inicial De **RD\$104,192.69** (Ciento Cuatro Mil, Ciento Noventa Y Do Pesos Con 69/100).

Total A Pagar De **RD\$416,649.19** (Cuatrocientos Dieciséis Mil, Seiscientos Cuarenta Y Nueve Pesos Con 19/100).


Dirección de Planeamiento
Urbano del
Ayuntamiento de Bani

Ing. Andrés De Los Santos

Director Planeamiento Urbano

Atentamente,


Arg. Angel Mañan
Director Obras Municipales

IADS-AAM/MT



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

DEPARTAMENTO DE OFICINA TECNICA

"Una Nueva Visión"

RECEPCIÓN DE OBRA

Por este medio la Dirección de Obras Municipales, suscribiendo Angel Mañan, Encargado del Departamento, hago constar que hemos recibido de manera Satisfactoria los trabajos de ingeniería correspondiente a la siguiente obra: **Terminación De Centro Comunal, Barrancones Jesús De Nazaret.**

CERTIFICAMOS, que las actividades a realizar, descritas tanto en el documento de contrato como en el presupuesto de partidas y actividades, fueron ejecutadas cumpliendo con los requerimientos y reglamentaciones establecidas y avaladas en ordenanzas y resoluciones, emitidas para proyectos de esta índole.

En el Municipio de Bani, Provincia Peravia, en fecha: **12 de Mayo de 2026**, para los fines que la empresa **ING. MARCELL NAYETTI GUZMAN** portador del **RNC: 40220013821**, considere de lugar.

Sin otro en particular,


Angel Mañan

Director De Obras Municipales




Barrancónes Jesús de Naz.











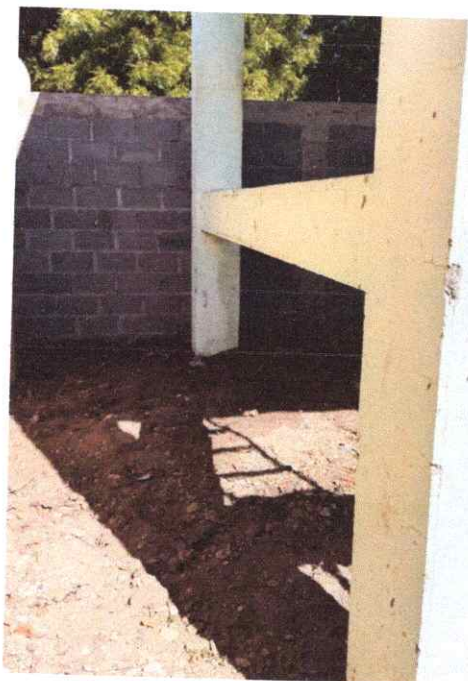




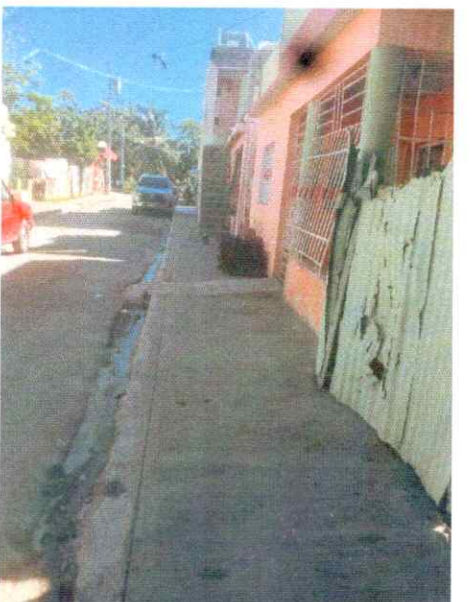

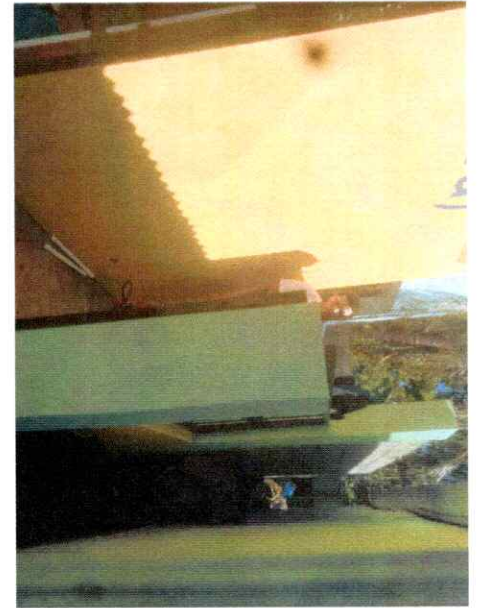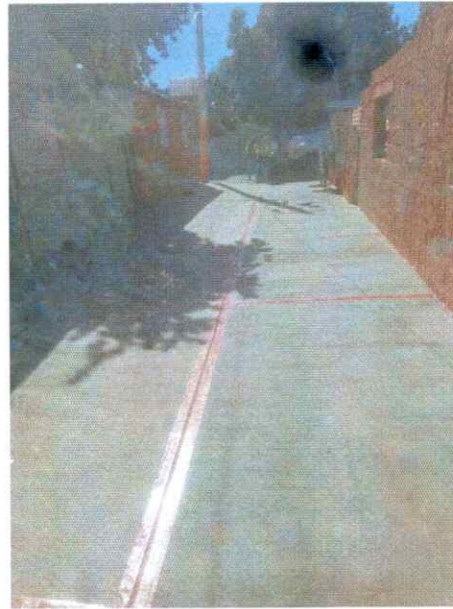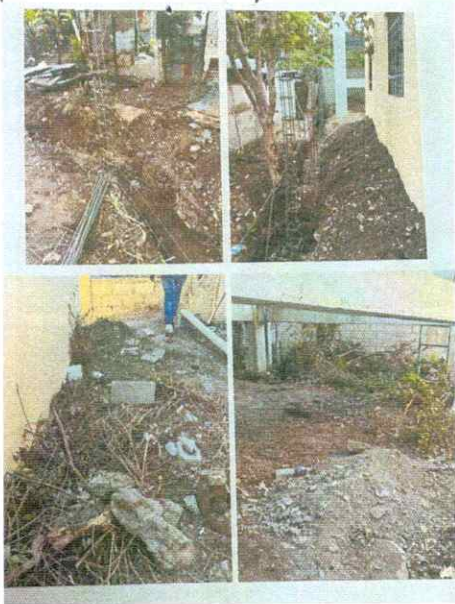

0617

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Proyecto No. **TERMINACION CENTRO COMUNAL - BARRANCONES JESUS DE NAZARET**
 Descripción: **CUBICACION 1 Y FINAL**
 Fecha: **abr-26**
 Contratista: **ING. MARCELL NAYETTI GUZMAN**

Monto Contrato Original: **RD\$520,963.47**
 Monto Addendum a Contrato:
 Monto de Avance: **RD\$104,192.69**
 Contrato +Addendum+ Adicionales:
 Inicio Contractual de la Obra: **A. firmarse con la firma del acta de inicio de obra**
 Adicional Aprobado(%): **0.00%**

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Sub-Total	Total	CUBICADO ANTERIOR			CUBICADO ACTUAL			CUBICADO ACUMULADO			% Ejecutado
							CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	
1	PRELIMINARES											\$ 10,844.00				#DIV/0!
1.1	EXCAVACION ZAPATA DE MURO 18.40*0.45*0.70	5.79	M3	\$ 640.00	\$ 3,705.60					6.48	\$ 4,147.20					
1.2	EXCAVACION ZAPATA COLUMNAS 0.80*0.75*0.70 (8UD)	3.36	M3	\$ 640.00	\$ 2,150.40					3.36	\$ 2,150.40					
1.3	EXCAVACION ZAPATA COLUMNAS 0.97*0.75*0.70 (2UD)	1.01	M3	\$ 640.00	\$ 646.40					-	\$ -					
1.4	RELLENO DE REPOSICION	5.01	M3	\$ 280.00	\$ 1,402.80					5.08	\$ 1,422.40					
1.5	BOTE MATERIAL EXCAVADO	5.68	M3	\$ 550.00	\$ 3,124.00					5.68	\$ 3,124.00					
					\$ 11,029.20							\$ 111,511.44				
2	HORMIGÓN ARMADO															
2.1	ZAPATA DE MURO 18.40*0.45*0.25	2.07	M3	\$ 11,861.07	\$ 24,552.41					2.32	\$ 27,517.68					
2.2	ZAPATA DE COLUMNAS 0.80*0.75*0.25 (8ud)	1.20	M3	\$ 12,061.29	\$ 14,473.55					1.54	\$ 18,574.39					
2.3	ZAPATA DE COLUMNAS 0.97*0.75*0.25 (2ud)	0.36	M3	\$ 12,061.29	\$ 4,342.06					-	\$ -					
2.4	COLUMNAS 0.20*0.15*2.45H (10ud)	0.74	M3	\$ 48,018.04	\$ 35,533.35					0.62	\$ 29,771.18					
2.5	VIGA DE AMARRE 0.15M X 0.20M	0.78	M3	\$ 44,010.11	\$ 34,327.89					0.81	\$ 35,648.19					
					\$ 113,229.26							\$ 105,090.52				
3	MAMPOSTERÍA															
3.1	MURO DE 6" BNP	9.52	M2	\$ 1,578.37	\$ 15,026.08					10.16	\$ 16,036.24					
3.2	MURO DE 6" SNP	47.60	M2	\$ 1,593.67	\$ 75,858.69					55.88	\$ 89,054.28					
					\$ 90,884.77							\$ 19,928.56				
4	TERMINACIONES															
4.1	FRAGUACHE EN COLUMNAS VERJA FRONTAL	6.24	M2	\$ 87.38	\$ 545.25					11.55	\$ 1,009.24					
4.2	PANETE EN MURO (sin andamios)	9.49	M2	\$ 497.23	\$ 4,718.71					9.49	\$ 4,718.71					
4.3	PANETE EN COLUMNAS	6.24	M2	\$ 497.23	\$ 3,102.72					11.55	\$ 5,743.01					
4.4	MOCHETA	8.16	ML	\$ 220.00	\$ 1,795.20					8.16	\$ 1,795.20					
4.5	CANTOS	44.32	ML	\$ 120.00	\$ 5,318.40					55.52	\$ 6,662.40					
					\$ 15,480.28							\$ 152,835.04				
5	MISCELANEOS															
5.1	HIERROS EN VERJA FRONTAL	76.53	PIE2	\$ 350.00	\$ 26,785.50					75.63	\$ 26,470.60					
5.2	PUERTA EN VERJA FRONTAL	26.15	PIE2	\$ 355.00	\$ 9,283.25					25.82	\$ 9,166.10					
5.3	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA	80.00	ML	\$ 1,331.23	\$ 106,498.40					25.25	\$ 33,613.56					
5.4	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON LIGADORA	40.00	M2	\$ 1,141.87	\$ 45,674.80					73.20	\$ 83,584.88					
5.5	PINTURA ACRILICA SUPERIOR	42.97	M2	\$ 238.87	\$ 10,264.24					-	\$ -					
					\$ 198,506.19							\$ 28,820.00				
	PARTIDAS NUEVAS															
	DEMOLICION DE ACERAS	73.20	M2	\$ 100.00						73.20	\$ 7,320.00					
	BOTE DE MATERIAL PRODUCTO DEL ACONDICIONAMIENTO Y DEMOLICION	20.00	M3	\$ 550.00						20.00	\$ 11,000.00					
	BOTES (LIMPIEZA EN ZONAS CON DESPERDICIOS)	10.00	M3	\$ 550.00						10.00	\$ 5,500.00					
	LIMPIEZA CONT. Y FINAL	1.00	PA	\$ 5,000.00						1.00	\$ 5,000.00					



Alcaldía de Bani

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

Bani, Provincia Peravia,
15 de mayo Del 2026.-
Oficio No.0613/2026.-
Rem/Cubicación.

1100010060 27 2401
mu,

Al : Señor
Ing. Santo Ramírez,
Alcalde Municipal,
Su Despacho._



Asunto : **Remisión Cubicación 1 y Final.**

Muy Respetuosamente, Me Dirijo A Usted Para Remitirle La Cubicación 1 Y Final, Para El Proyecto De **Reparación Aceras y Contenes + 1 Baden**, en el Sector Sanata Elena, Bani, Prov. Peravia, a través de **presupuesto participativo**.

Total General De **RD\$284,600.52** (Doscientos Ochenta Y Cuatro Mil, Seiscientos Pesos Con 52/100).

Cubicación Actual De **RD\$284,531.30** (Doscientos Ochenta Y Cuatro Mil, Quinientos Treinta Y Un Pesos Con 30/100).

Avance Inicial De **RD\$56,920.10** (Cincuenta Y Seis Mil, novecientos veinte Pesos Con 10/100).

Total A Pagar De **RD\$227,611.20** (Doscientos Veintisiete Mil, Seiscientos Once Pesos Con 20/100).


Dirección de Planeamiento
Urbano del
Ayuntamiento de Bani
Ing. Andrés De Los Santos
Director Planeamiento Urbano

Atentamente,


Arq. Angel Mañan
Director Obras Municipales

IADS-AAM/MT



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

DEPARTAMENTO DE OFICINA TECNICA

"Una Nueva Visión"

RECEPCIÓN DE OBRA

Por este medio la Dirección de Obras Municipales, suscribiendo Angel Mañan, Encargado del Departamento, hago constar que hemos recibido de manera Satisfactoria los trabajos de ingeniería correspondiente a la siguiente obra: **Reparación De Aceras Y Contenes + Construcción De (1) Badén, Santa Elena.**

CERTIFICAMOS, que las actividades a realizar, descritas tanto en el documento de contrato como en el presupuesto de partidas y actividades, fueron ejecutadas cumpliendo con los requerimientos y reglamentaciones establecidas y avaladas en ordenanzas y resoluciones, emitidas para proyectos de esta índole.


En el Municipio de Bani, Provincia Peravia, en fecha: **12 de Mayo de 2026**, para los fines que la empresa **ING. MARCELL NAYETTI GUZMAN** portador del **RNC: 40220013821**, considere de lugar.

Sin otro en particular,

Angel Mañan

Director De Obras Municipales

REPARACION DE ACERAS EN EL BARRIO SANTA ELENA.

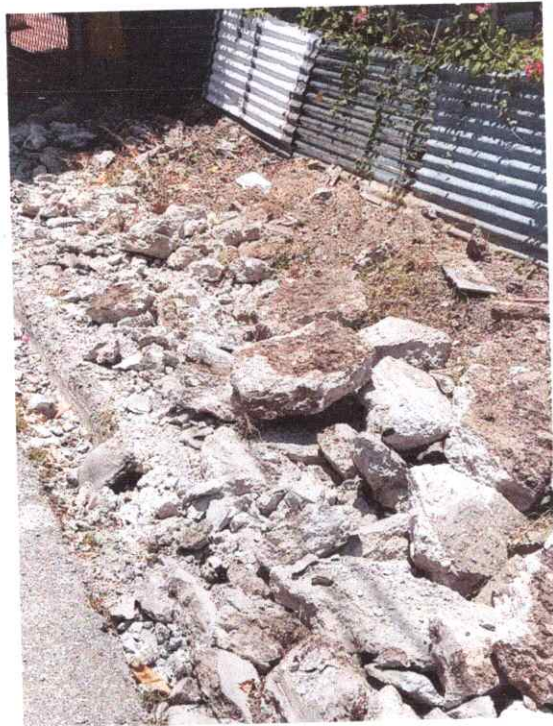





0613

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Proyecto No. REPARACION ACERAS Y CONTENES + (1) BADÉN - SANTA ELENA
Descripción: CUBICACION 1 Y FINAL
Fecha: may-26
Contratista: ING. MARCELL NAYETTI GUZMAN

Monto Contrato Original: RD\$284,600.52
Monto Addendum a Contrato:
Monto de Avance: RD\$56,920.10
Contrato +Addendum+ Adicionales:
Inicio Contractual de la Obra: A firmarse con la firma del acta de inicio de obra
Adicional Aprobado(%): 0.00%

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Sub-Total	Total	CUBICADO ANTERIOR			CUBICADO ACTUAL			CUBICADO ACUMULADO			%
							CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	
												\$ 20,017.38				63%
1	PRELIMINARES															
1.1	DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES EN MAL ESTADO	146.00	M2	\$ 122.00	\$ 17,812.00					91.45	\$ 11,156.90					
1.2	BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO	18.98	M3	\$ 550.00	\$ 10,439.00					11.87	\$ 6,528.50					
1.3	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN AREA DE ACERA	146.00	M2	\$ 25.50	\$ 3,723.00					91.45	\$ 2,331.98					
					\$ 31,974.00							\$ 137,358.89				69%
2	HORMIGON ARMADO															
2.1	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON LIGADORA	146.00	M2	\$ 1,141.87	\$ 166,713.02					91.45	\$ 104,424.01					
2.2	REPARACION CONTENES	50.00	ML	\$ 665.62	\$ 33,281.00					49.48	\$ 32,934.88					
					\$ 199,994.02							\$ 4,411.15				100%
3	LIMPIEZA															
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ 4,411.15	\$ 4,411.15					1.00	\$ 4,411.15					
					\$ 4,411.15							\$ 74,534.27				
	PARTIDAS NUEVAS															
	CONTENES	10.64	ML	\$ 1,331.24						10.64	\$ 14,164.39					
	CONSTRUCCION DE BADEN															
	CORTE DE ASFALTO	12.40	ML	\$ 100.00						12.40	\$ 1,240.00					
	DEMOLICION CARPETA ASFALTICA	13.64	M2	\$ 150.00						13.64	\$ 2,046.00					
	EXCAVACION DE BADEN	10.91	M3	\$ 500.00						10.91	\$ 5,455.00					
	BOTE PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION	1.00	UD	\$ 2,500.00						1.00	\$ 2,500.00					
	ACONDICIONAMIENTO Y NIVELACION	12.40	M2	\$ 80.00						12.40	\$ 992.00					
	HORMIGON ARMADO EN BADEN 210 KG/CM2	4.09	M3	\$ 9,025.00						4.09	\$ 36,912.25					
	FROTADO+PULIDO+ESCOBILLON	13.64	M2	\$ 450.00						13.64	\$ 6,138.00					
	HORMIGON CICLOPEO	0.35	M3	\$ 8,818.92						0.35	\$ 3,086.62					
	SENALES DE PRECAUCION	1.00	UD	\$ 2,000.00						1.00	\$ 2,000.00					
												\$ 236,321.68				100%
	SUB-TOTAL GENERAL			RD\$ 236,379.17		\$ 236,379.17										
	GASTOS INDIRECTOS															
	SEGUROS Y FIANZAS			3.50%	\$ 8,273.27					3.5%	\$ 8,271.26					
	TRANSPORTE			1.00%	\$ 2,363.79					1.0%	\$ 2,363.22					
	PENSIONES Y JUBILACION			1.00%	\$ 2,363.79					1.0%	\$ 2,363.22					
	CODIA			0.10%	\$ 236.38					0.1%	\$ 236.32					
	GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%	\$ 7,091.38					3.0%	\$ 7,089.65					
	SUP. Y DIRECCION			10.00%	\$ 23,637.92					10.0%	\$ 23,632.17					
		ITBIS DEL 10%	18%		\$ 4,254.83					18.0%	\$ 4,253.79					
												\$ 284,531.30				100%
	TOTAL GENERAL			RD\$ 284,600.52												

AVANCE INICIAL RD\$ 56,920.10

TOTAL A PAGAR RD\$ 227,611.20

Dirección de Planeamiento
Urbano del
Ayuntamiento de Bani

ING. ANDRÉS DE LOS SANTOS
DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO

DIRECCION DE OBRAS
MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO DE BANI
ENCARGADO OBRAS MUNICIPALES

ING. MARCELL NAYETTI GUZMAN
CONTRATISTA



Alcaldía de Bani

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

Bani, Provincia Peravia,
01 de mayo Del 2026.-
Oficio No.0554/2026.-
Rem/Cubicación.

1100010056 272401
INV.

Al

: Señor

Ing. Santo Ramírez,
Alcalde Municipal,
Su Despacho._



Asunto

: **Remisión Cubicación 1 y Final.**

Muy Respetuosamente, Me Dirijo A Usted Para Remitirle La Cubicación 1 Y Final, Para El Proyecto De **Construcción Contenes**, en el Sector Brisas Del Norte Central Emmanuel, Bani, Prov. Peravia; a través de **presupuesto participativo**.

Total General De **RD\$284,487.06** (Doscientos Ochenta Y Cuatro Mil, Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos Con 06/100).

Cubicación Actual De **RD\$284,487.06** (Doscientos Ochenta Y Cuatro Mil, Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos Con 06/100).

Avance Inicial De **RD\$56,897.41** (Cincuenta Y Seis Mil, Ochocientos Noventa Y Siete Pesos Con 41/100).

Total A Pagar De **RD\$227,589.64** (Doscientos Veintisiete Mil, Quinientos Ochenta Y Nueve Pesos Con 64/100).



**Dirección de Planeamiento
Urbano del
Ayuntamiento de Bani**

Ing. Andrés De Los Santos
Director Planeamiento Urbano

Atentamente,

**DIRECCIÓN DE OBRAS
MUNICIPALES**

Arq. Angel Mañan
Director Obras Municipales

IADS-AAM/MT



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

DEPARTAMENTO DE OFICINA TECNICA

"Una Nueva Visión"

RECEPCIÓN DE OBRA

Por este medio la Dirección de Obras Municipales, suscribiendo Angel Mañan, Encargado del Departamento, hago constar que hemos recibido de manera Satisfactoria los trabajos de ingeniería correspondiente a la siguiente obra: **Construcción De Contenes, Brisas Del Norte Central Enmanuel.**

CERTIFICAMOS, que las actividades a realizar, descritas tanto en el documento de contrato como en el presupuesto de partidas y actividades, fueron ejecutadas cumpliendo con los requerimientos y reglamentaciones establecidas y avaladas en ordenanzas y resoluciones, emitidas para proyectos de esta índole.

En el Municipio de Bani, Provincia Peravia, en fecha: **12 de Mayo de 2026**, para los fines que la empresa **ING. MARCELL NAYETTI GUZMAN** portador del **RNC: 40220013821**, considere de lugar.



Sin otro en particular,


Angel Mañan

Director De Obras Municipales



Brisas del Norte Central Emmanuel

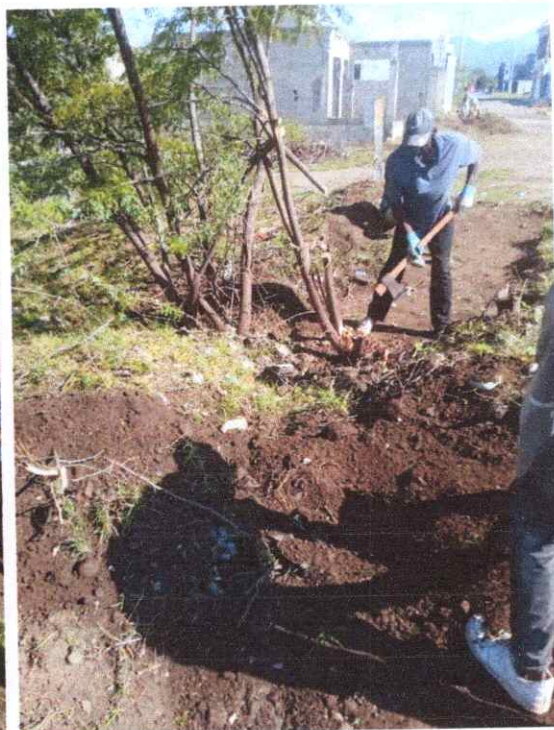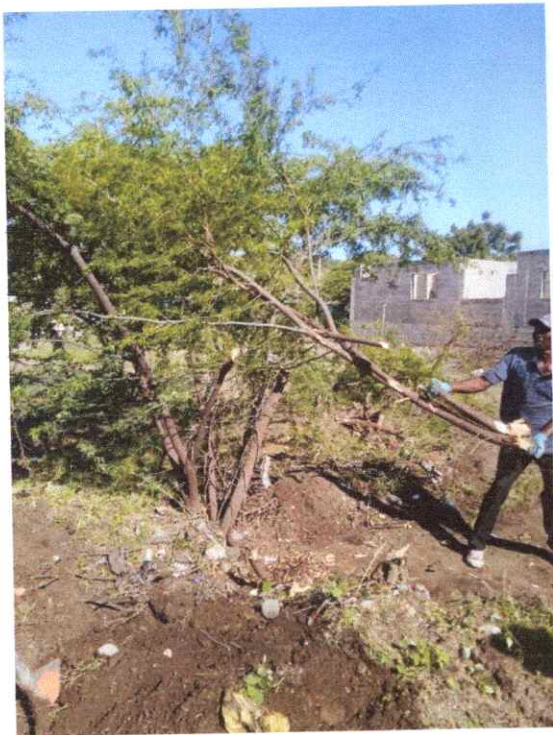



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Proyecto No. **CONSTRUCCION CONTENES - BRISAS DEL NORTE CENTRAL EMMANUEL**
Descripción: **CUBICACION 1 Y FINAL**
Fecha: **abr-26**
Contratista: **ING. MARCELL NAYETTI GUZMAN**

Monto Contrato Original:	RD\$284,487.06
--------------------------	----------------

Monto Addendum a Contrato:

RD\$56,897.41

Contrato +Addendum+ Adicionales:

Inicio Contractual de la Obra: A firmarse con la firma del acta de inicio de obra

Adicional Aprobado(%):

0,00%

[illegible]

AVANCE INICIAL	RDS 56,897.41
----------------	---------------

TOTAL A PAGAR	RDS 227,589.64
---------------	----------------

ING. ANDRES DE LOS SANTOS
DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO

Dirección de Planeamiento
Urbano del
Ayuntamiento de Baní

ANGEL MAÑAN
ENCARGADO OBRAS MUNICIPALES

ING. MARCELL NAYETTI GUZMAN
CONTRATISTA



Alcaldía de Bani

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

Bani, Provincia Peravia,

29 De Abril Del 2026.-

Oficio No.0526/2026.-

Rem/Cubicación.

1100010057 272401
1111

Al

: Señor

Ing. Santo Ramírez,

Alcalde Municipal,

Su Despacho._



Asunto

: Remisión Cubicación 1 y Final.

Muy Respetuosamente, Me Dirijo A Usted Para Remitirle La Cubicación 1 Y Final, Para El Proyecto De **Construcción Aceras y Contenes**, en el Sector Nueva Esperanza, Bani, Prov. Peravia, a través de **presupuesto participativo**.

Total General De **RD\$285,538.64** (Doscientos Ochenta Y Cinco Mil, Quinientos Treinta Y Ocho Pesos Con 64/100).

Cubicación Actual De **RD\$285,130.20** (Doscientos Ochenta Y Cinco Mil, Ciento Treinta Pesos Con 20/100).

Avance Inicial De **RD\$57,107.73** (Cincuenta Y Siete Mil, Ciento Siete Pesos Con 73/100).

Total A Pagar De **RD\$228,022.47** (Doscientos Veintiocho Mil, Veintidós Pesos Con 47/100).

Atentamente,

Ing. Andrés De Los Santos

Director Planeamiento Urbano

IADS-AAM/MT



Arq. Ángel Mañan

Director Obras Municipales



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

DEPARTAMENTO DE OFICINA TECNICA

"Una Nueva Visión"

RECEPCIÓN DE OBRA

Por este medio la Dirección de Obras Municipales, suscribiendo Angel Mañan, Encargado del Departamento, hago constar que hemos recibido de manera Satisfactoria los trabajos de ingeniería correspondiente a la siguiente obra: **Construcción De Contenes, Nueva Esperanza.**

CERTIFICAMOS, que las actividades a realizar, descritas tanto en el documento de contrato como en el presupuesto de partidas y actividades, fueron ejecutadas cumpliendo con los requerimientos y reglamentaciones establecidas y avaladas en ordenanzas y resoluciones, emitidas para proyectos de esta índole.

En el Municipio de Bani, Provincia Peravia, en fecha: **12 de Mayo de 2026**, para los fines que la empresa **ING. MARCELL NAYETTI GUZMAN** portador del **RNC: 40220013821**, considere de lugar.

Sin otro en particular,



Angel Mañan

Director De Obras Municipales



NUEVA ESPERANZA CONTENES.



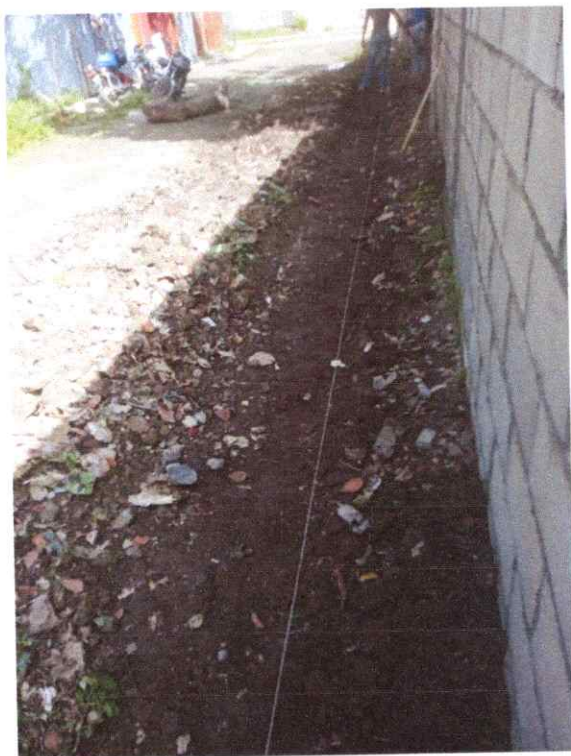

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Proyecto No. CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - NUEVA ESPERANZA
 Descripción: CUBICACION 1 Y FINAL
 Fecha: abr-26
 Contratista: ING. MARCELL NAYETTI GUZMAN

Monto Contrato Original: RD\$285,538.64
 Monto Addendum a Contrato:
 Monto de Avance: RD\$57,107.73
 Contrato +Addendum+ Adicionales:
 Inicio Contractual de la Obra: A firmarse con la firma del acta de inicio de obra
 Adicional Aprobado(%): 0.00%

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Sub-Total	Total	CUBICADO ANTERIOR			CUBICADO ACTUAL			CUBICADO ACUMULADO			% Ejecutado
							CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	
1	PRELIMINARES															0%
1.1	NIVELACION TOPOGRAFICA	100.00	ML	\$ 94.00	\$ 9,400.00					-	\$ -					
1.2	REMOCION DE CAPA VEGETAL	100.00	M2	\$ 32.00	\$ 3,200.00					-	\$ -					
1.3	BOTE	13.00	M3	\$ 550.00	\$ 7,150.00					-	\$ -					
1.4	RELLENO COMPACTADO	20.00	M3	\$ 1,200.00	\$ 24,000.00	\$ 43,750.00						\$ 226,309.10				118%
2	HORMIGON ARMADO															
2.1	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2.4 CON LIGADORA	100.00	M2	\$ 1,141.87	\$ 114,187.00					-	\$ -					
2.2	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2.4 CON LIGADORA	58.00	ML	\$ 1,331.23	\$ 77,211.34	\$ 191,398.34				170.00	\$ 226,309.10					
3	LIMPIEZA											\$ 2,010.00				100%
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ 2,010.00	\$ 2,010.00	\$ 2,010.00				1.00	\$ 2,010.00					
	CAMBIO DE PRECIO NIVELACION TOPOGRAFICA	170.00	ML	\$ 50.00						170.00	\$ 8,500.00					
	SUB-TOTAL GENERAL			RD\$ 237,158.34	\$ 237,158.34							\$ 236,819.10				100%
	GASTOS INDIRECTOS									3.5%	\$ 8,288.67					
	SEGUROS Y FIANZAS			3.50%	\$ 8,300.54					1.0%	\$ 2,368.19					
	TRANSPORTE			1.00%	\$ 2,371.58					1.0%	\$ 2,368.19					
	PENSIONES Y JUBILACION			1.00%	\$ 2,371.58					0.1%	\$ 236.82					
	CODIA			0.10%	\$ 237.16					3.0%	\$ 7,104.57					
	GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%	\$ 7,114.75					10.0%	\$ 23,681.91					
	SUP. Y DIRECCION			10.00%	\$ 23,715.83					18.0%	\$ 4,262.74					
	ITBIS DEL 10%		18%		\$ 4,268.85											
	TOTAL GENERAL			RD\$ 285,538.64								\$ 285,130.20				100%

NOTA: SOLO SE EJECUTÓ CONSTRUCCIÓN DE CONTENES

AVANCE INICIAL RD\$ 57,107.73

TOTAL A PAGAR RD\$ 228,022.47

ING. ANDRES DE LOS SANTOS
 DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO

Dirección de Planeamiento
 Urbano del
 Ayuntamiento de Bani

ANGEL MANAN
 ENCARGADO OBRAS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE BANI

ING. MARCELL NAYETTI GUZMAN
 CONTRATISTA





Alcaldía de Bani

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

Bani, Provincia Peravia,

15 de mayo Del 2026.-

Oficio No.0616/2026.-

Rem/Cubicación.

1100010061-272401

INV.

Al

: Señor

Ing. Santo Ramírez,

Alcalde Municipal,

Su Despacho._



Asunto

: Remisión Cubicación 1 y Final.

Muy Respetuosamente, Me Dirijo A Usted Para Remitirle La Cubicación 1 Y Final, Para El Proyecto De **Reparación Aceras y contenes**, en el Sector Los Melones, Bani, Prov. Peravia, a través de **presupuesto participativo**.

Total General De **RD\$284,434.07** (Doscientos Ochenta Y Cuatro Mil, Cuatrocientos Treinta Y Cuatro Pesos Con 07/100).

Cubicación Actual De **RD\$284,386.32** (Doscientos Ochenta Y Cuatro Mil, Trecientos Ochenta Y Seis Pesos Con 32/100).

Avance Inicial De **RD\$56,886.81** (Cincuenta Y Seis Mil, Ochocientos Ochenta Y Seis Pesos Con 81/100).

Total A Pagar De **RD\$227,499.51** (Doscientos Veintisiete Mil, Cuatrocientos Noventa Y Nueve Pesos Con 51/100).

Dirección de Planeamiento

Urbano del

Ayuntamiento de Bani

Atentamente,

Ing. Andrés De Los Santos

Director Planeamiento Urbano

**RELACION DE OBRAS
MUNICIPALES**

Arq. Angel Mañan

Director Obras Municipales

IADS-AAM/MT



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

DEPARTAMENTO DE OFICINA TECNICA

"Una Nueva Visión"

RECEPCIÓN DE OBRA

Por este medio la Dirección de Obras Municipales, suscribiendo Angel Mañan, Encargado del Departamento, hago constar que hemos recibido de manera Satisfactoria los trabajos de ingeniería correspondiente a la siguiente obra: **Reparación De Aceras Y Contenes, Los Melones.**

CERTIFICAMOS, que las actividades a realizar, descritas tanto en el documento de contrato como en el presupuesto de partidas y actividades, fueron ejecutadas cumpliendo con los requerimientos y reglamentaciones establecidas y avaladas en ordenanzas y resoluciones, emitidas para proyectos de esta índole.

En el Municipio de Bani, Provincia Peravia, en fecha: **12 de Mayo de 2026**, para los fines que la empresa **ING. MARCELL NAYETTI GUZMAN** portador del **RNC: 40220013821**, considere de lugar.

Sin otro en particular,




Angel Mañan

Director De Obras Municipales



REPARACION DE ACERAS EN EL SECTOR LOS MELONES.



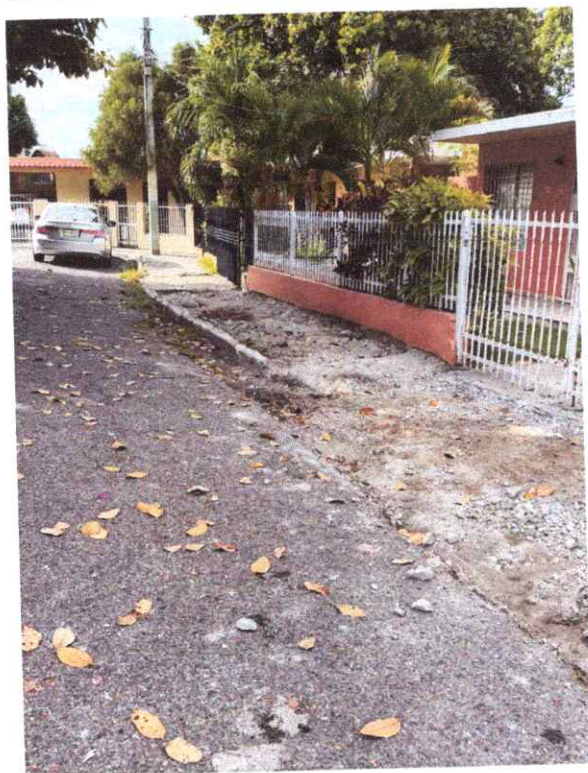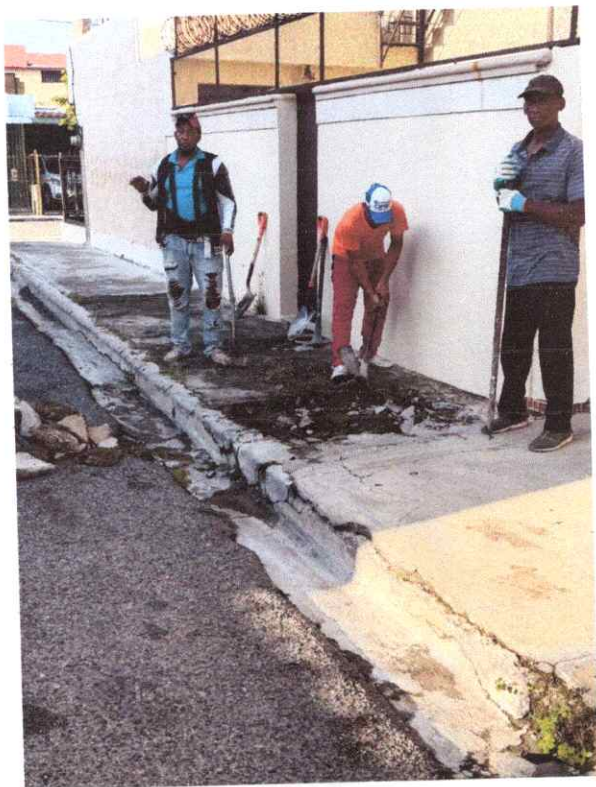

0616

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Proyecto No. REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - LOS MELONES
 Descripción: CUBICACION 1 Y FINAL
 Fecha: may-26
 Contratista: ING. MARCELL NAYETTI GUZMAN

Monto Contrato Original: RD\$284,434.07
 Monto Addendum a Contrato:
 Monto de Avance: RD\$56,886.81
 Contrato +Addendum+ Adicionales:
 Inicio Contractual de la Obra: A firmarse con la firma del acta de inicio de obra
 Adicional Aprobado(%): 0.00%

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Sub-Total	Total	CUBICADO ANTERIOR			CUBICADO ACTUAL			CUBICADO ACUMULADO			% Ejecutado
							CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	
												\$ 32,369.75				95%
1	PRELIMINARES															
1.1	DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES EN MAL ESTADO	150.00	M2	\$ 130.00	\$ 19,500.00					144.50	\$ 18,785.00					
1.2	BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO	19.50	M3	\$ 550.00	\$ 10,725.00					18.00	\$ 9,900.00					
1.3	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN AREA DE ACERA	150.00	M2	\$ 25.50	\$ 3,825.00	\$ 34,050.00				144.50	\$ 3,684.75					
2	HORMIGON ARMADO															91%
2.1	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2.4 CON LIGADORA	150.00	M2	\$ 1,141.87	\$ 171,280.50					144.50	\$ 165,000.22					
2.2	REPARACION CONTENES	41.00	ML	\$ 665.62	\$ 27,290.42	\$ 198,570.92				23.30	\$ 15,508.95					100%
3	LIMPIEZA															
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ 3,620.00	\$ 3,620.00	\$ 3,620.00				1.00	\$ 3,620.00					
	PARTIDAS NUEVAS															
	CONTENES	14.80	ML	\$ 1,331.24						14.80	\$ 19,702.35					100%
	SUB-TOTAL GENERAL			RD\$ 236,240.92		\$ 236,240.92										
	GASTOS INDIRECTOS			3.50%	\$ 8,268.43					3.5%	\$ 8,267.04					
	SEGUROS Y FIANZAS			1.00%	\$ 2,362.41					1.0%	\$ 2,362.01					
	TRANSPORTE			1.00%	\$ 2,362.41					1.0%	\$ 2,362.01					
	PENSIONES Y JUBILACION			0.10%	\$ 236.24					0.1%	\$ 236.20					
	CODIA			3.00%	\$ 7,087.23					3.0%	\$ 7,086.04					
	GASTOS ADMINISTRATIVOS			10.00%	\$ 23,624.09					10.0%	\$ 23,620.13					
	SUP. Y DIRECCION				\$ 4,252.34					18.0%	\$ 4,251.62					
	ITBIS DEL 10%		18%													
	TOTAL GENERAL			RD\$ 284,434.07								\$ 284,386.32				100%

AVANCE INICIAL RD\$ 56,886.81

TOTAL A PAGAR RD\$ 227,499.51

Dirección de Planeamiento
 Urbano
 ING. ANDRES DE LOS SANTOS
 DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
 ANGEL MAÑAN
 ENCARGADO OBRAS MUNICIPALES
 AYUNTAMIENTO DE BANI

ING. MARCELL NAYETTI GUZMAN
 CONTRATISTA



Alcaldía de Bani

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

Bani, Provincia Peravia,
15 de mayo Del 2026.-
Oficio No.0614/2026.-
Rem/Cubicación.

1100010055 272401
inv.

Al : Señor
Ing. Santo Ramírez,
Alcalde Municipal,
Su Despacho._



Asunto : **Remisión Cubicación 1 y Final.**

Muy Respetuosamente, Me Dirijo A Usted Para Remitirle La Cubicación 1 Y Final, Para El Proyecto De **Construcción De Aceras**, en el Sector Altos De Guazuma Norte, Bani, Prov. Peravia, a través de **presupuesto participativo**.

Total General De **RD\$236,594.07** (Doscientos Treinta Y Seis Mil, Quinientos Noventa Y Cuatro Pesos Con 07/100).

Cubicación Actual De **RD\$236,336.23** (Doscientos Treinta Y Seis Mil, Trescientos Treinta Y Seis Pesos Con 23/100).

Avance Inicial De **RD\$47,318.81** (Cuarenta Y Siete Mil, Trescientos Dieciocho Pesos Con 81/100).

Total A Pagar De **RD\$189,017.42** (Ciento Ochenta Y Nueve Mil, Diecisiete Pesos Con 42/100).


Dirección de Planeamiento
Urbano del
Ayuntamiento de Bani
Ing. Andrés De Los Santos
Director Planeamiento Urbano

Atentamente,


Arg. Angel Mañan
Director Obras Municipales

IADS-AAM/MT



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

DEPARTAMENTO DE OFICINA TECNICA

"Una Nueva Visión"

RECEPCIÓN DE OBRA

Por este medio la Dirección de Obras Municipales, suscribiendo Angel Mañan, Encargado del Departamento, hago constar que hemos recibido de manera Satisfactoria los trabajos de ingeniería correspondiente a la siguiente obra: **Construcción De Aceras, Altos De Guazuma Norte.**

CERTIFICAMOS, que las actividades a realizar, descritas tanto en el documento de contrato como en el presupuesto de partidas y actividades, fueron ejecutadas cumpliendo con los requerimientos y reglamentaciones establecidas y avaladas en ordenanzas y resoluciones, emitidas para proyectos de esta índole.

En el Municipio de Bani, Provincia Peravia, en fecha: **12 de Mayo de 2026**, para los fines que la empresa **ING. MARCELL NAYETTI GUZMAN** portador del **RNC: 40220013821**, considere de lugar.


Sin otro en particular,


Angel Mañan

Director De Obras Municipales



REPARACION DE ACERAS EN EL SECTOR GUAZUMA NORTE.

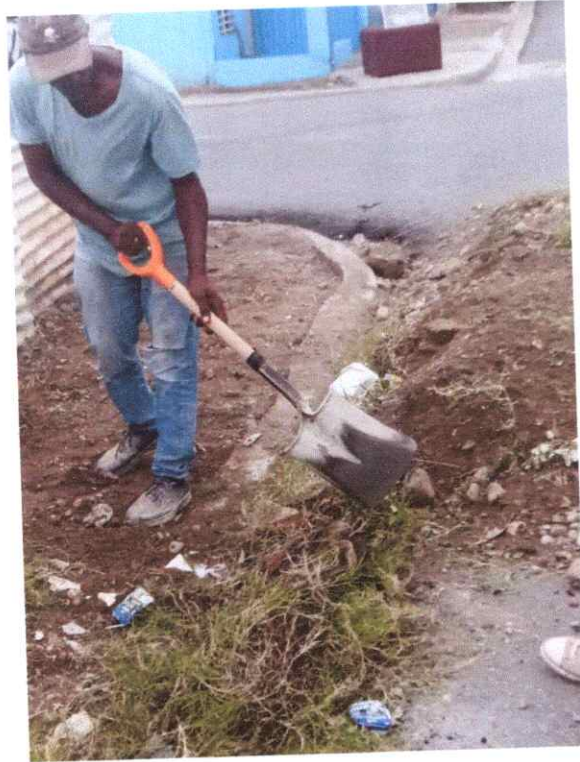



06/4 **PRÉSUPUESTO PARTICIPATIVO**

Proyecto No. CONSTRUCCION DE ACERAS - ALTOS DE GUAZUMA NORTE
 Descripción: CUBICACION 1 Y FINAL
 Fecha: may-26
 Contratista: ING. MARCELL NAYETTI GUZMAN

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

Monto Contrato Original: RD\$236,594.07
 Monto Addendum a Contrato: RD\$47,318.81
 Monto de Avance :
 Contrato +Addendum+ Adicionales:
 Inicio Contractual de la Obra: A firmarse con la firma del acta de inicio de obra
 Adicional Aprobado(%): 0.00%

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Sub-Total	Total	CUBICADO ANTERIOR			CUBICADO ACTUAL			CUBICADO ACUMULADO			% Ejecutado
							CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	
												\$ 25,062.78				47%
1	PRELIMINARES									146.53	\$ 13,773.82					
1.1	NIVELACION TOPOGRAFICA	122.00	ML	94.00	\$ 11,468.00					146.53	\$ 4,688.96					
1.2	REMOCION DE CAPA VEGETAL	122.00	M2	32.00	\$ 3,904.00					12.00	\$ 6,600.00					
1.3	BOTE	15.70	M3	550.00	\$ 8,635.00					-	\$ -					
1.4	RELLENO COMPACTADO	24.40	M3	1,200.00	\$ 29,280.00	\$ 53,287.00						\$ 167,318.21				120%
2	HORMIGON ARMADO									146.53	\$ 167,318.21					
2.1	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON LIGADORA	122.00	M2	\$ 1,141.87	\$ 139,308.14	\$ 139,308.14						\$ 3,911.56				100%
3	LIMPIEZA									1.00	\$ 3,911.56					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	3,911.56	\$ 3,911.56	\$ 3,911.56										100%
				RD\$ 196,506.70		\$ 196,506.70						\$ 196,292.55				
	SUB-TOTAL GENERAL											\$ 6,870.24				
	GASTOS INDIRECTOS			3.50%	\$ 6,877.73					3.5%		\$ 1,962.93				
	SEGUROS Y FIANZAS			1.00%	\$ 1,965.07					1.0%		\$ 1,962.93				
	TRANSPORTE			1.00%	\$ 1,965.07					0.1%		\$ 196.29				
	PENSIONES Y JUBILACION			0.10%	\$ 196.51					3.0%		\$ 5,888.78				
	CODIA			3.00%	\$ 5,895.20					10.0%		\$ 19,629.26				
	GASTOS ADMINISTRATIVOS			10.00%	\$ 19,650.67					18.0%		\$ 3,533.27				
	SUP. Y DIRECCION				\$ 3,537.12											
		ITBIS DEL 10%	18%													
												\$ 236,336.23				100%
	TOTAL GENERAL			RD\$ 236,594.07												

AVANCE INICIAL RD\$ 47,318.81
 TOTAL A PAGAR RD\$ 189,017.42

ING. ANDRES DE LOS SANTOS
 DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO

ING. MARCELL NAYETTI GUZMAN
 CONTRATISTA

Dirección de Planeamiento
 Urbano del
 Ayuntamiento de Bani





Alcaldía de Bani

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

Bani, Provincia Peravia,
15 de mayo Del 2026.-
Oficio No.0615/2026.-
Rem/Cubicación.

1100010072 272401
INV.



Al : Señor
Ing. Santo Ramírez,
Alcalde Municipal,
Su Despacho._

Asunto : **Remisión Cubicación 1 y Final.**

Muy Respetuosamente, Me Dirijo A Usted Para Remitirle La Cubicación 1 Y Final, Para El Proyecto De **Reparación Aceras y contenes**, en el Sector Fundo Barrio El Padre, Bani, Prov. Peravia, a través de **presupuesto participativo**.

Total General De **RD\$237,073.61** (Doscientos Treinta Y Siete Mil, Setenta Y Tres Pesos Con 61/100).

Cubicación Actual De **RD\$237,058.77** (Doscientos Treinta Y Seis Mil, Cincuenta Y Ocho Pesos Con 77/100).

Avance Inicial De **RD\$47,414.72** (Cuarenta Y Siete Mil, Cuatrocientos Catorce Pesos Con 72/100).

Total A Pagar De **RD\$189,644.05** (Ciento Ochenta Y Nueve Mil, Seiscientos Cuarenta Y Cuatro Pesos Con 05/100).



Dirección de Planeamiento

Ing. Andrés De Los Santos

Director Planeamiento Urbano

Atentamente,



Arq. Angel Mañan

Director Obras Municipales

IADS-AAM/MT



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

DEPARTAMENTO DE OFICINA TECNICA

"Una Nueva Visión"

RECEPCIÓN DE OBRA

Por este medio la Dirección de Obras Municipales, suscribiendo Angel Mañan, Encargado del Departamento, hago constar que hemos recibido de manera Satisfactoria los trabajos de ingeniería correspondiente a la siguiente obra: **Reparación De Aceras Y Contenes, Fundo Barrio El Padre.**

CERTIFICAMOS, que las actividades a realizar, descritas tanto en el documento de contrato como en el presupuesto de partidas y actividades, fueron ejecutadas cumpliendo con los requerimientos y reglamentaciones establecidas y avaladas en ordenanzas y resoluciones, emitidas para proyectos de esta índole.

En el Municipio de Bani, Provincia Peravia, en fecha: **12 de Mayo de 2026**, para los fines que la empresa **ING. MARCELL NAYETTI GUZMAN** portador del **RNC: 40220013821**, considere de lugar.


Sin otro en particular,


Angel Mañan
Director De Obras Municipales



REPARACION DE ACERAS EN EL SECTOR BARRIO EL PADRE, EL FUNDO.



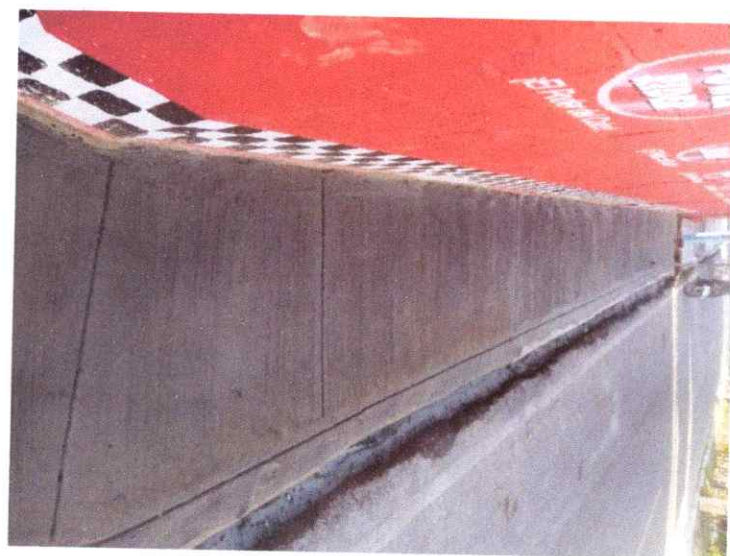



ENCARGADO OBRAS MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

CERTIFICACION DE RETENCION

RNC - 415000124

Número Comprobante: 042717

Fecha Comprobante:

Registrado

Número de Documento:

Fecha Cheque:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

R.N.C.

132556755

NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:

CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL

DOMICILIO:

C/ LAS MARGARITAS NO.05, RESIDENCIAL MARGARITA, BANÍ.

PAGADO (RD\$)

MONTO: 561,310.49

EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON 49/100

RETENIDO (RD\$)

MONTO: 9,516.27

EN LETRAS: NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 27/100

CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA

RETENCION MANUAL

Descripción Impuesto	VALOR APLICABLE A RENTENCION	PORCIENTO	VALOR
Itbis	58,026.14	30.00	3,133.41
Codia	580,261.41	0.10	580.26
FONDO DE PENSIONES	580,261.14	1.00	5,802.60

Total Retención

9,516.27

FACT. NO. / NCF / REF. INCLUIDO EN EL PAGO

48,49,

PAGO INDIVIDUALMENTE

561,310.49

SUMA GLOBAL REPORTADA

570,826.76

RETENCION REALIZADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10, DE LA LEY NO. 253-12, SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO, PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

APROBADO POR:

ERIK A ELIZABETH LARA VIAL ALONA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

CERTIFICACION DE RETENCION

RNC - 415000124

Número Comprobante: 042717

Fecha Comprobante:

Registrado

Número de Documento:

Fecha Cheque:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

R.N.C.

132556755

NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:

CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL

DOMICILIO:

C/ LAS MARGARITAS NO.05, RESIDENCIAL MARGARITA, BANÍ.

PAGADO (RD\$)

MONTO: 561,310.49

EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON 49/100

RETENIDO (RD\$)

MONTO: 9,516.27

EN LETRAS: NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 27/100

CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA

RETENCION MANUAL

Descripción Impuesto	VALOR APLICABLE A RENTENCION	PORCIENTO	VALOR
Itbis	58,026.14	30.00	3,133.41
Codia	580,261.41	0.10	580.26
FONDO DE PENSIONES	580,261.14	1.00	5,802.60

Total Retención

9,516.27

FACT. NO. / NCF / REF. INCLUIDO EN EL PAGO

48,49,

PAGO INDIVIDUALMENTE

561,310.49

SUMA GLOBAL REPORTADA

570,826.76

RETENCION REALIZADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10, DE LA LEY NO. 253-12, SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO, PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

APROBADO POR:

ERIK ELIZABETH LARA VILLALBA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: PAGO A PROVEEDOR

Etapas: Com ☐Dev ☐Pag ☐CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐

Comp. que Modifica: _____

CODIGO BENIFICIARIO: _____

RNC/CEDULA: 132556755

BENIFICIARIO: CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL

DIRECCION: C/ LAS MARGARITAS NO.05, RESIDENCIAL MARGARITA, BANÍ.

TELEFONO: 809-814-8274

CUENTA BANCARIA: 130-102367-9 Inversion Obras Municipales

DETALLE

CUBICACIONES 1 Y FINALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, EN EL SECTOR FUNDO, CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA COMUNIDAD DE LAS CALDERAS (AL LADO DEL CLUB CALDERA) Y ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR 03 DE MARZO, BANÍ, PROV. PERAVIA, A TRAVES PRESUP. PARTICIPATIVO AÑO 2026. SEGUN EL SIGTE. HIST. FINANCIERO: A) MONTO TOTAL PRESUP. RD\$704,793.12 B) MENOS AVANCES INICIALES DE UN 20% POR UN MONTO BRUTO DE RD\$133,292.40, SEGUN COMP. DE GASTOS NO.42004 D/F 05/03/2026, C) MENOS CUB. 1 Y FINALES POR UN MONTO BRUTO DE RD\$570,826.76, MENOS RET. DE LOS IMPUESTO DE LEY POR UN MONTO DE RD\$ 9,516.27. ANEXOS: FACTURAS POR PAGAR, OFICIOS VARIOS EMITIDOS POR EL DEPTO. PLANEAMIENTO URBANO, PRESUPUESTOS, FOTOS, RECEPCION DE OBRA, FACTURA COMP. GUB. NCF NO.B1500000048 Y 49 D/F 28/04/2026 Y 28/05/2026, COPIA DEL AVANCE INICIAL Y COPIA DE CONTRATO. O.S. TRANS NO. 9604756874.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0053.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	311,800.00
11.01.0051.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	40,479.98
11.01.0051.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	19,081.31
11.01.0071.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	180,215.47
11.01.0070.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	19,250.00

"REVISION Y CONTROL"

"VISADO POR CONTRALOR"

Total General RD\$ 570,826.76

ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA
ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD

YNGRID CAROLINA DIAZ

REGIDORA

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

JUAN ALEXANDER ZAPATA LARA
CONTRALOR MUNICIPAL

RAFAEL RAHDAME DIAZ SANTANA

TESORERO MUNICIPAL

SANTO YNLCIO RAMIREZ B.

ALCALDE MUNICIPAL

Retenciones

Irbis	30.00 %	3,133.41
Codia	0.10 %	580.26
FONDO DE P	1.00 %	5,802.60

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$

561,310.49



Alcaldía de Bani

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

Bani, Provincia Peravia,
25 De Mayo Del 2026.-
Oficio No.0658/2026.-
Rem/Cubicación.

1100010071 272407
inv.

Al

: Señor
Ing. Santo Ramírez,
Alcalde Municipal,
Su Despacho._



Asunto

: **Remisión Cubicación 1 y Final.**

Muy Respetuosamente, Me Dirijo A Usted Para Remitirle La Cubicación 1 Y Final, Para El Proyecto De **Construcción Aceras y Contenes**, en el Sector El Fundo, Bani, Prov. Peravia, a través de **presupuesto participativo**.

Total General De **RD\$225,590.40** (Doscientos Veinticinco Mil, Quinientos Noventa Pesos Con 40/100).

Cubicación Actual De **RD\$225,333.55** (Doscientos Veinticinco Mil, Trecientos Treinta Y Tres Pesos Con 55/100).

Avance Inicial De **RD\$45,118.08** (Cuarenta Y Cinco Mil, Ciento Dieciocho Pesos Con 08/100).

Total A Pagar De **RD\$180,215.47** (Ciento Ochenta Mil, Doscientos Quince Pesos Con 47/100).


**Dirección de Planeamiento
Urbano del
Ayuntamiento de Bani**
Ing. Andres De Los Santos
Director Planeamiento Urbano

IADS-AAM/MT

Atentamente,


Arq. Angel Mañan
Director Obras Municipales

0658



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Proyecto No. CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - EL FUNDO
Descripción: CUBICACION 1 Y FINAL
Fecha: abr-26
Contratista: CONSTRUCON, SRL

Monto Contrato Original: RD\$225,590.40
Monto Addendum a Contrato:
Monto de Avance: RD\$45,118.08
Contrato +Addendum+ Adicionales:
Inicio Contractual de la Obra:
Adicional Aprobado(%): 0.00%
A firmarse con la firma del acta de inicio de obra

							CUBICADO ANTERIOR			CUBICADO ACTUAL			CUBICADO ACUMULADO			%
							CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	Ejecutado
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Sub-Total	Total										
												\$ 8,172.19				23%
1	PRELIMINARES															
1.1	NIVELACION TOPOGRAFICA	85.00	ML	\$ 85.50	\$ 7,267.50					129.24	\$ 4,014.19					
1.2	REMOCION DE CAPA VEGETAL	85.00	M2	\$ 31.06	\$ 2,640.10					8.40	\$ 4,158.00					
1.3	BOTE	11.51	M3	\$ 495.00	\$ 5,697.45											
1.4	RELLENO COMPACTADO	17.00	M3	\$ 1,161.00	\$ 19,737.00	\$ 35,342.05						\$ 159,740.28				108%
2	HORMIGON ARMADO															
2.1	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON LIGADORA	85.00	M2	\$ 1,096.97	\$ 93,242.45					131.80	\$ 159,740.28					
2.2	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA	45.00	ML	\$ 1,211.99	\$ 54,539.55	\$ 147,782.00						\$ 2,700.00				100%
3	LIMPIEZA									1.00	\$ 2,700.00					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00						\$ 15,000.00				#,DIV/0!
	PARTIDAS NUEVAS									1.00	\$ 15,000.00					
	BRIGADA TOPOGRAFICA	1.00	DIA	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00							\$ 185,612.48				100%
	SUB-TOTAL GENERAL			RD\$ 185,824.05		\$ 185,824.05										
	GASTOS INDIRECTOS			3.50%	\$ 6,503.84					3.5%		\$ 6,496.44				
	SEGUROS Y FIANZAS			2.00%	\$ 3,716.48					2.0%		\$ 3,712.25				
	TRANSPORTE			1.00%	\$ 1,858.24					1.0%		\$ 1,856.12				
	PENSIONES Y JUBILACION			0.10%	\$ 185.82					0.1%		\$ 185.61				
	CODIA			3.00%	\$ 5,574.72					3.0%		\$ 5,568.37				
	GASTOS ADMINISTRATIVOS			10.00%	\$ 18,582.41					10.0%		\$ 18,561.25				
	SUP. Y DIRECCION				\$ 3,344.83					18.0%		\$ 3,341.02				
	ITBIS DEL 10%		18%													
	TOTAL GENERAL			RD\$ 225,590.40								\$ 225,333.55				100%

NOTA: EN ESTA OBRA SOLO SE EJECUTÓ CONSTRUCCIÓN DE CONTENES

AVANCE INICIAL RD\$ 45,118.08
TOTAL A PAGAR RD\$ 180,215.47

ING. ANDRES DE LOS SANTOS
DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO
Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Bani

ANGEL MANAN
ENCARGADO OBRAS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE BANI

CONSTRUCON, SRL
CONTRATISTA

Fundo.
Construcción de Contenes

Vestibulo
MUNICIPAL.



67.20 M²

76.40 M²

Santa de Vecinos
Cristo y el Señor



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

DEPARTAMENTO DE OFICINA TECNICA

"Una Nueva Visión"

RECEPCIÓN DE OBRA

Por este medio la Dirección de Obras Municipales, suscribiendo Angel Mañan, Encargado del Departamento, hago constar que hemos recibido de manera Satisfactoria los trabajos de ingeniería correspondiente a la siguiente obra: **Construccion de contenes, El Fundo.**

CERTIFICAMOS, que las actividades a realizar, descritas tanto en el documento de contrato como en el presupuesto de partidas y actividades, fueron ejecutadas cumpliendo con los requerimientos y reglamentaciones establecidas y avaladas en ordenanzas y resoluciones, emitidas para proyectos de esta índole.

En el Municipio de Bani, Provincia Peravia, en fecha: **12 de Mayo de 2026**, para los fines que la empresa **CONSTRUCON, S.R.L** portador del **RNC: 132-556755**, considere de lugar.

Sin otro en particular,

Angel Mañan

Director De Obras Municipales





Alcaldía de Bani

Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

Bani, Provincia Peravia,
25 De Mayo Del 2026.-

Oficio No.0659/2026.-

Rem/Cubicación.

Al : Señor
Ing. Santo Ramírez,
Alcalde Municipal,
Su Despacho._

Asunto : **Remisión Cubicación 1 y Final.**

Muy Respetuosamente, Me Dirijo A Usted Para Remitirle La Cubicación 1 Y Final, Para El Proyecto De **Construcción Contenes**, en la comunidad de Las Calderas (al lado del club), Bani, Prov. Peravia, a través de **presupuesto participativo.**

Total General De **RD\$440,871.59** (Cuatrocientos Cuarenta Mil, Ochocientos Setenta Y Un Pesos Con 59/100).

Cubicación Actual De **RD\$440,454.30** (Cuatrocientos Cuarenta Mil, Cuatrocientos Cincuenta Y Cuatro Pesos Con 30/100).

Avance Inicial De **RD\$88,174.32** (Ochenta Y Ocho Mil, Ciento Setenta Y Cuatro Pesos Con 32/100).

Total A Pagar De **RD\$352,279.98** (Trescientos Cincuenta Y Dos Mil, Doscientos Setenta Y Nueve Pesos Con 98/100).

Atentamente,


Ing. Andrés De Los Santos
Director Planeamiento Urbano

IADS-AAM/MT


Arq. Angel Mañan
Director Obras Municipales



Dirección de Planeamiento
Urbano del
Ayuntamiento de Baní





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

DEPARTAMENTO DE OFICINA TECNICA

"Una Nueva Visión"

RECEPCIÓN DE OBRA

Por este medio la Dirección de Obras Municipales, suscribiendo Angel Mañan, Encargado del Departamento, hago constar que hemos recibido de manera Satisfactoria los trabajos de ingeniería correspondiente a la siguiente obra: **Construcción De Contenes, Calderas.**

CERTIFICAMOS, que las actividades a realizar, descritas tanto en el documento de contrato como en el presupuesto de partidas y actividades, fueron ejecutadas cumpliendo con los requerimientos y reglamentaciones establecidas y avaladas en ordenanzas y resoluciones, emitidas para proyectos de esta índole.

En el Municipio de Bani, Provincia Peravia, en fecha: **20 de Mayo de 2026**, para los fines que la empresa **CONSTRUCON, S.R.L** portador del **RNC: 132-556755**, considere de lugar.

Sin otro en particular,



Angel Mañan
Director De Obras Municipales





Alcaldía de Bani

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

Bani, Provincia Peravia,
21 De Abril Del 2026.-
Oficio No.0483/2026.-
Rem/Cubicación.

1100010070 272401

\$19,250.00

1100010051 272401 \$19,081.13

Al : Señor
Ing. Santo Ramírez,
Alcalde Municipal,
Su Despacho._



Asunto : **Remisión Cubicación 1 y Final - Adicional.**

Muy Respetuosamente, Me Dirijo A Usted Para Remitirle La Cubicación 1 Y Final – Presupuesto Adicional, Para El Proyecto De **Reparación De Aceras Y Contenes**, en el Sector 03 De Marzo, Bani, Prov. Peravia, a través de **presupuesto participativo**.

Total General De **RD\$38,331.13** (Treinta Y Ocho Mil, Trescientos Treinta Y Un Pesos Con 13/100).

Cubicación Actual De **RD\$38,331.13** (Treinta Y Ocho Mil, Trescientos Treinta Y Un Pesos Con 13/100).

Total A Pagar De **RD\$38,331.13** (Treinta Y Ocho Mil, Trescientos Treinta Y Un Pesos Con 13/100).



Dirección de Planeamiento Urbano
Ayuntamiento de Bani
Ing. Andrés De Los Santos
Director Planeamiento Urbano



Arq. Ángel Mañan
Director Obras Municipales

IADS-AAM/MT

Monto Contrato Original:	RD\$38,331.13
Monto Addendum a Contrato:	
Monto de Avance :	RD\$0.00
Contrato +Addendum+ Adicionales:	
Inicio Contractual de la Obra:	A firmarse con la firma del acta de inicio de obra
Adicional Aprobado(%):	0.00%

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (ADICIONAL)	
Proyecto No.	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - 03 DE MARZO
Descripción:	CUBICACION FINAL POR ADICIONAL
Fecha	abr-26
Contratista:	CONSTRUCON. SRL

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio	Sub-Total	Total	CUBICADO ANTERIOR			CUBICADO ACTUAL			CUBICADO ACUMULADO			% Ejecutado
							CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	
1	PRELIMINARES											\$ 4,901.12				100%
1.1	DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES EN MAL ESTADO	23.08	M2	\$ 121.87	\$ 2,812.76					23.08	\$ 2,812.76					
1.2	BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO	2.96	M3	\$ 495.00	\$ 1,465.20					2.96	\$ 1,465.20					
1.3	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN AREA DE ACERA	23.08	M2	\$ 27.00	\$ 623.16					23.08	\$ 623.16					
						\$ 4,901.12										
2	HORMIGON ARMADO											\$ 26,935.37				100%
2.1	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON LIGADORA	23.08	M2	\$ 1,096.97	\$ 25,318.07					23.08	\$ 25,318.07					
2.2	REPARACION CONTENES	2.70	ML	\$ 599.00	\$ 1,617.30					2.70	\$ 1,617.30					
						\$ 26,935.37										
	SUB-TOTAL GENERAL			RD\$ 31,836.49		\$ 31,836.49						\$ 31,836.49				100%
	GASTOS INDIRECTOS															
	SEGUROS Y FIANZAS			3.50%	\$ 1,114.28					3.5%		\$ 1,114.28				
	TRANSPORTE			1.00%	\$ 318.36					1.0%		\$ 318.36				
	PENSIONES Y JUBILACION			1.00%	\$ 318.36					1.0%		\$ 318.36				
	CODIA			0.10%	\$ 31.84					0.1%		\$ 31.84				
	GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%	\$ 955.09					3.0%		\$ 955.09				
	SUP. Y DIRECCION			10.00%	\$ 3,183.65					10.0%		\$ 3,183.65				
	ITBIS DEL 10%		18%		\$ 573.06					18.0%		\$ 573.06				
	TOTAL GENERAL			RD\$ 38,331.13								\$ 38,331.13				100%

TOTAL A PAGAR	R\$ 38.331,11
---------------	---------------

ING. ANDRES DE LOS SANTOS
DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO

ANGEL MAÑAN
ENCARGADO OBRAS MUNICIPALES

CONSTRUCON, SRL
CONTRATISTA


Dirección de Planeamiento
Urbano de.
Ayuntamiento de Baní

DIRECCION DE OBRAS
MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO DE BANI



(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

OBRA: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES
SECTOR: 03 DE MARZO
FECHA: 10/04/2026

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ 1,114.28
TRANSPORTE		1.00%	\$ 318.36
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ 318.36
CODIA		0.10%	\$ 31.84
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ 955.09
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ 3,183.65
SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ 5,921.59
	ITBIS DEL 10%	18%	\$ 573.06

TOTAL GENERAL	\$ 38,331.13
---------------	--------------

DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

CONTABILIZACION DE BANCOS

C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANÍ.GOB.DO





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

DEPARTAMENTO DE OFICINA TECNICA

"Una Nueva Visión"

RECEPCIÓN DE OBRA

Por este medio la Dirección de Obras Municipales, suscribiendo Angel Mañan, Encargado del Departamento, hago constar que hemos recibido de manera Satisfactoria los trabajos de ingeniería correspondiente a la siguiente obra: **ADICIONAL Terminación Del Centro Comunal, Villa Del Carmen (La Paja).**

CERTIFICAMOS, que las actividades a realizar, descritas tanto en el documento de contrato como en el presupuesto de partidas y actividades, fueron ejecutadas cumpliendo con los requerimientos y reglamentaciones establecidas y avaladas en ordenanzas y resoluciones, emitidas para proyectos de esta índole.

En el Municipio de Bani, Provincia Peravia, en fecha: **21 de Abril de 2026**, para los fines que la empresa **CONSTRUCON, S.R.L** portador del **RNC: 132-556755**, considere de lugar.

Sin otro en particular,




Angel Mañan

Director De Obras Municipales

