



Alcaldía de Baní

¡Tu bienestar, nuestra visión!

INFORME TRIMESTRAL

Pagos de Obras

Presupuesto Participativo.

3er Trimestre 2026.



Alcaldía de Baní

¡Tu bienestar, nuestra visión!

El presente documento refleja los pagos de las obras en proceso y ejecutadas correspondientes al Presupuesto Participativo durante el tercer trimestre de 2026.

Durante el período comprendido entre julio y septiembre de 2026, se realizaron desembolsos a favor de los siguientes contratistas, conforme a los compromisos asumidos para la ejecución de obras:

- **MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA**

Método de pago: Transferencia bancaria.

- **INGARBEN SRL**

Método de pago: Transferencia bancaria

Los pagos antes mencionados corresponden a la ejecución de múltiples obras contempladas dentro del Presupuesto Participativo, cuyos nombres de las obras se encuentran documentados en los expedientes anexos.

MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA

Método de pago: Transferencia
bancaria.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

CERTIFICACION DE RETENCION

RNC - 415000124

Número Comprobante: 043082

Fecha Comprobante:

Registrado

Número de Documento:

Fecha Cheque:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

R.N.C.

40220013821

NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:

MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA

DOMICILIO:

BANI, PROV. PERAVIA

PAGADO (RD\$)

MONTO: 345,086.33

EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON 33/100

RETENIDO (RD\$)

MONTO: 14,072.29

EN LETRAS: CATORCE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON 29/100

CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA

RETENCION MANUAL

Descripción Impuesto	VALOR APLICABLE A RETENCION	PORCIENTO	VALOR
Itbis	38,860.52	100.00	6,298.48
ISR	38,860.52	10.00	3,499.15
Codia	388,605.20	0.10	388.61
FONDO DE PENSIONES	388,605.20	1.00	3,886.05

Total Retención

14,072.29

FACT. NO. / NCF / REF. INCLUIDO EN EL PAGO

76,77,

PAGO INDIVIDUALMENTE

345,086.33

SUMA GLOBAL REPORTADA

359,158.62

RETENCION REALIZADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10, DE LA LEY NO. 253-12, SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO, PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

APROBADO POR



ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

CERTIFICACION DE RETENCION

RNC - 415000124

Número Comprobante: 043082

Fecha Comprobante:

Registrado

Número de Documento:

Fecha Cheque:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

R.N.C.

40220013821

NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:

MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA

DOMICILIO:

BANI, PROV. PERAVIA

PAGADO (RD\$)

MONTO: 345,086.33

EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON 33/100

RETENIDO (RD\$)

MONTO: 14,072.29

EN LETRAS: CATORCE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON 29/100

CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA

RETENCION MANUAL

Descripción Impuesto	VALOR APLICABLE A RENTENCION	PORCIENTO	VALOR
Itbis	38,860.52	100.00	6,298.48
ISR	38,860.52	10.00	3,499.15
Codia	388,605.20	0.10	388.61
FONDO DE PENSIONES	388,605.20	1.00	3,886.05

Total Retención

14,072.29

FACT. NO. / NCF / REF. INCLUIDO EN EL PAGO

76,77,

PAGO INDIVIDUALMENTE

345,086.33

SUMA GLOBAL REPORTADA

359,158.62

RETENCION REALIZADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10, DE LA LEY NO. 253-12, SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO, PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

APROBADO POR:



ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

For. No. _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍCOMPROBANTE NO.: **043082**

Aprobado por

DIGECOG

FECHA 10/07/2026

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: PAGO A PROVEEDOR

Etapas: Com ☐Dev ☐Pag ☐CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐

Comp. que Modifica: _____

CODIGO BENIFICIARIO: _____

RNC/CEDULA: 40220013821

BENIFICIARIO: MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA

DIRECCION: BANI, PROV. PERAVIA

TELEFONO: 849-201-1484

CUENTA BANCARIA: 130-102367-9 Inversion Obras Municipales

DETALLE

CUB. NO.1 Y FINALES, PARA EL REMOSAMIENTO CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR BARRACONES LOS MANGUITOS Y PARA EL SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL, EN EL SECTOR BARRACONES LOS MANGUITOS, A TRAVES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2026, SEGÚN EL SIGTE. HIST. FINANC: A) MONTOS TOTALES PRESUP. RD\$563,040.42 B) MENOS AVANCES INICIALES DE UN 20% POR UN MONTO BRUTO DE RD\$112,608.08 SEGÚN COMP. DE GASTOS NO.42003 D/F 05/03/2026 C) MENOS CUB. NO.1 Y FINALES POR UN MONTO DE RD\$359,158.62 MENOS RET. DE LOS IMP. DE LEY POR UN MONTO RD\$14,072.29. ANEXOS: FACTURAS POR PAGAR, OFICIOS NOS.0865/2026 Y 0866/2026 D/F 01/07/2026, EMITIDO POR EL DEPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO, PRESUPUESTOS DE OBRAS, FOTOS, RECEPCION DE OBRA, COPIA DEL CONTATO DE OBRA, FACTURAS GUB. NOS. B1500000076 Y 77 Y COPIA DE AVANCE INICIAL. O.S. CUENTA TRANSFERENCIA NO.762847655 BANCO POPULAR.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
15.03.0066.000	2.7.1.2.01		4409	Obras para edificación no residencial	171,510.75
15.03.0053.000	2.7.1.2.01		4409	Obras para edificación no residencial	74,797.62
15.03.0066.000	2.7.1.2.01		4409	Obras para edificación no residencial	112,850.25

Total General RD\$

359,158.62

ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA
ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD

JUAN ALEXANDER ZAPATA LARA
CONTRALOR MUNICIPAL

FREDDY RAFAEL DE LOS SANTOS TE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

RAFAEL RAHDAME DIAZ SANTANA
TESORERO MUNICIPAL

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

SANTO YNIÑO RAMIREZ B.
ALCALDE MUNICIPAL

Retenciones

Itbis	100.00 %	6,298.48
ISR	10.00 %	3,499.15
Codia	0.10 %	388.61
FONDO DE P	1.00 %	3,886.05

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$

345,086.33



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

415000124

C/ PRESIDENTE BILLINI # 419 ESQ. MELLA, BANI PROV. PERAVIA.

Tels. 809-346-4300 , Fax. 809-508-2744

FACTURA POR PAGAR

SUPLIDOR : MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA
CODIGO No. : 000950
TELEFONO : 849-201-1484
DIRECCION : BANI, PROV. PERAVIA
RNC/CED : 40220013821

FECHA : 06/07/2026
FECHA. VENC. : 06/08/2026
Fact. No. / REF. : 77
CONDICION :

Documento Num. :- 00025690

Monto Original : DOP 187,647.87

Valor Pend. : DOP 187,647.87

NCF : B1500000077

CONCEPTO

DETALLE PRESUPUESTARIO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
15.03.0066.000	2.7.1.2.01	20	4409	Obras para edificación no residencial	112,850.25
15.03.0053.000	2.7.1.2.01	20	4409	Obras para edificación no residencial	74,797.62
Total General RD\$					187,647.87



Carolina Mora

ACAROLINA
PREPARADO POR

AUTORIZADO POR
Fecha Impresión 10/7/2026



Alcaldía de Bani

Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

Bani, Provincia Peravia,

01 de julio Del 2026.-

Oficio No.0865/2026.-

Rem/Cubicación.

Al : Señor
Ing. Santo Ramírez,
Alcalde Municipal,
Su Despacho._

Asunto : **Remisión Cubicación 1 y Final.**

Muy Respetuosamente, Me Dirijo A Usted Para Remitirle La Cubicación 1 y Final, Para El Proyecto **Remozamiento Centro Comunal**, En el sector Barracones Los Manguitos, Bani, Prov. Peravia, a través de **presupuesto participativo**.

Total General De **RD\$234,848.30** (Doscientos Treinta Y Cuatro Mil, Ochocientos Cuarenta Y Ocho Pesos Con 30/100).

Cubicación Actual De **RD\$234,617.53** (Doscientos Treinta y Cuatro Mil, Seiscientos Desiste Pesos Con 53/100).

Avance Inicial De **RD\$46,969.66** (Cuarenta Y Seis Mil, Novecientos Sesenta Y Nueve Pesos Con 66/100).

Total A Pagar De **RD\$187,647.87** (Ciento Ochenta Y Siete Mil, Setecientos Cuarenta y Siete Pesos Con 87/100).

Nota: Presupuesto del 2025.

Atentamente,

Ing. Andrés De Los Santos

Director Planeamiento Urbano

IADS-AAM/MT



Arq. Angel Mañan

Director Obras Municipales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Proyecto No. REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL - BARRANCONES LOS MANGUITOS
 Descripción: CUBICACION 1 y FINAL
 Fecha: jun-26
 Contratista: ING. MARCELL GUZMAN
 NOTA: ESTA OBRA PERTENECE A PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

Monto Contrato Original: RD\$234,848.30
 Monto Addendum a Contrato:
 Monto de Avance: RD\$46,969.66
 Contrato +Addendum+ Adicionales:
 Inicio Contractual de la Obra: A firmarse con la firma del acta de inicio de obra
 Adicional Aprobado(%): 0.00%

NOTA: Debido A Que Se Realizará Un 2do Nivel, No Se Ejecutará El Fino E Impermeabilizante

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Sub-Total	Total	CUBICADO ANTERIOR			CUBICADO ACTUAL			CUBICADO ACUMULADO			%
							CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	
1	PRELIMINARES											\$ -				0%
1.1	LIMPIEZA INICIAL	1.00	PA	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00				-	\$ -					
2	IMPERMEABILIZACION											\$ -				0%
2.1	FINO DE TECHO	200.00	M2	\$ 740.00	\$ 148,000.00					-	\$ -					
2.2	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	200.00	M2	\$ 213.00	\$ 42,600.00	\$ 190,600.00				-	\$ -					
5	LIMPIEZA											\$ -				0%
5.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00				-	\$ -					
	PARTIDAS NUEVAS											\$ 193,259.91				
	DEMOLICION	1.00	PA	\$ 4,000.00						1.00	\$ 4,000.00					
	VIGA DE AMARRE 0.15*0.20m	0.43	M3	\$ 54,741.96						0.43	\$ 23,539.04					
	VIGA DE AMARRE 0.15*0.40m	0.17	M3	\$ 51,606.41						0.17	\$ 8,773.09					
	MUROS DE BLOCKS 6" SNP	80.70	M2	\$ 1,944.83						80.70	\$ 156,947.78					
	SUB-TOTAL GENERAL			RD\$ 193,450.00		RD\$ 193,450.00						\$ 193,259.91				100%
	GASTOS INDIRECTOS															
	SEGUROS Y FIANZAS			3.50%	\$ 6,770.75					3.5%	\$ 6,764.10					
	TRANSPORTE			2.00%	\$ 3,869.00					2.0%	\$ 3,865.20					
	PENSIONES Y JUBILACION			1.00%	\$ 1,934.50					1.0%	\$ 1,932.60					
	CODIA			0.10%	\$ 193.45					0.1%	\$ 193.26					
	GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%	\$ 5,803.50					3.0%	\$ 5,797.80					
	SUP. Y DIRECCION			10.00%	\$ 19,345.00					10.0%	\$ 19,325.99					
	ITBIS DEL 10%		18%		\$ 3,482.10					18.0%	\$ 3,478.68					
	TOTAL GENERAL			RD\$ 234,848.30								\$ 234,617.53				100%

AVANCE INICIAL RD\$ 46,969.66

TOTAL A PAGAR RD\$ 187,647.87


ING. ANDRES DE LOS SANTOS
 DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO



ING. MARCELL GUZMAN
 CONTRATISTA




Dirección de Planeamiento
 Urbano del
 Ayuntamiento de Bani

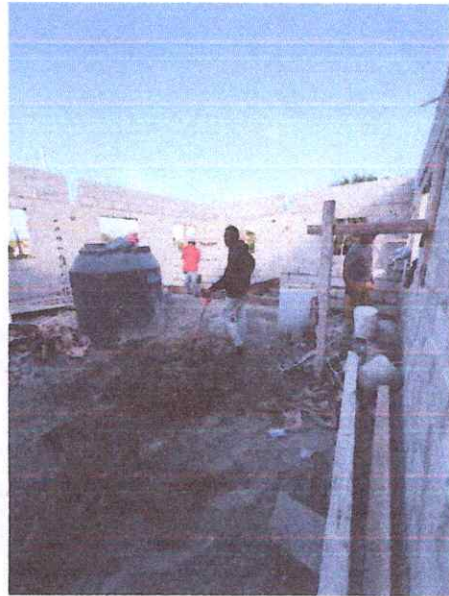

MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA

Método de pago: Transferencia
bancaria.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

CERTIFICACION DE RETENCION RNC - 415000124


Número Comprobante: 043333	Fecha Comprobante:	Registrado	
Número de Documento:	Fecha Cheque:		
DATOS DEL CONTRIBUYENTE			
R.N.C. 40220013821	NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL: MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA		
DOMICILIO: BANI, PROV. PERAVIA			
PAGADO (RD\$)			
MONTO: 423,794.38			
EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 38/100			
RETENIDO (RD\$)			
MONTO: 17,730.57			
EN LETRAS: DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON 57/100			
CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA			
RETENCION MANUAL			
Descripción Impuesto	VALOR APLICABLE A RETENCION	PORCIENTO	VALOR
Itbis	45,463.01	100.00	8,183.34
ISR	45,463.01	10.00	4,546.30
Codia	454,630.08	0.10	454.63
FONDO DE PENSIONES	454,630.08	1.00	4,546.30
			Total Retención
			17,730.57
FACT. NO. / NCF / REF. INCLUIDO EN EL PAGO		PAGO INDIVIDUALMENTE	
1073/2026,		423,794.38	
SUMA GLOBAL REPORTADA			
441,524.95			
RETENCION REALIZADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10, DE LA LEY NO. 253-12, SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO, PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.			



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

CERTIFICACION DE RETENCION RNC - 415000124

Número Comprobante: 043333	Fecha Comprobante:	Registrado
Número de Documento:	Fecha Cheque:	
DATOS DEL CONTRIBUYENTE		
R.N.C. 40220013821	NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL: MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA	
DOMICILIO: BANI, PROV. PERAVIA		
PAGADO (RD\$)		
MONTO: 423,794.38 EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 38/100		
RETENIDO (RD\$)		
MONTO: 17,730.57 EN LETRAS: DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON 57/100		
CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA		
RETENCION MANUAL		
Descripción Impuesto	VALOR APLICABLE A RETENCION	PORCIENTO
VALOR		
APROBADO POR:		
 ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA DIRECTOR DE CONTABILIDAD		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

CERTIFICACION DE RETENCION

RNC - 415000124

Número Comprobante: 043333

Fecha Comprobante:

Registrado

Número de Documento:

Fecha Cheque:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

R.N.C.:

40220013821

NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:

MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA

DOMICILIO:

BANI, PROV. PERAVIA

PAGADO (RD\$)

MONTO: 423,794.38

EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 38/100

RETENIDO (RD\$)

MONTO: 17,730.57

EN LETRAS: DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON 57/100

CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA

RETENCION MANUAL

Descripción Impuesto	VALOR APLICABLE A RETENCION	PORCIENTO	VALOR
Itbis	45,463.01	100.00	8,183.34
ISR	45,463.01	10.00	4,546.30
Codia	454,630.08	0.10	454.63
FONDO DE PENSIONES	454,630.08	1.00	4,546.30

Total Retención

17,730.57

FACT. NO. / NCF / REF. INCLUIDO EN EL PAGO

1073/2026,

PAGO INDIVIDUALMENTE

423,794.38

SUMA GLOBAL REPORTADA

441,524.95

RETENCION REALIZADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10, DE LA LEY NO. 253-12, SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO, PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

CERTIFICACION DE RETENCION

RNC - 415000124

Número Comprobante: 043333

Fecha Comprobante:

Registrado

Número de Documento:

Fecha Cheque:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

R.N.C.

40220013821

NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:

MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA

DOMICILIO:

BANI, PROV. PERAVIA

PAGADO (RD\$)

MONTO: 423,794.38

EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 38/100

RETENIDO (RD\$)

MONTO: 17,730.57

EN LETRAS: DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON 57/100

CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA

RETENCION MANUAL

Descripción Impuesto

VALOR APLICABLE A RETENCION

PORCIENTO

VALOR

APROBADO POR:



ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 14/08/2026

TIPO COMPROBANTE: PAGO A PROVEEDOR

Etapas: Com ☐Dev ☐Pag ☐CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐

Comp. que Modifica: _____

CODIGO BENIFICIARIO: _____

RNC/CEDULA: 40220013821

BENIFICIARIO: MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA

DIRECCION: BANI, PROV. PERAVIA

TELEFONO: 849-201-1484

CUENTA BANCARIA: 130-102367-9 Inversion Obras Municipales

DETALLE

CUB. NO.1 Y FINAL, PARA LA CONTINUACION DEL CENTRO COMUNAL, EN EL SECTOR LOS CAJUILITOS NORTE, BANI, PROV. PERAVIA. A TRAVES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2026, SEGÚN EL SIGTE. HIST. FINANCIERAS: A) MONTO TOTAL PRESUP. RD\$551,979.83 B) MENOS AVANCE INICIAL DE UN 20% POR UN MONTO BRUTO DE RD\$110,395.97 SEGÚN COMP. DE GASTOS NO.42003 D/F 05/03/2026 C) MENOS CUB. NO.1 Y FINAL POR UN MONTO DE RD\$441,524.95 MENOS RET. DE LOS IMP. DE LEY POR UN MONTO RD\$ 17,730.57. ANEXOS: FACTURA POR PAGAR, OFICIO NO.1073/2026 D/F 12/08/2026 EMITIDO POR EL DEPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO, RECEPCION DE OBRA, PRESUPUESTO DE OBRA, FOTOS, COPIA DEL CONTRATO DE OBRA Y COPIA DE AVANCE INICIAL. A.M. CUENTA TRANSFERENCIA NO.762847655 BANCO POPULAR.

Hecho en Sistema
17/08/2026 11:45 y Banco

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
15.03.0063.000	2.7.1.2.01		4409	Obras para edificación no residencial	441,524.95

"REVISION Y CONTROL"



ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA
ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD

FRANCIS ANTONIO PEGUERO MARTIN
CONTRALOR MUNICIPAL

FREDDY RAFAEL DE LOS SANTOS TE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

RAFAEL RAHDAME DIAZ SANTANA
TESORERO MUNICIPAL

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

SANTO YNILCIO RAMIREZ B.
ALCALDE MUNICIPAL

Total General RD\$

441,524.95

Retenciones

Itbis	100.00 %	8,183.34
ISR	10.00 %	4,546.30
Codia	0.10 %	454.63
FONDO DE P	1.00 %	4,546.30

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$

423,794.38



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

415000124

C/ PRESIDENTE BILLINI # 419 ESQ. MELLA, BANI PROV. PERAVIA.

Tels. 809-346-4300 , Fax. 809-508-2744

FACTURA POR PAGAR

SUPLIDOR : MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA
CODIGO No. : 000950
TELEFONO : 849-201-1484
DIRECCION : BANI, PROV. PERAVIA
RNC/CED : 40220013821

FECHA : 12/08/2026
FECHA. VENC. : 12/09/2026
Fact. No. / REF. : 1073/2026
CONDICION :

Documento Num. : - 00025901

Monto Original : DOP 441,524.95

Valor Pend. : DOP 441,524.95

NCF :

CONCEPTO

DETALLE PRESUPUESTARIO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
15.03.0063.000	2.7.1.2.01	20	4409	Obras para edificación no residencial	441,524.95
Total General RD\$					441,524.95



AUTORIZADO POR
Fecha Impresión 14/8/2026



Alcaldía de Baní

¡Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

Bani, Provincia Peravia,
12 de agosto Del 2026.-

Oficio No.1073/2026.-
Rem/Cubicación.

Al : Señor
Ing. Santo Ramírez,
Alcalde Municipal,
Su Despacho._

Asunto : **Remisión Cubicación 1 Y Final.**



Muy respetuosamente, me dirijo a usted para remitirle **La Cubicación 1 y final, Continuación Centro Comunal**, en el sector **Cajuilito Norte**, de esta Ciudad Bani Provincia Peravia.

Total, General de **RD\$551,979.83** (Quinientos Cincuenta Y Un Mil, Novecientos Setenta Y Nueve Pesos Con 83/100).

Total, General Cubicado De **RD\$ 551,920.92** (Quinientos Cincuenta Y Un Mil, Novecientos Veinte Pesos Con 92/100).

Avance Inicial de **RD\$110,395.97** (Ciento Diez Mil, Trecientos Noventa y Cinco Pesos Con 97/100).

Total, General A Pagar De **RD\$441,524.95** (Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil, Quinientos Veinticuatro Pesos Con 95/100).


**Dirección de Planeamiento
Urbano del
Ayuntamiento de Bani**
Ing. Andrés De Los Santos
Director Planeamiento Urbano

Atentamente,

**DIRECCIÓN DE OBRAS
MUNICIPALES**

AYUNTAMIENTO DE BANI
Angel Mañan
Director Obras Municipales

IADS-AM/MT



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

DEPARTAMENTO DE OFICINA TECNICA

"Una Nueva Visión"

RECEPCIÓN DE OBRA

Por este medio la Dirección de Obras Municipales, suscribiendo Angel Mañan, Encargado del Departamento, hago constar que hemos recibido de manera Satisfactoria los trabajos de ingeniería correspondiente a la siguiente obra: **Continuación Centro Comunal, Cajulito Norte.**



CERTIFICAMOS, que las actividades a realizar, descritas tanto en el documento de contrato como en el presupuesto de partidas y actividades, fueron ejecutadas cumpliendo con los requerimientos y reglamentaciones establecidas y avaladas en ordenanzas y resoluciones, emitidas para proyectos de esta índole.


En el Municipio de Bani, Provincia Peravia, en fecha: **11 de Agosto de 2026**, para los fines que la empresa **ING. MARCELL NAYETTI GUZMAN** portador del **RNC: 40220013821**, considere de lugar.

Sin otro en particular,


Angel Mañan
Director De Obras Municipales



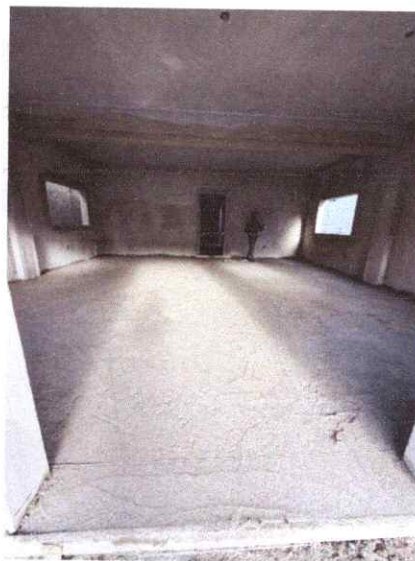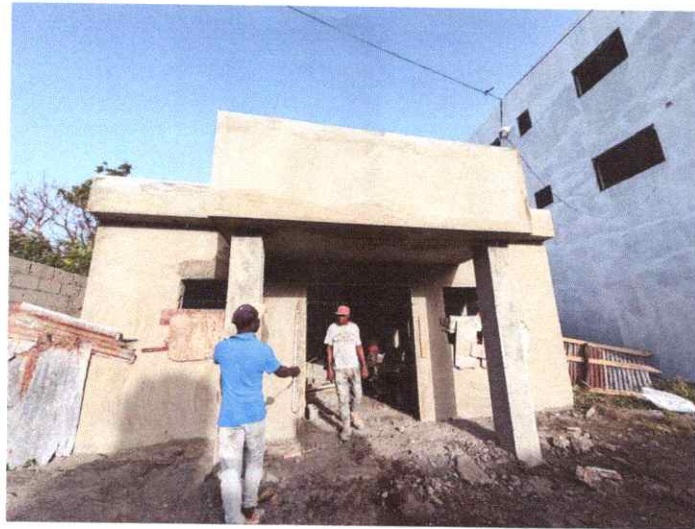

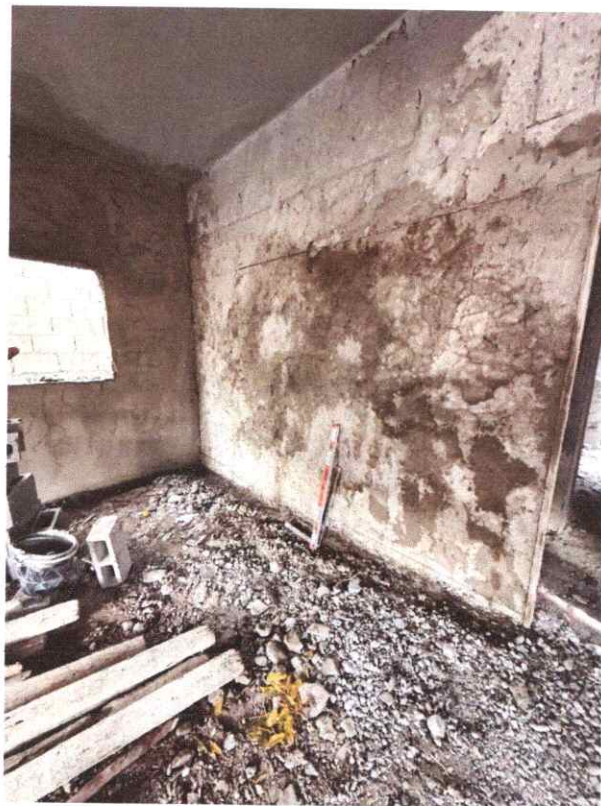

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Proyecto No. CONTINUACION CENTRO COMUNAL - CAJUILITO NORTE

Descripción: CUBICACION 1 Y FINAL

Fecha **ago-26**

Contratista: **ING. MARCELL NAYETTI GUZMAN**

Monto Contrato Original:	RD\$551,979.83
--------------------------	----------------

Monto Addendum a Contrato:

Monto de Avance : RD\$110,395.97

Contrato +Addendum+ Adicionales:

Inicio Contractual de la Obra: **A firmarse con la firma del acta de inicio de obra**

Adicional Aprobado(%): 0.00%

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Sub-Total	Total	CUBICADO ANTERIOR			CUBICADO ACTUAL			CUBICADO ACUMULADO			% Ejecutado
							CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	
1	TERMINACIONES											\$ 313,361.08				91%
1.1	PAÑETE EN MURO	323.91	M2	\$ 695.40	\$ 225,247.01					258.51	\$ 179,767.85					
1.2	MOCHETA	143.21	ML	\$ 220.00	\$ 31,506.20					142.20	\$ 31,284.00					
1.3	CANTOS	65.00	ML	\$ 120.00	\$ 7,800.00					194.66	\$ 23,359.20					
1.4	TORTA DE PISO	94.90	M2	\$ 835.45	\$ 79,284.21					94.50	\$ 78,950.03					
						\$ 343,837.42						\$ -				0%
2	PLOMERIA															
2.1	REGISTRO SANITARIO	1.00	UD	\$ 6,558.62	\$ 6,558.62					-	\$ -					
2.2	Tapa de hierro galvanizado para cisterna	1.00	UND	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00					-	\$ -					
2.3	Piezas de plomería y mano de obra tubo, cheque vertical y flota Cisterna	1.00	PA	\$ 4,987.00	\$ 4,987.00					-	\$ -					
						\$ 18,445.62						\$ 83,495.07				90%
3	MISCELANEOS															
3.1	HIERRO PROTECTORES	255.43	PIE2	\$ 350.00	\$ 89,400.50					230.00	\$ 80,500.00					
3.2	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	UD	\$ 2,995.07	\$ 2,995.07					1.00	\$ 2,995.07					
						\$ 92,395.57						\$ 57,773.93				
	PARTIDAS NUEVAS															
	REPELLO EN MUROS	260.51	M2	\$ 173.20						258.51	\$ 44,773.93					
	ARREGLOS EN SALIDAS DE TOMACORRIENTES/INTERRUPTORES	1.00	PA	\$ 5,000.00						1.00	\$ 5,000.00					
	PLOMERIA ARRASTRES EN BAÑOS Y PIEZAS PARA PAÑETAR MUROS	1.00	PA	\$ 8,000.00						1.00	\$ 8,000.00					
	SUB-TOTAL GENERAL			RD\$ 454,678.61		\$ 454,678.61						\$ 454,630.08				100%
	GASTOS INDIRECTOS															
	SEGUROS Y FIANZAS			3.50%	\$ 15,913.75					3.5%	\$ 15,912.05					
	TRANSPORTE			2.00%	\$ 9,093.57					2.0%	\$ 9,092.60					
	PENSIONES Y JUBILACION			1.00%	\$ 4,546.79					1.0%	\$ 4,546.30					
	CODIA			0.10%	\$ 454.68					0.1%	\$ 454.63					
	GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%	\$ 13,640.36					3.0%	\$ 13,638.90					
	SUP. Y DIRECCION			10.00%	\$ 45,467.86					10.0%	\$ 45,463.01					
	ITBIS DEL 10%		18%		\$ 8,184.21					18.0%	\$ 8,183.34					
	TOTAL GENERAL			RD\$ 551,979.83								\$ 551,920.92				100%

AVANCE INICIAL	R\$ 110,395.97
----------------	----------------

TOTAL A PAGAR	R\$ 441,524.95
---------------	----------------



ING. MARCELL NAYETTI GUZMAN
CONTRATISTA





No. EXPEDIENTE
CCC-CP-2026-0001
No. DOCUMENTO
0001

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

18 de febrero de 2026

Página 1 de 2

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **AMB-CCC-CP-2026-0001**Descripción: **PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI.**

Datos del Proveedor

Razón social: **MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA**RNC: **402-2001382-1**Nombre Comercial: **MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA**Domicilio Comercial: **CALLE CENTRAL NO.06, RES. NUEVO MILENIO, BANI.** Tel: **809-522-4107**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **Avance de un 20% y los demás pagos por cubicaciones**Modalidad de pago: **Contra Entrega**Total: **6,477,314.02**

Detalle

Item	Descripción	Unidad	Moneda	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
01	TERMINACION CENTRO COMUNAL BARRACONEZ JESUS DE NAZARET , CONTINUACION CENTRO COMUNAL CAJUILITO NORTE , REPARACION ACERAS Y CONTENES BRISAS DEL CANAL , REPARACION DE ACERAS Y CONTENES SANTA ELENA Y CONSTRUCCION DE CONTENES BRISAS DEL NORTE CENTRAL ENMANUEL	UD	RDS	1,898,194.82	28,674.89	1,926,869.71
02	CONTINUACION CENTRO COMUNAL HONDURAS , CONTINUACION CENTRO COMUNAL BARRACONES VALLE DE LAS COLINAS , CONSTRUCCION ACERAS Y ONTENES NUEVA ESPERANZA , CONSTRUCCION ACERAS Y ONTENES LOS MELONES , CONSTRUCCION ACERAS ALTO DE GUAZUMA NORTE			2,185,034.27	32,985.95	2,218,020.22
03	CONTINUACION CENTRO COMUNAL PUEBLO NUEVO LOS MANGUITOS Y PUEBLO NUEVO II PUERTA DEL REFUGIO , CONTINUACION DEL 2DO			2,297,895.22	34,728.87	2,332,424.09

* Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

NIVEL CENTRO COMUNAL BARRACONES LOS MANGUITOS, CONSTRUCCION DE CONTENES FUNDACION DE PERAVIA PARAISO, REPARACION DE ACERAS Y CONTENES LOS PESCADORES, REPARACION DE ACERAS FUNDO BARRIO EL PADRE Y REPARACION DE ACERAS MEJORAMIENTO SOCIAL					
					Total S/ITBIS: 6,380,924.31 RD\$
					Total ITBIS RD\$ 96,389.71
					Total RD\$ 6,477,314.02

Observaciones: OBRAS ADMINISTRATIVAS Y DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026,
SIENDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.

Plan de Entrega

Item	Descripción de la Entrega	Fecha Necesidad
01	C/ Presidente Billini #419, esq. Mella, Bani Prov. Peravia, centro de la Ciudad	18 de febrero de 2026


ANABEL SANTANA
 ANALISTA DE COMPRAS




LIG. EDWIN MEJIA
 GERENTE FINANCIERO



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios


ING. RAFAEL OLAVERRIA
 ENCARGADO DE COMPRAS




ING. SANTO Y. RAMIREZ
 ALCALDE MUNICIPAL





Ayuntamiento Municipal de Bani

18 de febrero de 2026

CERTIFICACIÓN DE CUOTAS A COMPROMETER

GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (Departamento de Obras Municipales)

REFERENCIA : (AMB-CCC-CP-2026-0001)

Yo, (Edwin Mejía Mejía), en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de Ayuntamiento Municipal e Bani

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2026), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo 2026 para la contratación que se especifica a continuación:

CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI.

LOTE	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
4	TERMINACION CENTRO COMUNAL BARRACONEZ JESUS DE NAZARET , CONTINUACION CENTRO COMUNAL CAJUILITO NORTE , REPARACION ACERAS Y CONTENES BRISAS DEL CANAL , REPARACION DE ACERAS Y CONTENES SANTA ELENA Y CONSTRUCCION DE CONTENES BRISAS DEL NORTE CENTRAL ENMANUEL	5.00	UD	1,926,869.71	1,926,869.71
6	CONTINUACION CENTRO COMUNAL HONDURAS , CONTINUACION CENTRO COMUNAL BARRACONES VALLE DE LAS COLINAS , CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES NUEVA ESPERANZA , CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LOS MELONES , CONSTRUCCION ACERAS ALTO DE GUAZUMA NORTE	5	UD	2,218,020.22	2,218,020.22
7	CONTINUACION CENTRO COMUNAL PUEBLO NUEVO LOS MANGUITOS Y PUEBLO NUEVO II PUERTA DEL REFUGIO ,	6	UD	2,332,424.09	2,332,424.09

CONTINUACION DEL 2DO NIVEL CENTRO COMUNAL BARRACONES LOS MANGUITOS, CONSTRUCCION DE CONTENES FUNDACION DE PERAVIA PARAISO, REPARACION DE ACERAS Y CONTENES LOS PESCADORES, REPARACION DE ACERAS FUNDO BARRIO EL PADRE Y REPARACION DE ACERAS MEJORAMIENTO SOCIAL				
--	--	--	--	--

TOTAL RD\$	6,477,314.02
-------------------	---------------------

PRESUPUESTO: RD\$ 6,477,314.02 (Seis millones cuatrocientos setenta y siete mil trescientos catorce pesos con 02/100)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Comparación de Precios.**

Y para que conste, firmo la presente certificación,


Edwin Mejía Mejía
Encargado (a) Administrativo Financiero





No. EXPEDIENTE
CCC-CP-2026-0001
No. DOCUMENTO
CCC-CP-2026-0001

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

18 de febrero de 2026

Página 1 de 3

Objeto de la compra: **CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI**
 (ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO).

Rubro: **Construcciones y Edificaciones**

Planificada: No

Detalle

LOTE	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
4	TERMINACION CENTRO COMUNAL BARRACONEZ JESUS DE NAZARET , CONTINUACION CENTRO COMUNAL CAJUILITO NORTE , REPARACION ACERAS Y CONTENES BRISAS DEL CANAL , REPARACION DE ACERAS Y CONTENES SANTA ELENA Y CONSTRUCCION DE CONTENES BRISAS DEL NORTE CENTRAL ENMANUEL	5.00	UD	1,926,869.71	1,926,869.71
6	CONTINUACION CENTRO COMUNAL HONDURAS , CONTINUACION CENTRO COMUNAL BARRACONES VALLE DE LAS COLINAS , CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES NUEVA ESPERANZA , CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LOS MELONES , CONSTRUCCION ACERAS ALTO DE GUAZUMA NORTE	5	UD	2,218,020.22	2,218,020.22
7	CONTINUACION CENTRO COMUNAL PUEBLO NUEVO LOS MANGUITOS Y PUEBLO NUEVO II PUERTA DEL REFUGIO , CONTINUACION DEL 2DO NIVEL CENTRO COMUNAL BARRACONES LOS MANGUITOS , CONSTRUCCION DE CONTENES FUNDACION DE PERAVIA PARAISO , REPARACION DE ACERAS Y CONTENES LOS PESCADORES ,	6	UD	2,332,424.09	2,332,424.09

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 - Expediente de Compras
 Copia 1 - Agregar Destino



REPARACION DE ACERAS **FUNDO BARRIO EL
PADRE** Y REPARACION DE ACERAS
MEJORAMIENTO SOCIAL

TOTAL RD\$ 6,477,314.02

Observaciones: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI/ DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	16	18 de febrero de 2026


RAFAEL BIENVENIDO OLAVERRIA MONTERO

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES


DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

For. No. _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍCOMPROBANTE NO.: **043082**

Aprobado por

DIGECOG

FECHA 10/07/2026

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: PAGO A PROVEEDOR

Etapas: Com ☐Dev ☐Pag ☐CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐Comp. que Modifica:

CODIGO BENIFICIARIO: _____

RNC/CEDULA: 40220013821

BENIFICIARIO: MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA

DIRECCION: BANI, PROV. PERAVIA

TELEFONO: 849-201-1484

CUENTA BANCARIA: 130-102367-9 Inversion Obras Municipales

DETALLE

CUB. NO.1 Y FINALES, PARA EL REMOSAMIENTO CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR BARRACONES LOS MANGUITOS Y PARA EL SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL, EN EL SECTOR BARRACONES LOS MANGUITOS, A TRAVES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2026, SEGÚN EL SIGTE. HIST. FINANC: A) MONTOS TOTALES PRESUP. RD\$563,040.42 B) MENOS AVANCES INICIALES DE UN 20% POR UN MONTO BRUTO DE RD\$112,608.08 SEGÚN COMP. DE GASTOS NO.42003 D/F 05/03/2026 C) MENOS CUB. NO.1 Y FINALES POR UN MONTO DE RD\$359,158.62 MENOS RET. DE LOS IMP. DE LEY POR UN MONTO RD\$14,072.29. ANEXOS: FACTURAS POR PAGAR, OFICIOS NOS.0865/2026 Y 0866/2026 D/F 01/07/2026, EMITIDO POR EL DEPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO, PRESUPUESTOS DE OBRAS, FOTOS, RECEPCION DE OBRA, COPIA DEL CONTATO DE OBRA, FACTURAS GUB. NOS. B1500000076 Y 77 Y COPIA DE AVANCE INICIAL. O.S. CUENTA TRANSFERENCIA NO.762847655 BANCO POPULAR.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
15.03.0066.000	2.7.1.2.01		4409	Obras para edificación no residencial	171,510.75
15.03.0053.000	2.7.1.2.01		4409	Obras para edificación no residencial	74,797.62
15.03.0066.000	2.7.1.2.01		4409	Obras para edificación no residencial	112,850.25

Total General RD\$ **359,158.62**ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA
ENC. DPTO. DE CONTABILIDADJUAN ALEXANDER ZAPATA LARA
CONTRALOR MUNICIPALFREDDY RAFAEL DE LOS SANTOS TE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPALRAFAEL RAHDAME DIAZ SANTANA
TESORERO MUNICIPAL

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

SANTO YNIÑO RAMIREZ B.
ALCALDE MUNICIPAL**Retenciones**


Itbis	100.00 %	6,298.48
ISR	10.00 %	3,499.15
Codia	0.10 %	388.61
FONDO DE P	1.00 %	3,886.05

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ **345,086.33**



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

415000124

C/ PRESIDENTE BILLINI # 419 ESQ. MELLA, BANI PROV. PERAVIA.

Tels. 809-346-4300 , Fax. 809-508-2744

FACTURA POR PAGAR

SUPLIDOR : MARCELL NAYETTI GUZMAN DE LA ROSA
CODIGO No. : 000950
TELEFONO : 849-201-1484
DIRECCION : BANI, PROV. PERAVIA
RNC/CED : 40220013821

FECHA : 06/07/2026
FECHA. VENC. : 06/08/2026
Fact. No. / REF. : 77
CONDICION :

Documento Num. :- 00025690

Monto Original : DOP 187,647.87

Valor Pend. : DOP 187,647.87

NCF : B1500000077

CONCEPTO

DETALLE PRESUPUESTARIO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
15.03.0066.000	2.7.1.2.01	20	4409	Obras para edificación no residencial	112,850.25
15.03.0053.000	2.7.1.2.01	20	4409	Obras para edificación no residencial	74,797.62
Total General RD\$					<u>187,647.87</u>



Carolina Mora

ACAROLINA
PREPARADO POR

AUTORIZADO POR
Fecha Impresión 10/7/2026



Alcaldía de Bani

Tu bienestar, nuestra visión!

RNC-415-00012-4

**DEPARTAMENTO DE
PLANEAMIENTO URBANO**

Bani, Provincia Peravia,

01 de julio Del 2026.-

Oficio No.0865/2026.-

Rem/Cubicación.

Al : Señor
Ing. Santo Ramírez,
Alcalde Municipal,
Su Despacho._

Asunto : **Remisión Cubicación 1 y Final.**

Muy Respetuosamente, Me Dirijo A Usted Para Remitirle La Cubicación 1 y Final, Para El Proyecto **Remozamiento Centro Comunal**, En el sector Barracones Los Manguitos, Bani, Prov. Peravia, a través de **presupuesto participativo**.

Total General De **RD\$234,848.30** (Doscientos Treinta Y Cuatro Mil, Ochocientos Cuarenta Y Ocho Pesos Con 30/100).

Cubicación Actual De **RD\$234,617.53** (Doscientos Treinta y Cuatro Mil, Seiscientos Desiste Pesos Con 53/100).

Avance Inicial De **RD\$46,969.66** (Cuarenta Y Seis Mil, Novecientos Sesenta Y Nueve Pesos Con 66/100).

Total A Pagar De **RD\$187,647.87** (Ciento Ochenta Y Siete Mil, Setecientos Cuarenta y Siete Pesos Con 87/100).

Nota: Presupuesto del 2025.

Atentamente,

Ing. Andrés De Los Santos

Director Planeamiento Urbano

IADS-AAM/MT



Arq. Angel Mañan

Director Obras Municipales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Proyecto No. REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL - BARRANCONES LOS MANGUITOS
 Descripción: CUBICACION 1 y FINAL
 Fecha: jun-26
 Contratista: ING. MARCELL GUZMAN
 NOTA: ESTA OBRA PERTENECE A PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

Monto Contrato Original: RD\$234,848.30
 Monto Addendum a Contrato:
 Monto de Avance: RD\$46,969.66
 Contrato +Addendum+ Adicionales:
 Inicio Contractual de la Obra: A firmarse con la firma del acta de inicio de obra
 Adicional Aprobado(%): 0.00%

NOTA: Debido A Que Se Realizará Un 2do Nivel, No Se Ejecutará El Fino E Impermeabilizante

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Sub-Total	Total	CUBICADO ANTERIOR			CUBICADO ACTUAL			CUBICADO ACUMULADO			%
							CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	CANT.	VALOR RD\$	SUBTOTAL	
1	PRELIMINARES											\$ -				0%
1.1	LIMPIEZA INICIAL	1.00	PA	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00				-	\$ -					
2	IMPERMEABILIZACION											\$ -				0%
2.1	FINO DE TECHO	200.00	M2	\$ 740.00	\$ 148,000.00					-	\$ -					
2.2	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	200.00	M2	\$ 213.00	\$ 42,600.00	\$ 190,600.00				-	\$ -					
5	LIMPIEZA											\$ -				0%
5.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00				-	\$ -					
	PARTIDAS NUEVAS											\$ 193,259.91				
	DEMOLICION	1.00	PA	\$ 4,000.00						1.00	\$ 4,000.00					
	VIGA DE AMARRE 0.15*0.20m	0.43	M3	\$ 54,741.96						0.43	\$ 23,539.04					
	VIGA DE AMARRE 0.15*0.40m	0.17	M3	\$ 51,606.41						0.17	\$ 8,773.09					
	MUROS DE BLOCKS 6" SNP	80.70	M2	\$ 1,944.83						80.70	\$ 156,947.78					
	SUB-TOTAL GENERAL			RD\$ 193,450.00		RD\$ 193,450.00						\$ 193,259.91				100%
	GASTOS INDIRECTOS															
	SEGUROS Y FIANZAS			3.50%	\$ 6,770.75					3.5%	\$ 6,764.10					
	TRANSPORTE			2.00%	\$ 3,869.00					2.0%	\$ 3,865.20					
	PENSIONES Y JUBILACION			1.00%	\$ 1,934.50					1.0%	\$ 1,932.60					
	CODIA			0.10%	\$ 193.45					0.1%	\$ 193.26					
	GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%	\$ 5,803.50					3.0%	\$ 5,797.80					
	SUP. Y DIRECCION			10.00%	\$ 19,345.00					10.0%	\$ 19,325.99					
	ITBIS DEL 10%		18%		\$ 3,482.10					18.0%	\$ 3,478.68					
	TOTAL GENERAL			RD\$ 234,848.30								\$ 234,617.53				100%

AVANCE INICIAL RD\$ 46,969.66

TOTAL A PAGAR RD\$ 187,647.87


ING. ANDRES DE LOS SANTOS
 DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO



ING. MARCELL GUZMAN
 CONTRATISTA

Dirección de Planeamiento
 Urbano del
 Ayuntamiento de Bani



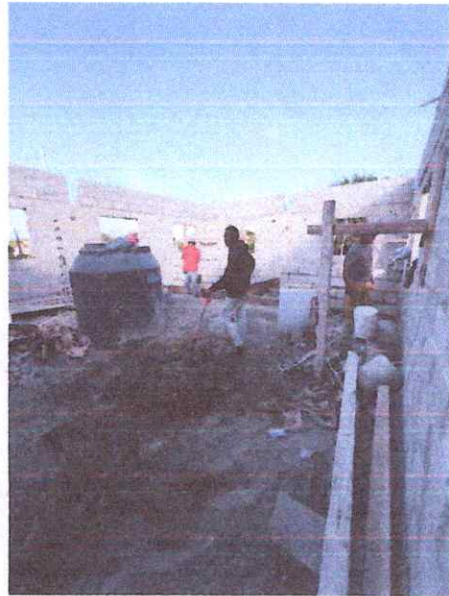

FECHA: 2026

SUB-TOTAL		\$ 454,678.61
-----------	--	---------------

SEGUROS Y FIANZAS		3.50%	\$ 15,913.75
TRANSPORTE		2.00%	\$ 9,093.57
PENSIONES Y JUBILACION		1.00%	\$ 4,546.79
CODIA		0.10%	\$ 454.68
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	\$ 13,640.36
SUP. Y DIRECCIÓN.		10.00%	\$ 45,467.86
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			\$ 89,117.01
	ITBIS DEL 10%	18%	\$ 8,184.21

TOTAL GENERAL	\$	551,979.83
---------------	----	------------

INGARBEN SRL

Método de pago: Transferencia bancaria



COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: PAGO A PROVEEDOR

Etapas: Com

Dev

Pag

CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐

Comp. que Modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: _____

RNC/CEDULA: 131967523

BENEFICIARIO: INGARBEN SRL

DIRECCION: SANTO DOMINGO

TELEFONO: 809-380-0804

CUENTA BANCARIA: 130-102367-9 Inversion Obras Municipales

DETALLE

AVANCES INICIALES DE UN 30% PARA LA PARED PERIMETRAL, EL LAUREL, CON UN MONTO PRESUPUESTADO DE RD\$ 489,561.97, CONSTRUCCION DE BADENES, LOS MELONCITOS, MONTO PRESUPUESTADO DE RD\$ 405,716.21, PINTURA DE LOS APARTAMENTOS, RIVIERA DEL SUR, MONTO PRESUPUESTADO DE RD\$ 452,545.33, CONSTRUCCION DE BADENES, SIFON DE MATAGORDA, MONTO PRESUPUESTADO DE RD\$ 215,199.12, GRADA DE CANCHA, HERMANOS SERRET, MONTO PRESUPUESTADO DE RD\$ 225,419.88, ENCACHE DE CAÑADA, LOS AGRONOMOS, UN MONTO PRESUPUESTADO DE RD\$ 234,617.49, CONSTRUCCION DE BADENES, RESIDENCIAL ANABEL, MONTO PRESUPUESTADO DE RD\$ 356,943.48, ATRAVES DE PRESUP. PARTICIPATIVO DEL AÑO 2026 Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, MUNICIPIO DE BANÍ, CENTRO DEL PUEBLO, MONTO PRESUPUESTADO RD\$2,865,819.15, BANÍ. PROV. PERAVIA, A TRAVES DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO AÑO 2026. ANEXOS: FACTURAS POR PAGAR, ORDEN Y SOLICITUD DE CONTRATACION, OFERTA ECONOMICA, PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS, OFICIO NO.0753/2026 D/F 10/06/2026, REGISTRO DE PROVEEDOR DEL ESTADO (RPE): 83859, CERTIFICACION DGII NO.C0226953134065 D/F 03/07/2026, TSS NO.7688434, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL, CODIA, CONTRATO DE FIANZA Y POR EL CONTRATO DE OBRA. A.M. TRANS. NO. 9602182754.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
11.08.0059.000	2.7.1.1.01		4101	Obras para edificación residencial (viviendas)	135,763.60
17.04.0054.000	2.7.2.1.01		3103	Obras hidráulicas y sanitarias	70,385.25
12.01.0058.000	2.7.2.4.01		4101	Infraestructura terrestre y obras anexas	146,868.59
11.01.0062.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	121,714.86
11.01.0066.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	64,559.74
11.01.0083.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	859,745.75
11.01.0068.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	107,083.04
15.01.0054.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanísticas	67,625.96



"VISADO POR EL CONTRALOR"

"REVISION Y CONTROL"

Total General RD\$ 1,573,746.79

ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA
ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD

JUAN ALEXANDER ZAPATA LARA
CONTRALOR MUNICIPAL

FREDDY RAFAEL DE LOS SANTOS TE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

RAFAEL RAFAEL DIAZ SANTANA
TESORERO MUNICIPAL

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

SANTO INLCIO RAMIREZ B.
ALCALDE MUNICIPAL

Retenciones

%

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$

1,573,746.79

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto



INGARBEN, SRL

C/ Santome Esq. Maximo Gomez, Edif. Pujols, Apt. 201

RNC: 131-967523

OBRAS CIVILES EN GENERAL

809-380-0804

Presupuesto

Lote 2 - proc-02-2026 - PARED PERIMETRAL, EL LAUREL

D.P.

Sector:

Fecha: 25/6/2026

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
2	HORMIGON					
1.1	Excavación zapata (0.45 * 0.65 * 45.00)	13.16	M3	603.73	7,945.09	
1.2	Bote material producto de la excavación	17.11	M3	500.00	8,555.00	
2.1	Hormigón en Zapata 210 kg/cm2	5.06	M3	12,522.61	63,364.41	
2.2	Columnas 0.15 x 0.20 (4 de 1/2" est. de 3/8"@ 0.20) Hormigón 210 kg/cm2 h-2.80	1.34	M3	40,035.54	53,647.62	
2.3	Viga de amarre 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 CON LIGADORA	1.35	M3	39,566.19	53,414.36	
						186,926.48

3	MUROS					
3.1	Block de 6" BNP.	16.80	M2	1,594.77	26,792.14	
3.2	Block de 6" SNP.	117.60	M2	1,594.77	187,544.95	
						214,337.09

4	LIMPIEZA					
4.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	
						2,000.00

GASTOS DIRECTOS

403,263.57

GASTOS INDIRECTOS

Dirección Técnica	10%	40,326.36
Gastos Administrativos	3%	12,097.91
Seguros , polizas y Fianzas	3.5%	14,114.22
Supervisión	0%	0.00
Pensiones y Jubilaciones Ley -6/86	1%	4,032.64
Transporte de materiales y equipos	2%	8,065.27
Letrero de identificacion de obras	0%	0.00
Codia	0.1%	403.26
Diseño de Planos y Renderizado	0%	0.00
Itbis sobre dirección técnica	18%	7,258.74

86,298.40

TOTAL GENERAL

489,561.97

RNC - 131 - 967523

INGARBEN, SRL

OBRAS CIVILES EN GENERAL

ANEUDY REYNOSO RIJOS



INGARBEN, SRL

C/ Santome Esq. Maximo Gomez, Edif. Pujols, Apt. 201

RNC: 131-967523

OBRAS CIVILES EN GENERAL

809-380-0804

Presupuesto

Lote 2 - proc-02-2026 - CONSTRUCCION DE BADENES, LOS MELONCITOS

P.P.

Sector:

Fecha: 25/6/2026

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	CORTE DE ASFALTO	18.00	ML	100.00	1,800.00	
1.2	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTADO	1.00	PA	13,000.00	13,000.00	
1.3	EXCAVACION DE BADEN	5.40	M3	500.00	2,700.00	
1.4	BOTE MATERIAL EXC Y DEMOLIDO	7.02	M3	500.00	3,510.00	
1.5	ACONDICIONAMIENTO Y NIVELACION	18.00	M2	80.00	1,440.00	

22,450.00

2	HORMIGON ARMADO					
2.1	Hormigón ARMADO EN BADEN 250 KG/CM2 Hormigón INDUSTRIAL	5.40	M3	13,993.26	75,563.60	
2.2	FROTADO+PULIDO+ESCOBILLON	18.00	M2	450.00	8,100.00	
2.3	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON LIGADORA	8.00	M2	1,218.86	9,750.88	
2.4	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA	8.00	ML	1,346.66	10,773.28	

104,187.76

3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	
3.2	SEÑALES DE PRECAUCION	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	

4,000.00

II	Badén C/ 1ra esq. C/ proyecto #6	L= 8.60m A= 2.00m E= 0.30m				
1	PRELIMINARES					
1.1	CORTE DE ASFALTO	17.20	ML	100.00	1,720.00	
1.2	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTADO	1.00	PA	13,000.00	13,000.00	
1.3	EXCAVACION DE BADEN	5.16	M3	500.00	2,580.00	
1.4	BOTE MATERIAL EXC Y DEMOLIDO	6.71	M3	500.00	3,355.00	
1.5	ACONDICIONAMIENTO Y NIVELACION	17.20	M2	80.00	1,376.00	

22,031.00

2	HORMIGON ARMADO				
2.1	Hormigón ARMADO EN BADEN 250 KG/CM2 Hormigón INDUSTRIAL	5.16	M3	13,593.26	70,141.22
2.2	FROTADO+PULIDO+ESCOBILLON	17.20	M2	250.00	4,300.00
2.3	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON LIGADORA	8.00	M2	1,018.86	8,150.88
2.4	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA	8.00	ML	1,146.66	9,173.28

91,765.38

3	LIMPIEZA				
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	2,000.00	2,000.00
3.2	SEÑALES DE PRECAUCION	1.00	PA	2,000.00	2,000.00

4,000.00

III	Badén C/ 1ra entre C/ #6 y #7 L= 5.30m A= 2.00m E= 0.30m				
1	PRELIMINARES				
1.1	CORTE DE ASFALTO	10.60	ML	100.00	1,060.00
1.2	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTADO	1.00	PA	13,000.00	13,000.00
1.3	EXCAVACION DE BADEN	3.18	M3	500.00	1,590.00
1.4	BOTE MATERIAL EXC Y DEMOLIDO	4.13	M3	500.00	2,065.00
1.5	ACONDICIONAMIENTO Y NIVELACION	10.60	M2	80.00	848.00

18,563.00

2	HORMIGON ARMADO				
2.1	Hormigón ARMADO EN BADEN 250 KG/CM2 Hormigón INDUSTRIAL	3.18	M3	13,593.26	43,226.57
2.2	FROTADO+PULIDO+ESCOBILLON	10.60	M2	250.00	2,650.00
2.3	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON LIGADORA	8.00	M2	1,018.86	8,150.88
2.4	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA	8.00	ML	1,146.66	9,173.28

63,200.73

3	LIMPIEZA				
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	2,000.00	2,000.00
3.2	SEÑALES DE PRECAUCION	1.00	PA	2,000.00	2,000.00

4,000.00

GASTOS DIRECTOS

334,197.87



Amor
ANFUDY REYNOSO RUIZ

GASTOS INDIRECTOS		
Dirección Técnica	10%	33,419.79
Gastos Administrativos	3%	10,025.94
Seguros , polizas y Fianzas	3.5%	11,696.93
Supervisión	0%	0.00
Pensiones y Jubilaciones Ley -6/86	1%	3,341.98
Transporte de materiales y equipos	2%	6,683.96
Letrero de identificación de obras	0%	0.00
Codia	0.1%	334.20
Diseño de Planos y Renderizado	0%	0.00
Itbis sobre dirección técnica	18%	6,015.56
		71,518.34
TOTAL GENERAL		405,716.21

(1100010062 272401)
INV



INGARBEN, SRL

C/ Santome Esq. Maximo Gomez, Edif. Pujols, Apt. 201

RNC: 131-967523

OBRAS CIVILES EN GENERAL

809-380-0804

Presupuesto

Lote 2 - proc-02-2026 - PINTURA DE LOS APARTAMENTOS, RIVIERA DEL SUR

P.P.

Sector:

Fecha: 25/6/2026

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
2	LIMPIEZA					
1.1	PINTURA ACRILICA SUPERIOR EXT. (incluye preparaci3n de superficie y aplicaci3n 2 manos)	1,210.00	M2	306.01	370,272.10	
2.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	2,500.00	2,500.00	

372,772.10

GASTOS DIRECTOS

372,772.10

GASTOS INDIRECTOS

Direcci3n T3cnica	10%	37,277.21
Gastos Administrativos	3%	11,183.16
Seguros , polizas y Fianzas	3.5%	13,047.02
Supervisi3n	0%	0.00
Pensiones y Jubilaciones Ley -6/86	1%	3,727.72
Transporte de materiales y equipos	2%	7,455.44
Letrero de identificaci3n de obras	0%	0.00
Codia	0.1%	372.77
Dise1o de Planos y Renderizado	0%	0.00
Itbis sobre direcci3n t3cnica	18%	6,709.90

79,773.23

TOTAL GENERAL

452,545.33



ANFUDY REYNOSO RIJOS

1100010059 271101

Inv.



INGARBEN, SRL

C/ Santome Esq. Maximo Gomez, Edif. Pujols, Apt. 201

RNC: 131-967523

OBRAS CIVILES EN GENERAL

809-380-0804

Presupuesto

Lote 2 - proc-02-2026 - CONSTRUCCION DE BADENES, SIFON DE MATAGORDA

Sector: C/ Duarte esq. C/ Las piedras L= 11.00m A= 2.00m E= 0.30m

Fecha: 25/6/2026

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	CORTE DE ASFALTO	22.00	ML	100.00	2,200.00	
1.2	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTADO	1.00	PA	13,000.00	13,000.00	
1.3	EXCAVACION DE BADEN	6.60	M3	500.00	3,300.00	
1.4	BOTE MATERIAL EXC Y DEMOLIDO	8.58	M3	500.00	4,290.00	
1.5	ACONDICIONAMIENTO Y NIVELACION	22.00	M2	80.00	1,760.00	

24,550.00

2	HORMIGON ARMADO					
2.1	Hormigón ARMADO EN BADEN 250 KG/CM2 Hormigón INDUSTRIAL	6.60	M3	13,593.26	89,715.52	
2.2	FROTADO+PULIDO+ESCOBILLON	22.00	M2	250.00	5,500.00	
2.3	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON LIGADORA	30.00	M2	1,018.86	30,565.80	
2.4	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA	20.00	ML	1,146.66	22,933.20	

148,714.52

3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	
3.2	SEÑALES DE PRECAUCION	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	

4,000.00

GASTOS DIRECTOS

177,264.52

1100010066 272401
INV



ANEUDY REYNOSO RUJOS

GASTOS INDIRECTOS		
Dirección Técnica	10%	17,726.45
Gastos Administrativos	3%	5,317.94
Seguros , polizas y Fianzas	3.5%	6,204.26
Supervisión	0%	0.00
Pensiones y Jubilaciones Ley -6/86	1%	1,772.65
Transporte de materiales y equipos	2%	3,545.29
Letrero de identificacion de obras	0%	0.00
Codia	0.1%	177.26
Diseño de Planos y Renderizado	0%	0.00
Itbis sobre dirección técnica	18%	3,190.76

37,934.61

TOTAL GENERAL

215,199.12

Ayuntamiento Municipal de Bani
OFERTA ECONOMICA

29 de junio de 2026

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: INGARBEN, SRL

Item No.	Descripcion del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	Lote 3 - proc-02-2026 - GRADA DE CANCHA, HERMANOS SERRET	Unidad	1	222,077.58	3,342.30	225,419.88
2	Lote 3 - proc-02-2026 - ENCACHE DE CAÑADA, LOS AGRONOMOS I Y II	Unidad	1	231,138.81	3,478.68	234,617.49
3	Lote 3 - proc-02-2026 - REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, MUNICIPIO DE BANI, CENTRO DEL PUEBLO	Unidad	1	2,823,327.60	42,491.55	2,865,819.15
4	Lote 3 - proc-02-2026 - CONSTRUCCION DE BADENES, RESIDENCIAL ANABEL	Unidad	1	351,651.07	5,292.41	356,943.48

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 3,682,800.00

Valor total de la oferta en letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

Validez de la Oferta: Oferta será válida por un periodo de setentas (70) días, contados a partir de la apertura de la misma

KERLIN GARCIA, en calidad de REPRESENTANTE debidamente autorizado para actuar en nombre y representacion de, INGARBEN, SRL

Firma Autorizada



Amep
ANFUDY REYNOSO RIOS

DISTRIBUCION Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino



INGARBEN, SRL

C/ Santome Esq. Maximo Gomez, Edif. Pujols, Apt. 201

RNC: 131-967523

OBRAS CIVILES EN GENERAL

809-380-0804

Presupuesto

Lote 3 - proc-02-2026 - GRADA DE CANCHA, HERMANOS SERRET

p.p.

Sector:

Fecha: 26/6/2026

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
2	HORMIGÓN ARMADO					
1.1	MARCADO	1.00	PA	3,000.00	3,000.00	
1.2	REMOCION DE CAPA VEGETAL	70.00	M2	34.51	2,415.70	
1.3	EXC. ZAPATA DE MURO 2.58 x 0.45 x 0.70 (10ud)	8.12	M3	603.73	4,902.29	
1.40	EXC. ZAPATA DE COLUMNA 0.75 x 0.75 x 0.70 (10ud)	3.93	M3	603.73	2,372.66	
1.5	RELLENO COMPACTADO	21.00	M3	909.00	19,089.00	
2.1	ZAPATA DE MURO 2.26 x 0.45 x 0.25 (10ud)	2.54	M3	12,522.61	31,807.43	
2.2	ZAPATA DE COLUMNA 0.75x0.75x0.30 (10ud)	1.68	M3	14,989.30	25,182.02	
2.3	COLUMNAS 0.20x0.15x2.02 (10ud) 4 de 1/2 pulg. - 3/8 pulg. A 0.20m HORMIGON 210 kg/cm2	0.30	M3	50,035.54	15,010.66	
						103,779.76

3	MAMPOSTERÍA					
1	MUROS BLOCK DE 6" BNP	15.45	M2	1,594.77	24,639.20	
3.2	MUROS BLOCK DE 6" SNP CAMARAS LLENAS	27.50	M2	2,082.35	57,264.63	
						81,903.83

GASTOS DIRECTOS

185,683.59

GASTOS INDIRECTOS

Dirección Técnica	10%	18,568.36
Gastos Administrativos	3%	5,570.51
Seguros , polizas y Fianzas	3.5%	6,498.93
Supervisión	0%	0.00
Pensiones y Jubilaciones Ley -6/86	1%	1,856.84
Transporte de materiales y equipos	2%	3,713.67
Letrero de identificacion de obras	0%	0.00
Codia	0.1%	185.68
Diseño de Planos y Renderizado	0%	0.00
Itbis sobre dirección técnica	18%	3,342.30

39,736.29

TOTAL GENERAL

225,419.88



Amep

ANEUDY REYNOSO RIJOS

1502010054 272701
inv.



INGARBEN, SRL

C/ Santome Esq. Maximo Gomez, Edif. Pujols, Apt. 201

RNC: 131-967523

OBRAS CIVILES EN GENERAL

809-380-0804

Presupuesto

Lote 3 - proc-02-2026 - ENCACHE DE CAÑADA, LOS AGRONOMOS I Y II

P.P.

Sector:

Fecha: 26/6/2026

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1.1	NIVELACION TOPOGRÁFICA	41.00	ML	83.50	3,423.50	
2.1	CORTE DE TALUD Y EXTRACCION DE MATERIAL DEL CAUCE CON RETRO PALA	4.00		3,000.00	12,000.00	
2.2	BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO	20.00	M3	550.00	11,000.00	
2.3	ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DEL TALUD MANUAL	41.00	ML	35.00	1,435.00	
						27,858.50
3	HORMIGON ARMADO					
3.1	BASE EN HORMIGON PARA COLOCAR MURO DE PIEDRA 20.50 X 0.20 X 0.30 (2)	2.46	M3	5,572.31	13,707.88	
3.2	CICLOPEO EN CAUCE DE CAÑADA 20.50 X 0.20 X 2.00	8.20	M3	4,000.00	32,800.00	
3.3	PISO Hormigón FROTADO ESP. 0.10 CM L-20.50 A-2.00	41.00	M2	846.80	34,718.80	
3.4	Hormigón SIMPLE EN PARTE SUPERIOR DE MURO ESPESOR ESP. 0.10 CM 20.50 ML X 0.20M (2)	8.20	M2	800.00	6,560.00	
						87,786.68
4	MUROS					
4.1	MURO EN PIEDRA L-20.50 MTS H-1.80 MTS (2)	73.80	M2	1,024.44	75,603.67	
						75,603.67
5	LIMPIEZA					
5.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	2,011.03	2,011.03	
						2,011.03
GASTOS DIRECTOS						193,259.88



Amor
ANFUDY REYNOSO RIJOS

GASTOS INDIRECTOS		
Dirección Técnica	10%	19,325.99
Gastos Administrativos	3%	5,797.80
Seguros , polizas y Fianzas	3.5%	6,764.10
Supervisión	0%	0.00
Pensiones y Jubilaciones Ley -6/86	1%	1,932.60
Transporte de materiales y equipos	2%	3,865.20
Letrero de identificacion de obras	0%	0.00
Codia	0.1%	193.26
Diseño de Planos y Renderizado	0%	0.00
Itbis sobre dirección técnica	18%	3,478.68
		41,357.61
TOTAL GENERAL		234,617.49

(1700040054 272101)
INV.



INGARBEN, SRL

C/ Santome Esq. Maximo Gomez, Edif. Pujols, Apt. 201

RNC: 131-967523

OBRAS CIVILES EN GENERAL

809-380-0804

Presupuesto

Lote 3 - proc-02-2026 - CONSTRUCCION DE BADENES, RESIDENCIAL ANABEL

Sector: #1, L= 10.50m A= 2.00m E= 0.30m

Fecha: 26/6/2026

P.P.

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	CORTE DE ASFALTO	21.00	ML	100.00	2,100.00	
1.2	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTADO	1.00	PA	13,000.00	13,000.00	
1.3	EXCAVACION DE BADEN	6.30	M3	500.00	3,150.00	
1.4	BOTE MATERIAL EXC Y DEMOLIDO	8.19	M3	500.00	4,095.00	
1.5	ACONDICIONAMIENTO Y NIVELACION	21.00	M2	80.00	1,680.00	
						24,025.00
2	HORMIGON ARMADO					
2.1	Hormigón ARMADO EN BADEN 250 KG/CM2 Hormigón INDUSTRIAL	6.30	M3	13,993.26	88,157.54	
2.2	FROTADO+PULIDO+ESCOBILLON	21.00	M2	450.00	9,450.00	
2.3	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON LIGADORA	13.00	M2	1,018.86	13,245.18	
2.4	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA	13.00	ML	1,046.66	13,606.58	
						124,459.30
3	LIMPIEZA					
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	2,200.00	2,200.00	
3.2	SEÑALES DE PRECAUCION	1.00	PA	1,500.00	1,500.00	
						3,700.00
II	L= 9.50m A= 2.00m E= 0.30m					
1	PRELIMINARES					
1.1	CORTE DE ASFALTO	19.00	ML	100.00	1,900.00	
1.2	DEMOLICION DE BADEN EN MAL ESTADO	1.00	PA	13,000.00	13,000.00	
1.3	EXCAVACION DE BADEN	5.70	M3	500.00	2,850.00	
1.4	BOTE MATERIAL EXC Y DEMOLIDO	7.41	M3	500.00	3,705.00	
1.5	ACONDICIONAMIENTO Y NIVELACION	19.00	M2	80.00	1,520.00	
						22,975.00

2	HORMIGON ARMADO				
2.1	Hormigón ARMADO EN BADEN 250 KG/CM2 Hormigón INDUSTRIAL	5.70	M3	13,993.26	79,761.58
2.2	FROTADO+PULIDO+ESCOBILLON	19.00	M2	450.00	8,550.00
2.3	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON LIGADORA	13.00	M2	1,018.86	13,245.18
2.4	CONTEN PULIDO DE h=0.40m - HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA	13.00	ML	1,046.66	13,606.58

115,163.34

3	LIMPIEZA				
3.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	PA	2,200.00	2,200.00
3.2	SEÑALES DE PRECAUCION	1.00	PA	1,500.00	1,500.00

3,700.00

GASTOS DIRECTOS

294,022.64

GASTOS INDIRECTOS

Dirección Técnica	10%	29,402.26
Gastos Administrativos	3%	8,820.68
Seguros , polizas y Fianzas	3.5%	10,290.79
Supervisión	0%	0.00
Pensiones y Jubilaciones Ley -6/86	1%	2,940.23
Transporte de materiales y equipos	2%	5,880.45
Letrero de identificacion de obras	0%	0.00
Codia	0.1%	294.02
Diseño de Planos y Renderizado	0%	0.00
Itbis sobre dirección técnica	18%	5,292.41

62,920.84

TOTAL GENERAL

356,943.48



AmRP

ANILUDY REYNOSO RIJOS

1100010068 272401
m.v.



INGARBEN, SRL

C/ Santome Esq. Maximo Gomez, Edif. Pujols, Apt. 201

RNC: 131-967523

OBRAS CIVILES EN GENERAL

809-380-0804

Presupuesto

A.M.D.

Lote 3 - proc-02-2026 - REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, MUNICIPIO DE BANI, CENTRO DEL PUEBLO

Sector:

Fecha: 26/6/2026

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
2	HORMIGON ARMADO					
1.1	DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES EN MAL ESTADO	1,200.00	M2	125.41	150,492.00	
1.2	BOTE DE MATERIAL DEMOLIDO	156.00	M3	450.00	70,200.00	
1.3	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN AREA DE ACERA	1,200.00	M2	30.00	36,000.00	
2.1	ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON LIGADORA	1,200.00	M2	1,162.23	1,394,676.00	
2.2	REPARACION CONTENES	1,116.00	ML	635.55	709,273.80	

2,360,641.80

GASTOS DIRECTOS

2,360,641.80

GASTOS INDIRECTOS

Dirección Técnica	10%	236,064.18
Gastos Administrativos	3%	70,819.25
Seguros , polizas y Fianzas	3.5%	82,622.46
Supervisión	0%	0.00
Pensiones y Jubilaciones Ley -6/86	1%	23,606.42
Transporte de materiales y equipos	2%	47,212.84
Letrero de identificacion de obras	0%	0.00
Codia	0.1%	2,360.64
Diseño de Planos y Renderizado	0%	0.00
Itbis sobre dirección técnica	18%	42,491.55

505,177.35

TOTAL GENERAL

2,865,819.15



ANEUDY REYNOSO RIOS

1100010083 272401
1WV.

AMB0007 - HORMIGON DE LIMPIEZA - M2**Rend. Est 7.00 M3**

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Agua	60.00	GL	1.25	0.23	1.48	88.80
Arena gruesa itabo lavada	0.52	METRO CUBICO ESPONJADO	1,313.56	236.44	1,550.00	806.00
Cemento gris 94 lbs. tipo portland	6.82	FDA	414.63	74.63	489.26	3,335.29
Grava de 3/4-pulg	0.66	METRO CUBICO ESPONJADO	805.08	144.92	950.00	627.00
Ligado y vaciado con ligadora	1.00	M3	698.28	125.69	823.97	823.97
Maestro	1.00	M2	191.25	0.00	191.25	191.25
					TOTAL RD\$/M3	5,872.31

AMB0007 - Zapatas de muros de (0.45x0.20)m - M3**Rend. Est 1.00 M3**

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Acero - cuantā-a qq/m3	1.17	QQ	2,796.61	503.39	3,300.00	3,861.00
Alambre dulce no. 18	2.34	LB	93.22	16.78	110.00	257.40
Mano de obra acero	16.67	ML	107.87	0.00	107.87	1,798.19
Vac. y ligado hormigā ³ n 180kg/cm2 - 10% desp	1.10	M3	5,859.80	1,054.76	6,914.56	7,606.02
					TOTAL RD\$/M3	13,522.61

AMB0007 - LOSA HA 3/8"@0.25M AD HORMIGON INDUSTRIAL 210KG/CM2, 1M3**Rend. Est 0.00 M3**

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Acero - cuantā-a qq/m3	4.23	QQ	2,796.61	503.39	3,300.00	13,969.89
Alambre dulce no. 18	3.20	LB	93.22	16.78	110.00	352.00
Encofrado losa plana h=3.00m todo costo	10.00	M2	150.00	0.00	150.00	1,500.00
Hormigon industrial 210 kg/cm2 + 10% desp.	1.10	M3	6,597.35	1,187.52	7,784.87	8,563.36
Mano de obra acero	1.60	QQ	323.63	0.00	323.63	517.81
					TOTAL RD\$/M3	24,903.06

AMB0007 - BLOQUES HORMIGON DE 6" - 3/8" @ 0.80m

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Acero bastones 3/8-pulg + 20% desp.	0.09	QQ	2,687.12	483.68	3,170.80	274.27
Alambre dulce no. 18	0.07	LB	93.22	16.78	110.00	8.03
Andamios en madera	1.00	M2	31.84	5.73	37.57	37.57
Colocaciā ³ n bloques y acero	13.00	UND	26.89	0.00	26.89	349.54
Hormigā ³ n 1:3:5 en cājmaras +10% desp.	0.03	M3	5,789.58	1,042.12	6,831.70	212.47
Artertero 1:3 en juntas + 30% desp.	0.03	M3	5,782.56	1,040.86	6,823.42	212.89
Suministro bloques horm. +4% desp.	12.50	UND	33.90	6.10	40.00	500.00
					TOTAL RD\$/M2	1,594.77

AMB0007 - EMPAÑETE TECHOS Y VIGAS - M2

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Cemento gris 94 lbs. tipo portland	0.05	FDA	457.63	82.37	540.00	28.62
Empañete pulido	1.00	M2	259.03	30.51	289.54	289.54
Madera cepillada pino americano	0.16	PT	114.24	20.56	134.80	22.15
Mortero 1:3 para bloques	0.04	M3	7,241.65	1,303.50	8,545.15	324.72
					TOTAL RD\$/M2	665.03

AMB0007 - MOCHETAS EN MUROS - 1ML

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Madera cepillada pino americano	0.60	PT	100.00	18.00	118.00	70.80
Mano de obra moqueta 0.20m	1.00	ML	161.15	0.00	161.15	161.15
Mortero 1:3 para bloques	0.00	M3	5,104.86	918.88	6,023.74	11.45
					TOTAL RD\$/ML	243.40

AMB0007 - Pintura Acrilica Superior

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1.00	PA	56.00	0.00	56.00	56.00
Pintura mantenimiento popular	0.08	GL	1,381.36	248.64	1,630.00	130.40
Preparación de superficie y aplicación 2 manos pintura industrial	1.00	M2	66.81	0.00	66.81	66.81
Grinner popular aaa 2000	0.12	GL	372.88	67.12	440.00	52.80
					TOTAL RD\$/M2	306.01

AMB0007 - SEÑALES DE PRECAUCION - PA

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Colocación de rotulación y señalización	1.00	PA	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
Suministro de rotulación y señalización	1.00	PA	6,779.66	1,220.34	8,000.00	8,000.00
					TOTAL RD\$/PA	2,000.00

AMB0007 - Fraguache - M2

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Herramientas (2%)	1.00	PA	3.01	0.54	3.55	3.55
Mezcla 1:6-act	0.01	M3	2,395.02	431.10	2,826.12	22.61
Vaciador-terminador	1.00	M2	70.30	0.00	70.30	70.30
					TOTAL RD\$/M2	96.46

AMB0007 - Suministro y colocación de techo en aluzinc a todo costo - M2

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Forro techo-act	1.00	M2	720.34	129.66	850.00	850.00
Herramientas (2%)	1.00	PA	111.86	20.14	132.00	132.00
Instalación de planchas de zinc, con enlatado	16.00	UND	72.89	0.00	72.89	1,166.24
Perfil metalico-act	1.00	ML	593.22	106.78	700.00	700.00

Materiales y Equipos

Techo de aluzinc-act	1.00	M2	965.12	173.72	1,138.84	1,138.84
				TOTAL RD\$/M2	3,987.08	

AMB0007 - ENCACHE DE PIEDRA M2

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Agregados-act	1.00	M3	254.24	45.76	300.00	300.00
Agua	60.00	GL	0.93	0.17	1.10	66.00
Cemento gris 94 lbs. tipo portland	6.28	FDA	440.68	79.32	520.00	3,267.00
Colocaci³n de piedra de roca o canto rodado, tipo encache de 0.20m a 0.30m de espesor en revestimiento terraplenes, canales y cunetas	20.00	M2	318.57	0.00	318.57	6,371.40
Ligado y vaciado con ligadora	0.40	M3	508.47	91.53	600.00	240.00
				TOTAL RD\$/M2	1,024.44	

AMB0007 - HORMIGON CICLOPEO - M3

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Agregados-act	1.00	M3	351.69	63.31	415.00	415.00
Agua	60.00	GL	1.25	0.23	1.48	88.80
Cemento gris 94 lbs. tipo portland	7.20	FDA	411.51	74.07	485.58	3,496.20
				TOTAL RD\$/M3	4,000.00	

AMB0007 - PISO GRIS HORMIGON 180 KG/CM2 - 1M2

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Clavos corriente con cabeza	0.11	LB	41.53	7.47	49.00	5.39
Herramientas (2%)	1.00	PA	10.45	1.88	12.33	12.33
Hormig³n 140 kg/cms2 (1:3:5)-act	0.08	M3	3,572.47	643.05	4,215.52	354.10
Madera bruta pino americano	0.22	PT	101.69	18.31	120.00	26.40
Mano de obra acera frotada y violinada, incluye colocaci³n hormig³n 10cms	1.00	METRO CUADRADO	149.91	44.24	194.15	194.15
Mezcla 1:3 + 5% desp, 4cm esp	0.02	M3	6,232.20	1,121.80	7,354.00	154.43
				TOTAL RD\$/M2	746.80	

AMB0007 - RELLENO REPOSICION - M3

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Herramientas (2%)	1.00	PA	5.55	1.00	6.55	6.55
Pala cuadrada tramontina (6 meses uso)	0.01	UND	508.47	91.53	600.00	6.00
Pico tramontina-act	0.01	UND	446.80	80.42	527.22	5.27
Regado, nivelado y apisonado de relleno-act	1.20	M3	205.90	13.73	219.63	263.55
				TOTAL RD\$/M3	281.37	

AMB0007 - HORMIGON H.A. e=0.30m, EN BADEN, FC=250 kg/cm2 Industrial

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Acero varilla grado 40-60 3/8-pulg a 1-pulg x 20 a 30 pies	0.45	QQ	2,627.12	472.88	3,100.00	1,395.00
Hormig³n 240 kg/cm2 (incluye bomba y colocaci³n)	1.05	M3	6,241.81	1,123.52	7,365.33	7,733.60

Mano de Obra

Maestro	1.00	METRO CUBICO	4,464.66	0.00	4,464.66	4,464.66
					TOTAL RD\$/M3	13,593.26

AMB0007 - Conten pulido, hormigon fc=180kg/cm2

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Excavaciã³n a mano en caliche	1.85	M3N	423.73	76.27	500.00	925.00
Mano de obra contenes - madera y pulido contã©n con bordillo 40cm h x 20cm a	7.41	ML	312.29	0.00	312.29	2,314.07
Plantillas en plywood 3/4" sum. y confecciã³n	2.47	UND	356.42	64.15	420.57	1,038.81
Vaciado y ligado hormigã³n 1:2:4 - 5% desp	1.15	M3	6,759.58	1,216.72	7,976.30	9,188.70
					TOTAL RD\$/ML	1,346.66

AMB0007 - VIGAS 50 X 25 - 3/8"@0.20m, fc=210kg/cm2, 1m3

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Acero - cuantã-a qq/m3	3.95	QQ	2,796.61	503.39	3,300.00	13,034.01
Alambre dulce no. 18	7.32	LB	93.22	16.78	110.00	805.20
Encofrado viga de amarre todo costo	33.33	ML	210.00	0.00	210.00	6,999.30
Mano de obra acero	33.33	ML	105.73	0.00	105.73	3,524.07
Vaciado y ligado hormigã³n 1:2:4 - 5% desp	1.00	M3	5,099.75	917.96	6,017.71	6,017.71
					TOTAL RD\$/M3	30,380.29

MB0007 - CANTOS - ML

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Madera cepillada pino americano	0.43	PT	101.69	18.31	120.00	51.60
Mano de obra canto	1.00	ML	58.02	0.00	58.02	58.02
Mortero 1:3 para bloques	0.00	M3	6,503.17	1,170.57	7,673.74	19.18
					TOTAL RD\$/ML	128.80

AMB0007 - Excavación - M3

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Herramientas (2%)	2.00	PA	9.60	0.00	9.60	19.20
Paleador	1.00	DIA	161.77	0.00	161.77	161.77
Picador	3.00	DIA	140.92	0.00	140.92	422.76
					TOTAL RD\$/M3	603.73

AMB0007 - Bote de material no clasificado - 1 m3

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Camion	1.00	VIAJE	1,694.92	305.08	2,000.00	2,000.00
Herramientas	0.02	%	18.00	0.00	18.00	0.36
Peones	1.73	HR	90.00	0.00	90.00	155.66
					TOTAL RD\$/M3E	550.01

AMB0007 - ACERAS HORMIGON E=0.10m HORMIGON 180KG/CM2 BARRIDA Y VIOLINADA

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Hormigón industrial 180kg/cm2 - 10% desp	0.11	M3	6,638.38	1,194.91	7,833.29	822.50
Limpieza y sellado grietas-y aplicaci3n 1ra mano pintura impermeabilizante	1.00	M2	85.00	0.00	85.00	85.00
Mano de obra acera frotada y violinada, incluye colocaci3n hormig3n 10cms	1.00	M3	218.00	0.00	218.00	218.00
Regla madera americana cepillada 1-pulg x4-pulg / 20 usos	1.00	PT	79.12	14.24	93.36	93.36
TOTAL RD\$/M2						1,218.86

AMB0007 - Acondicionamiento de Area - 1M2, Rend. 80M2

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Herramientas	1.00	UNIDA D	400.00	0.00	400.00	400.00
Obrero	2.00	DIA	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
TOTAL RD\$/M2						35.00

AMB0007 - REPARACION DE CONTENES - ml

Descripción	Cantidad	Unidad	P.U - ITBIS	ITBIS	P.U + ITBIS	Valor RD\$
Carga y bote de material a mano	0.93	M3E	523.73	94.27	618.00	575.73
Madera cepillada pino americano	0.62	PT	93.22	16.78	110.00	68.20
Mano de obra contenes - madera y pulido cont3n con bordillo 40cm h x 10cm a	7.41	ML	273.79	0.00	273.79	2,028.78
Picador	2.00	DIA	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
Plantillas en plywood 3/4" sum. y confecci3n	1.23	UND	388.77	69.98	458.75	564.26
Vac. y ligado hormig3n 180kg/cm2 - 10% desp	0.70	M3	6,740.25	1,213.25	7,953.50	5,567.45
TOTAL RD\$/ML						635.55
