


OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2024
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN, AVANCES DE OBRAS
EJECUCION TRIMESTRAL (ABRIL-JUNIO) 2024

1) BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO TENARES PARA EL AÑO 2024

Estado de situación obras PPM-2024	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	8	36%
Obras en proceso	2	9%
Obras pendientes	12	55%
TOTAL	22	100%

Análisis de Ejecución

■ Obras Ejecutadas
 ■ Obras en proceso
 ■ Obras pendientes

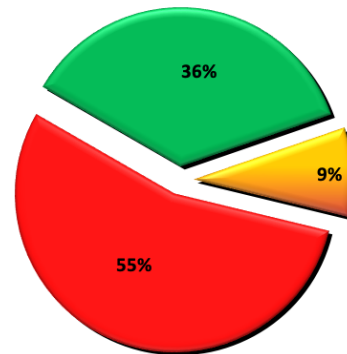


A. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL TENARES, 2024.

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$1,550,000.00	RD\$439,000.00	RD\$1,111,000.00	28%

Balance de Ejecución

■ Fondo de Disponibilidad Financiera
■ Monto de las obras ejecutadas y en proceso
■ Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF

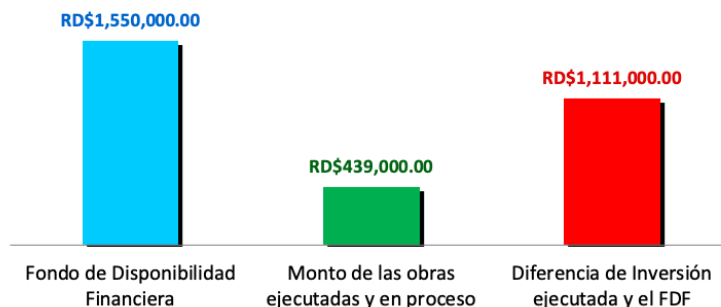

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO
MATRIZ DE NIVELES, AVANCES DE OBRAS, PPM-2024
Segundo Trimestre (abril-junio) 2024

OBRAS PROGRAMADAS PARA EJECUCION	PRESUPUESTO		AVANCES			OBSERV.
	Estimado	Ejecutado	50 %	80 %	100 %	
Adquisición de Lámparas led para el alumbrado público, Los Jobos	62,000	-	-	-	✓	Terminada
Adquisición de Lámparas led para el alumbrado público, Blanquito	62,000	-	-	-	✓	Terminada
Adquisición de Lámparas led para el alumbrado público, Los Palmaritos	58,000	-	-	-	✓	Terminada
Adquisición de Lámparas Led para el alumbrado público, Los Pomos	49,000	-	-	-	✓	Terminada
Adquisición de Lámparas Led para Alumbrado, Corozal Al Medio	63,000	-	-	-	✓	Terminada
Adquisición de Lámparas led para el alumbrado público, Arroyo Seco	50,000	-	-	-	✓	Terminada
Adquisición de Lámparas led para el alumbrado público, Julián Javier II	50,000	-	-	-	✓	Terminada
Colocación de Lámparas led para el tendido Eléctrico, Corozal Abajo	45,000	-	-	-	✓	Terminada
Acondicionamiento baño y biblioteca Comunitaria, Corozal Arriba	80,000	-	✓	-	-	En Ejecucion
Acondicionamiento Capilla (Escalera calzada Baranda) Loma Azul	80,000	-	✓	-	-	En Ejecucion
Colocación de Postes para el Tendido Eléctrico, Maco	62,000	-	-	-	-	-
Colocación de bancos de madera para capilla, Los Guayos	62,000	-	-	-	-	-
Reclinable de Banco de la Capilla comunitaria, La Jagüita	27,000	-	-	-	-	-
Colocación de puertas e instalación de abanicos el club, Gran Parada	107,000	-	-	-	-	-
Construcción de Baden en calle principal de la comunidad, Los Then	45,000	-	-	-	-	-
Acondicionamiento del centro comunitario, Cigua	62,000	-	-	-	-	-
Colocación Postes del tendido Eléctrico y Lámparas, Los Guazaros	100,000	-	-	-	-	-
Materiales para la Construcción del Centro Comunitario, La Catalina	210,000	-	-	-	-	-
Acondicionamiento Centro comunitario (pintura e iluminación), El Placer	72,000	-	-	-	-	-
Colocación de plafón de la capilla comunitaria, Los Cayos	70,000	-	-	-	-	-
Acondicionamiento del Centro Comunitario, Los Hoyos	61,000	-	-	-	-	-
Acondicionamiento del Centro Comunitario, Paso Hondo	73,000	-	-	-	-	-

Elaborado por:



José Luis Martínez Rosa
Encargado de Planeamiento Urbano.

