

Villa Tapia, Prov. Hermanas Mirabal  
Lunes 28 de abril, 2025

## MEMORANDO

**A :** Wenseslao Casimiro Gonzalez  
Presidente del Comité de Seguimiento de PPM-2025

**AL :** Comité de Seguimiento y Control Municipal de Presupuesto Participativo Municipal de Villa Tapia.

**CC :** Héctor Vásquez  
Encargado Presupuesto Participativo

**DE :** DRA. RAQUEL ROSANNA DEL MILAGRO ROSARIO  
Alcaldesa Municipal de Villa Tapia

**ASUNTO :** INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE AVANCES DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL [PRIMER TRIMESTRE 2025]

**ANEXO :** REPORTE | INFORME


Recibido  
  
28/4/2025

Estimados miembros del Comité:

Por este medio, tengo a bien remitir el **Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al primer trimestre del año 2025**, en el cual se detallan los avances en la ejecución de las obras contempladas en el **Plan de Inversión del Presupuesto Participativo Municipal 2025 (PPM)**.

Agradecemos su valioso acompañamiento y les exhortamos a continuar promoviendo una gestión municipal participativa, inclusiva y orientada al desarrollo local.

Cordialmente,

  
DRA. RAQUEL ROSANNA DEL MILAGRO ROSARIO  
Alcaldesa Municipal de Villa Tapia






**PLAN DE INVERCION MUNICIPAL PPM-2025**  
**Informe de Avances de Ejecución de Obras**  
**Trimestre Enero - Marzo 2025**




**PLAN DE INVERCION MUNICIPAL, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2025**

OBRAS PROGRAMADAS	SECCION	PRESUPUESTO ASIGNADO RD\$	PRESUPUESTO EJECUTADO RD\$	NIVEL DE AVANCE %	ESTADO DE EJECUCION
Adquisición y Colocación de lámparas led para el alumbrado público de las comunidades: Las Aromas, La Ceiba, La Ceiba Afuera, La Ceiba Adentro, Campeche,	La Ceiba	480,000.00	235,882.00	49.14%	Ejecutada 50 %
Adquisición y Colocación de lámparas led para el alumbrado público de las comunidades: Santa Ana, La Gina, La Cuarenta, Madrid, Rancho Viejo, Arenoso y	Santa Ana	480,000.00	235,882.00	49.14%	Ejecutada 50 %
Adquisición y Colocación de lámparas led para el alumbrado público de las comunidades: San José, Sabana Angosta, El Coco Central, El Coco I, El Coco II,	San Jose	480,000.00	235,882.00	49.14%	Ejecutada 50 %
Construcción de Rampas de acceso universal en oficinas de servicios públicos, entidades bancarias, parques y plazas	Zona Urbana	80,000.00	84,872.00	106.09%	Terminada 100%
Acondicionamiento del Centro Comunitario e Instalación de Tendido Eléctrico en el Sector Las Guásumas.	Los Limones	240,000.00	247,982.00	103.33%	Terminada 100%
Adquisición y Colocación de Alcantarilla en el sector El Play de Los Limones.	Los Limones	240,000.00	248,340.00	103.48%	Terminada 100%
		<b>2,000,000.00</b>	<b>1,288,840.00</b>		

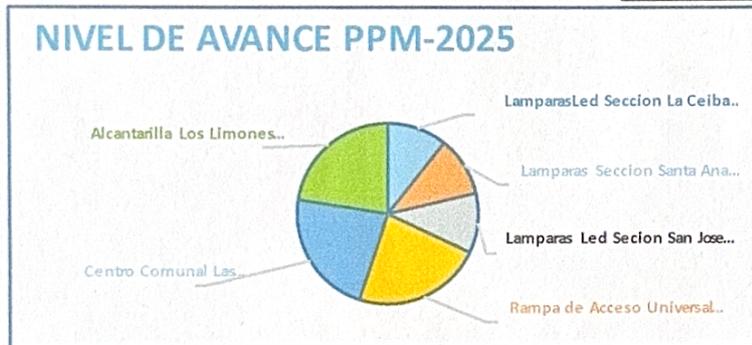

**BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN PPM- 2025.**

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	NIVEL DE AVANCE %
Obras Ejecutadas 100%	3	50%
Obras en Proceso de Ejecucion	3	50%
Obras pendientes por Iniciar	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>



**BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN PPM- 2025.**

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA ASIGNADO PPM-2025 RD\$	PRESUPUESTO EJECUTADO RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN RD\$	NIVEL DE AVANCE %
<b>2,000,000.00</b>	<b>1,288,840.00</b>	<b>711,160.00</b>	<b>64%</b>

*Raquel Rosanna*  
**RAQUEL ROSANNA ROSARIO JORGE**  
 Alcaldesa Municipal



*Israel Rodriguez Mercado*  
**ISRAEL RODRIGUEZ MERCADO**  
 Enc. Planificación y Programación
