

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LORENZO DE GUAYUB?N
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 4 | 2


Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			6,425,000.00	0.00	0.00	0.00	6,425,000.00	0.00	6,425,000.00	0.00	1,163,750.00	1,163,750.00	0.00	1,163,750.00	5,261,250.00
01	0051		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES - EL POCITO	1		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0052		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES - GUAYUBIN	1		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
01	0053		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES - EL CAYAL	1		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	570,000.00	30,000.00
01	0054		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES - MANGA	1		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0055		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES - BOHIO VIEJO	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0056		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES EN EL PLAY - JUAN GOMEZ	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
			Proyecto 08			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	330,275.85	330,275.85	0.00	330,275.85	969,724.15
08	0051		REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	330,275.85	330,275.85	0.00	330,275.85	969,724.15
			Proyecto 09			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	379,355.64	379,355.64	0.00	379,355.64	20,644.36
09	0051		VERJA PERIMETRAL Y DEPOSITO DE AGUA - HATO DEL MEDIO ABAJO	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	379,355.64	379,355.64	0.00	379,355.64	20,644.36
			Proyecto 03			2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	115,303.91	2,215,303.91	0.00	489,538.70	489,538.70	0.00	489,538.70	1,725,765.21
03	0051		CONTINUACION CASA CLUB - LA PEÑA RANCHADERO	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	0052		TECHADO DEL CLUB - MACHETE	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	115,303.91	515,303.91	0.00	489,538.70	489,538.70	0.00	489,538.70	25,765.21
03	0053		CONSTRUCCIÓN DE VERJAS PERIMETRAL CASA CLUB - CABEZA DE TORO	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 02			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
02	0051		CONSTRUCCIÓN VERJAS DE CEMENTERIO - RANCHADERO	1		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
			Proyecto 03			2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	115,303.91	2,215,303.91	0.00	489,538.70	489,538.70	0.00	489,538.70	1,725,765.21
03	0051		CONSTRUCCION DE FUNERARIA - MARTIN GARCIA	1		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
			Proyecto 01			6,425,000.00	0.00	0.00	0.00	6,425,000.00	0.00	6,425,000.00	0.00	1,163,750.00	1,163,750.00	0.00	1,163,750.00	5,261,250.00
01	0051		CONSTRUCCION CANCHA - VILLA SINDA	1		625,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	593,750.00	593,750.00	0.00	593,750.00	31,250.00
TOTAL GENERAL						10,825,000.00	0.00	0.00	0.00	10,825,000.00	115,303.91	10,940,303.91	0.00	2,362,920.19	2,362,920.19	0.00	2,362,920.19	8,577,383.72


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LORENZO DE GUAYUB?N
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 4 | 2

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 + 8


Preparado por

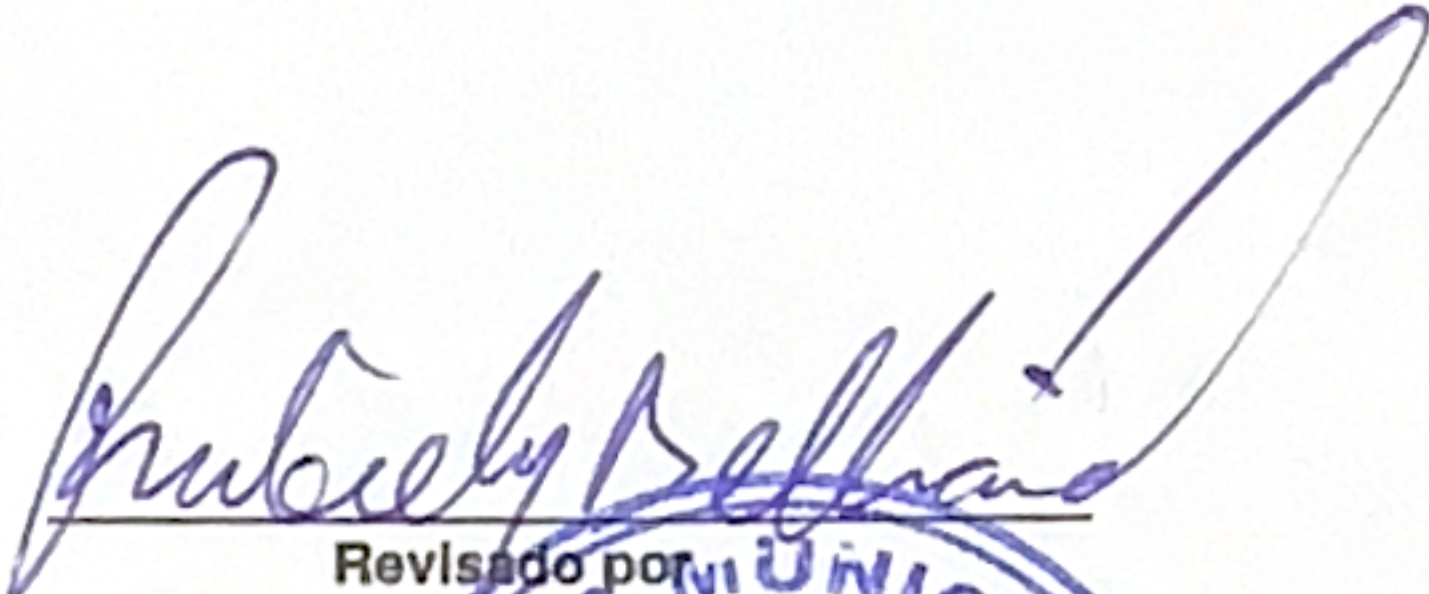

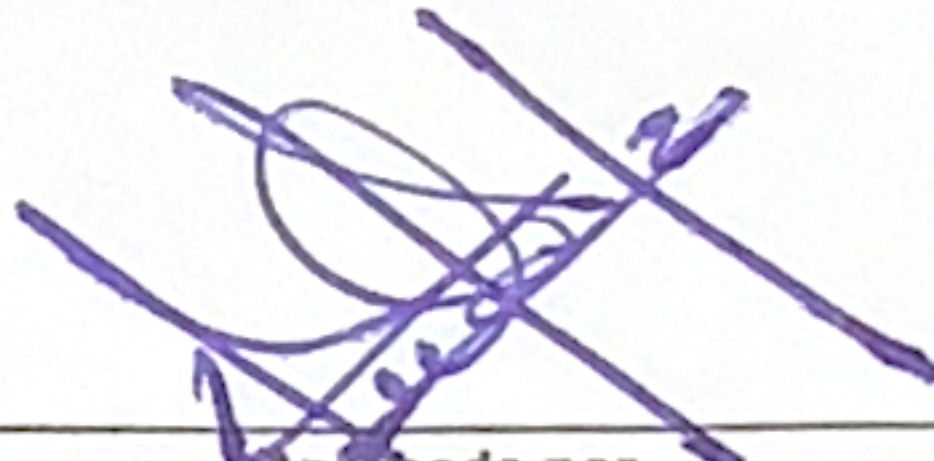Revisado por



Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
