



INFORME SEMESTRAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL – PPM 2025

PERÍODO: ENERO – JUNIO, 2025

I. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del compromiso asumido con las comunidades en el marco del Presupuesto Participativo Municipal (PPM) y de los principios de transparencia, participación y corresponsabilidad ciudadana, el Ayuntamiento Municipal de Villa Tapia presenta este informe semestral al Comité de Seguimiento y Control Municipal, correspondiente al período enero-junio del año 2025.

En el marco de los compromisos asumidos con la ciudadanía a través del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), el Ayuntamiento Municipal de Villa Tapia presenta el presente **Informe Semestral de Avance de Ejecución de Obras**, correspondiente al período **enero–junio del año 2025**.

Este informe tiene como objetivo dar a conocer, de forma clara y detallada, el nivel de cumplimiento de las obras priorizadas por las comunidades durante el proceso de formulación participativa del presupuesto. A través de esta rendición de cuentas, se fortalece la transparencia institucional, la corresponsabilidad en la gestión pública y la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en el seguimiento a la ejecución de los proyectos comunitarios.

El documento incluye la descripción técnica y financiera de cada obra, su nivel de avance físico y económico, el estado actual de ejecución y un balance consolidado de la inversión realizada en este primer semestre.

También se incorporan gráficos ilustrativos y anexos que respaldan la veracidad de la información presentada.



II. DETALLE DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Durante el primer semestre del año 2025, el Ayuntamiento Municipal de Villa Tapia ha continuado con la ejecución de los proyectos priorizados en el marco del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), de conformidad con los acuerdos comunitarios y los recursos asignados.

A continuación, se presenta un cuadro detallado de las obras programadas, especificando la comunidad beneficiada, el monto asignado y ejecutado, el nivel de avance físico y el estado de ejecución de cada una:


OBRAS / PROYECTOS	SECCIÓN / COMUNIDAD	PRESUPUESTO O ASIGNADO (RD\$)	PRESUPUESTO O EJECUTADO (RD\$)	% DE AVANCE	ESTADO DE EJECUCIÓN
Adquisición y colocación de lámparas LED para alubrado publico.	La Ceiba	480,000.00	235,882.00	49.14%	Ejecutada 50%
Adquisición y colocación de lámparas LED para alubrado publico.	Santa Ana	480,000.00	235,882.00	49.14%	Ejecutada 50%
Adquisición y colocación de lámparas LED para alubrado publico.	San José	480,000.00	235,882.00	49.14%	Ejecutada 50%
Construcción de rampas de acceso universal	Zona Urbana	80,000.00	0.00	0.00%	En proceso de análisis
Acondicionamiento del centro comunitario e Iglesia Católica	Los Limones / LaS Guazumas	240,000.00	247,982.00	103.33 %	Terminada
Adquisición y colocación de alcantarilla en el sector El Play	Los Limones	240,000.00	248,340.00	103.48 %	Terminada

Total de inversión asignada: RD\$ 2,000,000.00

Total ejecutado al 30 de junio 2025: RD\$ 1,203,968.00



a. Grafico de nivel de ejecucion por obra PPM-2025

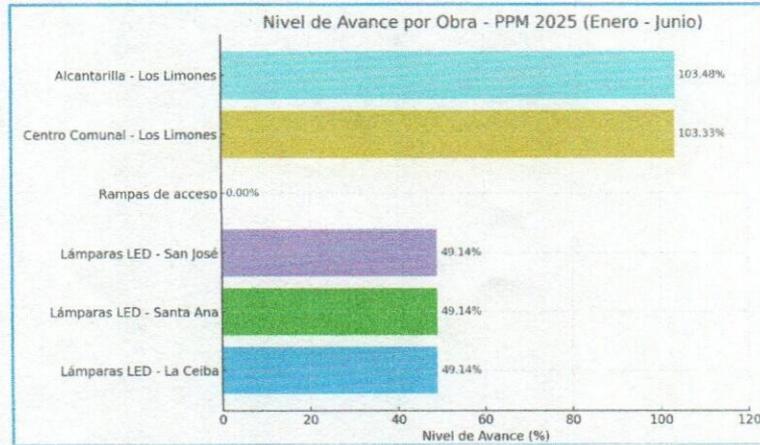

III. ESTADO GENERAL DE LA EJECUCIÓN

Con base en el seguimiento técnico y administrativo realizado por el Ayuntamiento Municipal de Villa Tapia durante el período enero–junio del año 2025, se presenta el resumen consolidado del estado de ejecución de las seis (6) obras aprobadas en el marco del Presupuesto Participativo Municipal (PPM–2025).


a. Tabla estado de ejecucion semestral PPM- 2025

CATEGORÍA	CANTIDAD DE OBRAS	% AVANCES
Obras Ejecutadas 100%	2	33 %
Obras en Proceso de Ejecución	3	50 %
Obras Pendientes por Iniciar	1	17%
Total de Obras Programadas	06	100%

Este balance refleja que más del 80% de las obras se encuentran ejecutadas total o parcialmente al cierre del primer semestre del año, lo que constituye un avance significativo en el cumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades. La única obra pendiente por iniciar corresponde a la construcción de rampas de acceso universal, actualmente en fase de análisis técnico.



b. Gráficos estado General de ejecución semestral PPM-2025

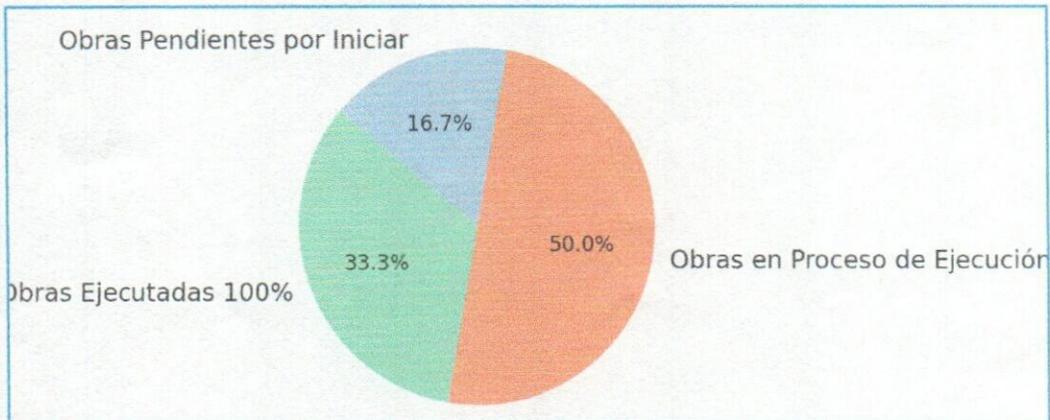

IV. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION


Durante el período enero–junio del año 2025, el Ayuntamiento Municipal de Villa Tapia dispuso de un monto total asignado de RD\$ 2,000,000.00 para la ejecución de los proyectos priorizados mediante el Presupuesto Participativo Municipal (PPM–2025)

a. Resumen la Ejecucion financiera Semestral PPM-2025

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	VALOR RD\$	Nivel Avance %
Asignado PPM–2025	2,000,000.00	
Presupuesto Ejecutado	1,203,968.00	
Diferencia de Inversión	796,032.00	
Nivel de Avance %		60%



b. Gráfico balance financiero de Ejecución PPM-2025

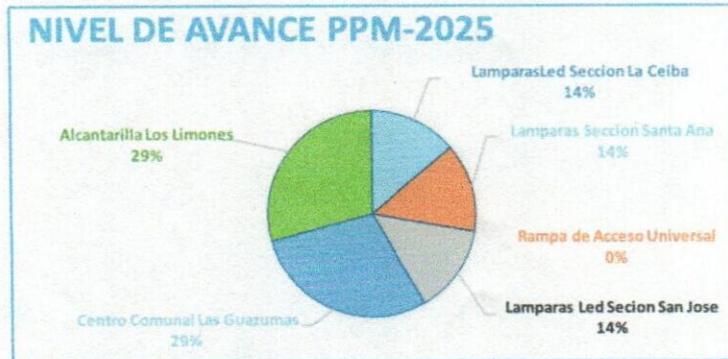

V. FIRMA DEL EQUIPO TÉCNICO Y AUTORIDADES

Para constancia de lo expuesto en el presente Informe Semestral de Avance de Ejecución de Obras correspondiente al Presupuesto Participativo Municipal (PPM-2025), período enero-junio, suscriben el mismo las autoridades municipales y responsables técnicos, en señal de conformidad y compromiso con la transparencia, la planificación y el desarrollo Social del municipio de Villa Tapia

Arq. Edwin Castillo
Enc. de Planeamiento Urbano

Ing. Héctor Vásquez
Enc. Presupuesto Participativo

Ing. Israel Rodríguez Mercado
Acesor General | OMPP

Lcda. Rosanna Mercedes Duran
Enc. Desarrollo Social y Part. Com.

Doctora Raquel Rosanna Rosario
Alcaldesa Municipal

Licda. Leonela Jazmin Sosa Pozo
Enc. Dicción Financiera-Tesorería



ACTA DE ENTREGA

INFORME SEMESTRAL DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL; PERÍODO ENERO – JUNIO 2025.

En el municipio de **Villa Tapia**, provincia Hermanas Mirabal, a los **(11)** días del mes de **(Junio)** del año 2025, siendo las (10:30) horas de la mañana, reunidos en el salon de reuniones del Ayuntamiento Municipal de villa Tapia los miembros del **Comité de Seguimiento y Control Municipal del Presupuesto Participativo 2025**, con el propósito de recibir formalmente el **Informe Semestral de Ejecución de Obras** correspondiente al período **enero-junio 2025**.

El informe fue entregado por la **Dra. Raquel Rosanna Rosario**, Alcaldesa Municipal, junto al **equipo tecnico del ayuntamiento**, quienes resaltaron los avances logrados en la ejecución de los proyectos priorizados a través del Presupuesto Participativo Municipal 2025, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia y la participación ciudadana.

Una vez revisado el documento, los miembros del Comité procedieron a firmar la presente acta en señal de **recepción conforme y compromiso de continuar el seguimiento activo a las obras en ejecución**

FIRMAS DE RECEPCION.

Comité de Seguimiento y Control Municipal del Presupuesto Participativo 2025

NOMBRES Y APELLIDOS	FUNCION	FIRMA
Wenseslao Casimiro Gonzalez	Presidente	
Ramon Reyes Álvarez	Miembro	
Alba Nuris Sosa	Miembro	
Rosa Simó E.	Miembro	

FIRMAS DE EQUIPO TECNICO DEL AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES

Arq. Edwin Castillo
Enc. de Planeamiento Urbano

Ing. Héctor Vásquez
Enc. Presupuesto Participativo - PPM

Ing. Israel Rodríguez Mercado
Acesor General

Rosanna Mercedes Duran
Enc. Desarrollo Social y Part. Comunitaria

Dra. Raquel Rosanna Rosario
Alcaldesa Municipal

Licda. Leonela Jazmin Sosa
Enc. Divicion Financiera-Tesoreria



CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA – PPM-2025 PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL –PIM AÑO 2025 [RD\$ 2,00,000.00]															
NO.	PROYECTO APROBADO	COMUNIDAD / SECCIÓN	MONTO RD\$	FECHA DE INICIO / TERMINO											
				1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre		
				Ene - Mar			Abr - Jun			Jul - Sept			Oct - Dic		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Adquisición y Colocación de lámparas led para el alumbrado público de comunidades	La Ceiba	480,000												
2	Adquisición y Colocación de lámparas led para el alumbrado público de comunidades	Santa Ana	480,000												
3	Adquisición y Colocación de lámparas led para el alumbrado público de comunidades	San Jose	480,000												
5	Construcción de Rampas de acceso universal en oficinas de servicios públicos, entidades bancarias	Zona Urbana	80,000												
5	Acondicionamiento del Centro Comunitario e Iglecia Las Guásumas.	Los Limones	240,000												
6	Colocación de Alcantarilla en el sector El Play de Los Limones.	Los Limones	240,000												

LEYENDA
1ER TRIMESTRE
2DO. TRIMESTRE
3ER. TRIMESTRE
4TO. TRIMESTRE



DIFUSIÓN REDES SOCIALES & PAGINA WEB INSTITUCIONAL
Avances Ejecución de Obras [Primer Semestre PPM-2025]

f FACEBOOK

Alcaldía de Villa Tapia
abr 11 · 🌐

¡La Alcaldía de Villa Tapia sigue cumpliendo con el Presupuesto Participativo!

Nuestra alcaldesa, Dra. Raquel Rosario, junto al Consejo de Regidores, realizó la entrega de 100 lámparas destinadas a la sección de La Ceiba.

Estas lámparas beneficiarán directamente a las comunidades de Las Aromas, La Ceiba, La Ceiba Afuera, La Ceiba Adentro, Campeche, El Hato, Coquitos y El Hospital.

Con esta acción, seguimos iluminando nuestros barrios y fortaleciendo el compromiso de construir juntos un municipio más seguro y desarrollado.

#VillaTapia #GestiónQueCumple #PresupuestoParticipativo



Alcaldía de Villa Tapia
abr 12 · 🌐

¡La Alcaldía de Villa Tapia sigue cumpliendo con el Presupuesto Participativo!

Nuestra alcaldesa, junto al cuerpo de regidores, la tesorera Leonela Sosa, Héctor Vásquez, director de Presupuesto Participativo, e Israel Rodríguez, director de Proyectos, realizaron la entrega de 100 lámparas que beneficiarán a la sección de San José, abarcando las comunidades de San José, Sabana Angosta, El Coco Central, El Coco I, El Coco II, El Ranchito, Alto Alegre y Los Limones.

Con acciones como esta, seguimos iluminando nuestras comunidades y demostrando que el Presupuesto Participativo es una herramienta real para llevar soluciones a la gente.

¡Seguimos trabajando juntos por un Villa Tapia más seguro y próspero!

#VillaTapia #PresupuestoParticipativo #SeguimosCumpliendo



Alcaldía de Villa Tapia
abr 10 · 🌐

¡Seguimos cumpliendo con el presupuesto participativo!

Nuestra alcaldesa de Villa Tapia, la Dra. Raquel Rosario, junto al Consejo de Regidores, hizo entrega de 100 de las 175 lámparas que beneficiarán a la sección de Santa Ana, compuesta por las comunidades de Santa Ana, La Gina, La Cuarenta, Madrid, Rancho Viejo, Arenoso y San José de Cenovi.

Con estas acciones, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano con nuestra gente, llevando soluciones reales a cada rincón de nuestro municipio.

#VillaTapiaAvanza #PresupuestoParticipativo #GestiónQueCumple



Instagram

alcaldiavillatapia24 y raquel_alcaldesa_vt



31 2 3

Les gusta a ljs_p08 y otros
alcaldiavillatapia24 ¡Seguimos cumpliendo con el presupuesto participativo!

Nuestra alcaldesa de Villa Tapia, la Dra. Raquel Rosario, junto al Consejo de Regidores, hizo entrega de 100 de las 175 lámparas que beneficiarán a la sección de Santa Ana, compuesta por las comunidades de Santa Ana, La Gina, La Cuarenta, Madrid, Rancho Viejo, Arenoso y San José de

Colocación de Alcantarilla Los Limones.



alcaldiavillatapia24 y raquel_alcaldesa_vt
Villa Tapia, Prov. Hermanas Mirabal



32 1 5

Les gusta a ljs_p08 y otros
alcaldiavillatapia24 ¡La Alcaldía de Villa Tapia sigue cumpliendo con el Presupuesto Participativo!

Nuestra alcaldesa, Dra. Raquel Rosario, junto al Consejo de Regidores, realizó la entrega de 100 lámparas destinadas a la sección de La Ceiba.

Estas lámparas beneficiarán directamente a las

Acondicionamiento Centro Comunitario



alcaldiavillatapia24 y 3 más



29 0 10

Les gusta a ljs_p08 y otros
alcaldiavillatapia24 ¡La Alcaldía de Villa Tapia sigue cumpliendo con el Presupuesto Participativo!

Nuestra alcaldesa, junto al cuerpo de regidores, la tesorera Leonela Sosa, Héctor Vásquez, director de Presupuesto Participativo, e Israel Rodríguez, director de Proyectos, realizaron la entrega de 100 lámparas que beneficiarán a la sección de San José, abarcando las comunidades de San José, Sabana Angosta, El Coco Central, El Coco I, El Coco II, El Ranchito, Alto Alegre y Los Limones.

Acondicionamiento Puntura Iglesia

