



**Acta de Reunión de Rendición de Cuentas del nivel de avances de las obras del Presupuesto Participativo Municipal con los miembros del Comité de Seguimiento y Control del PPM.**

**Primer Semestre 2026 (ENERO-JUNIO)**

En el municipio de San Pedro de Macorís.

A los seis (6) días de mes de julio del año 2026, siendo las 10:00 am, en el despacho del alcalde Raymundo Ortiz, estando reunidos los miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal, así como la señora Lenny Yumilka Valdez, encargada del departamento de Asuntos Comunitarios y el alcalde municipal, Ingeniero Raymundo Ortiz, con la siguiente agenda:

Único: Hacer entrega de la matriz de avance de las obras del presupuesto participativo del año 2026.

El Comité de Seguimiento tienen como finalidad supervisar que las obras del Presupuesto Participativo Municipal se realicen en el orden de prioridad establecidos, con la mayor calidad, eficiencia y transparencia posibles, tomando en cuenta el estudio de prefactibilidad y presupuestos previamente elaborados.

Desarrollo de la agenda:

- La reunión inició a las 10:27 am del día 3 de julio del año 2026.
- Hizo uso de palabra la encargada de Asuntos Comunitarios y coordinadora del presupuesto participativo, Sra. Yumilka Valdez, quien luego de dar las palabras de bienvenida, hizo entrega de la matriz de avances de las obras.
- Se destacó la terminación de 51 obras en el primer trimestre del año 2026, iniciadas en el mes de diciembre del año 2025, por un monto de RD\$8,981,710.94, correspondientes al Presupuesto Participativo 2025.
- Se detalló el nivel de avance de la ejecución del Presupuesto Participativo del año 2026, consistente en la ejecución del inicio y nivel



# ALCALDÍA SAN PEDRO DE MACORÍS

GESTIÓN 2024-2028



de avance de 133 obras de un total de 185 contempladas para este año, lo cual representa un porcentaje de un 72%.

- La presidenta del Comité de Seguimiento destacó los avances en la ejecución del presupuesto participativo, así como detalló las observaciones y hallazgos en las supervisiones y seguimiento de las obras realizadas en los diferentes sectores, las cuales, previamente, fueron entregados a la Dirección de Planeamiento Urbano, para los fines de corrección, en los casos que los ameritaban.
- Finalmente, el alcalde Raymundo Ortiz agradeció la participación de los miembros del Comité de Seguimiento, así como reafirmó su compromiso de ejecutar los presupuestos participativos faltantes del año 2026, para lo cual, según informó, se están confeccionando el Pliego de Condiciones, así como las especificaciones técnicas para el debido proceso de contratación de dichas obras, al tenor de lo establecido en la ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas.
- La reunión finalizó a las 11:52 am.



*Lenny Yumilka Valdez*

Lenny Yumilka Valdez

Enc. Depto. de Asuntos Comunitarios

*Freisis Encarnación*

Freisis Encarnación

Presidente Comité Seguimiento



*Raymundo Ortiz*

Raymundo Ortiz  
Alcalde Municipal





Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís  
Rendición de Cuentas de la ejecución de las obras del Presupuesto Participativo Municipal  
Primer Semestre (Enero-Junio) 2026

| Sector                  | Nombre de la Obras.        | Valor      | Total Ejec. | Total Pte. | Status     | % Ejecutado |
|-------------------------|----------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 24 de abril             | Badenes                    | 225,000.00 | 126,824.94  | 98,175.06  | En Proceso | 56%         |
| Altos de San Pedro      | Rotulación.                | 250,000.00 | -           | 250,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Bajo Manhattan          | Aceras y Contenes.         | 200,000.00 | 51,949.97   | 148,050.03 | En Proceso | 26%         |
| Barrio el Centro        | Rep. Centro Comunal        | 220,000.00 | -           | 220,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Batey Alemán            | Remosamiento de Parque.    | 175,000.00 | -           | 175,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Batey Alemán            | Donaciones.                | 75,000.00  | -           | 75,000.00  | Pendiente  | 0%          |
| Batey Angelina          | Parque                     | 200,000.00 | 59,194.93   | 140,805.07 | En Proceso | 30%         |
| Batey Angelina          | Donaciones                 | 50,000.00  | -           | 50,000.00  | Pendiente  | 0%          |
| Batey Esperanza         | Rep. De Parque.            | 130,000.00 | -           | 130,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Batey Esperanza         | Rep.de Cancha.             | 100,000.00 | -           | 100,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Batey Inocencia         | Contenes.                  | 240,000.00 | 167,323.50  | 72,676.50  | En Proceso | 70%         |
| Batey Monte Cristi      | Parque.                    | 250,000.00 | -           | 250,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Batey Nuevo             | Reparacion de Parque       | 200,000.00 | -           | 200,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Batey Nuevo             | Donaciones.                | 50,000.00  | -           | 50,000.00  | Pendiente  | 0%          |
| Batey Olivares          | Bacheo.                    | 245,000.00 | 72,302.83   | 172,697.17 | En Proceso | 30%         |
| Bo Evangelina Rodríguez | Arreglo de parque.         | 225,000.00 | -           | 225,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Bo. La Puerta           | Imbornales.                | 210,000.00 | 62,151.70   | 147,848.30 | En Proceso | 30%         |
| Bo. 30 de mayo          | Imbornales.                | 200,000.00 | 59,162.10   | 140,837.90 | En Proceso | 30%         |
| Bo. Azul                | Badenes                    | 125,000.00 | 61,875.00   | 63,125.00  | En Proceso | 50%         |
| Bo. Azul                | Donaciones.                | 100,000.00 | -           | 100,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Bo. Blanco 1            | Cementación de Callejones. | 125,000.00 | 77,123.96   | 47,876.04  | En Proceso | 62%         |
| Bo. Blanco 1            | Aceras Y Contenes.         | 100,000.00 | 59,700.00   | 40,300.00  | En Proceso | 60%         |
| Bo. Blanco 2            | Cementación de Callejones. | 225,000.00 | 126,824.78  | 98,175.22  | En Proceso | 56%         |
| Bo. El Brisar           | Bacheo.                    | 125,000.00 | 37,125.00   | 87,875.00  | En Proceso | 30%         |
| Bo. El Brisar           | Donación.                  | 100,000.00 | -           | 100,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Bo. Enriquillo          | Aceras Y Contenes.         | 225,000.00 | -           | 225,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Bo. Filipina            | Aceras Y Contenes.         | 250,000.00 | 198,515.26  | 51,484.74  | En Proceso | 79%         |
| Bo. Hazim               | Bacheo en Caliente.        | 225,000.00 | -           | 225,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Bo. Japón               | Aceras y Contenes.         | 150,000.00 | 130,693.50  | 19,306.50  | En Proceso | 87%         |
| Bo. Japón               | Imbornales.                | 100,000.00 | 57,087.33   | 42,912.67  | En Proceso | 57%         |
| Bo. Juan Pablo Duarte   | Badenes.                   | 250,000.00 | 103,950.00  | 146,050.00 | En Proceso | 42%         |
| Bo. Kennedy             | Imbornales                 | 250,000.00 | -           | 250,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Bo. La Belleza 1        | Electrificación.           | 250,000.00 | 74,250.00   | 175,750.00 | En Proceso | 30%         |
| Bo. La Belleza 2        | Electrificación.           | 250,000.00 | 74,250.00   | 175,750.00 | En Proceso | 30%         |
| Bo. La Cervecería       | Badenes.                   | 200,000.00 | 59,400.00   | 140,600.00 | En Proceso | 30%         |
| Bo. La Cervecería       | Donaciones.                | 50,000.00  | -           | 50,000.00  | Pendiente  | 0%          |
| Bo. Las Caobas          | Badenes.                   | 130,000.00 | 35,194.50   | 94,805.50  | En Proceso | 27%         |
| Bo. Las Caobas          | Imbornales.                | 100,000.00 | 29,700.00   | 70,300.00  | En Proceso | 30%         |
| Bo. Las Flores          | Imbornales.                | 100,000.00 | 57,087.33   | 42,912.67  | En Proceso | 57%         |
| Bo. Las Flores          | Badenes.                   | 150,000.00 | 74,250.00   | 75,750.00  | En Proceso | 50%         |
| Bo. Las Piedra          | Filtrantes.                | 120,000.00 | 75,639.85   | 44,360.15  | En Proceso | 63%         |
| Bo. Las Piedra          | Cementación de Callejón.   | 100,000.00 | 59,700.00   | 40,300.00  | En Proceso | 60%         |
| Bo. Lindo 1             | Imbornales                 | 250,000.00 | 73,990.12   | 176,009.88 | En Proceso | 30%         |
| Bo. Lindo 2             | Contenes.                  | 250,000.00 | 74,250.00   | 175,750.00 | En Proceso | 30%         |
| Bo. Loma del Cohero     | Badenes.                   | 220,000.00 | 62,073.00   | 157,927.00 | En Proceso | 28%         |
| Bo. Los Maestros        | Reparacion de Parque.      | 225,000.00 | -           | 225,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Bo. Los Transformadores | Aceras.                    | 225,000.00 | 60,369.81   | 164,630.19 | En Proceso | 27%         |
| Bo. México 1            | Imbornales.                | 150,000.00 | 76,936.99   | 73,063.01  | En Proceso | 51%         |
| Bo. México 1            | Iluminación.               | 100,000.00 | 29,700.00   | 70,300.00  | En Proceso | 30%         |
| Bo. México 2            | Imbornales                 | 250,000.00 | 141,637.63  | 108,362.37 | En Proceso | 57%         |
| Bo. México 3            | Badenes.                   | 250,000.00 | 72,418.50   | 177,581.50 | En Proceso | 29%         |
| Bo. México 4            | Badenes                    | 250,000.00 | 72,418.50   | 177,581.50 | En Proceso | 29%         |
| Bo. Puerto Rico.        | Imbornales.                | 200,000.00 | 119,367.95  | 80,632.05  | En Proceso | 60%         |
| Bo. Santa Clara         | Imbornales.                | 100,000.00 | 57,087.33   | 42,912.67  | En Proceso | 57%         |
| Bo. Santa Clara         | Aceras Y Contenes.         | 125,000.00 | 32,709.32   | 92,290.68  | En Proceso | 26%         |
| Bo. Sarmiento 1         | Badenes.                   | 200,000.00 | -           | 200,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Boca Del Soco           | Aceras Y Contenes.         | 150,000.00 | 130,693.50  | 19,306.50  | En Proceso | 87%         |
| Boca Del Soco           | Donaciones.                | 100,000.00 | -           | 100,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| BRISAS DEL ESTE         | Contenes.                  | 200,000.00 | 52,992.11   | 147,007.89 | En Proceso | 26%         |
| BRISAS DEL ESTE         | Iluminación.               | 45,000.00  | 13,365.00   | 31,635.00  | En Proceso | 30%         |
| Buenos Aires            | Construcion de Badenes.    | 120,000.00 | 55,440.00   | 64,560.00  | En Proceso | 46%         |
| Buenos Aires 1          | Donaciones.                | 100,000.00 | -           | 100,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Buenos Aires 2          | Donaciones.                | 100,000.00 | -           | 100,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Buenos Aires 2          | Badenes.                   | 110,000.00 | 28,215.00   | 81,785.00  | En Proceso | 26%         |
| Buenos Aires y El Patio | Bacheo.                    | 170,000.00 | 50,490.00   | 119,510.00 | En Proceso | 30%         |
| Buenos Aires y El Patio | Electrificación            | 75,000.00  | 22,275.00   | 52,725.00  | En Proceso | 30%         |
| Cascara Jicara          | Cementación de Callejones. | 245,000.00 | 142,764.24  | 102,235.76 | En Proceso | 58%         |
| El Golfo                | Aceras Y Contenes.         | 250,000.00 | 66,706.36   | 183,293.64 | En Proceso | 27%         |
| El Ocho                 | Aceras Y Contenes.         | 230,000.00 | 58,556.52   | 171,443.48 | En Proceso | 25%         |
| El Peñón                | Mini Acueducto.            | 250,000.00 | -           | 250,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| El Silencio             | Aceras y Contenes          | 190,000.00 | 49,435.74   | 140,564.26 | En Proceso | 26%         |
| El Silencio             | Donaciones.                | 60,000.00  | -           | 60,000.00  | Pendiente  | 0%          |
| EL TOCONAL              | Contrucion centro Comunal. | 200,000.00 | -           | 200,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Independencia           | Aceras y Contenes.         | 200,000.00 | 54,690.56   | 145,309.44 | En Proceso | 27%         |
| Ing. Santa Fe           | Terminacion de Parque.     | 120,000.00 | -           | 120,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Ing. Santa Fe           | Cementación de Callejones. | 120,000.00 | -           | 120,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| INVI-CEA                | Cementación de Callejones. | 125,000.00 | 77,124.94   | 47,875.06  | En Proceso | 62%         |
| INVI-CEA                | Aceras y contenes.         | 100,000.00 | 59,700.00   | 40,300.00  | En Proceso | 60%         |
| Jardines del Este       | Bacheo                     | 220,000.00 | 65,430.00   | 154,570.00 | En Proceso | 30%         |
| JOSE BLANCHE.           | Electrificación.           | 245,000.00 | 72,765.00   | 172,235.00 | En Proceso | 30%         |
| LA ARENA/ PUEBLO NUEVO. | Badenes.                   | 130,000.00 | 32,373.00   | 97,627.00  | En Proceso | 25%         |
| LA ARENA/ PUEBLO NUEVO. | Señalización.              | 100,000.00 | 29,700.00   | 70,300.00  | En Proceso | 30%         |

| Sector                      | Nombre de la Obras.        | Valor      | Total Ejec. | Total Pte. | Status     | % Ejecutado |
|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| La Laura                    | Terminacion de parque.     | 150,000.00 | -           | 150,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| La Laura                    | Bacheo                     | 100,000.00 | -           | 100,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| La Playa                    | Centro Comunal.            | 200,000.00 | -           | 200,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| La Playa                    | Donaciones.                | 50,000.00  | -           | 50,000.00  | Pendiente  | 0%          |
| La Primavera                | Drenaje Pluvial.           | 100,000.00 | 56,862.37   | 43,137.63  | En Proceso | 57%         |
| La Primavera                | Badenes.                   | 100,000.00 | 28,215.00   | 71,785.00  | En Proceso | 28%         |
| La Roca                     | Señalización.              | 100,000.00 | -           | 100,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| La Roca                     | Imbornales.                | 100,000.00 | 29,596.05   | 70,403.95  | En Proceso | 30%         |
| Las Colinas 1               | Lamparas.                  | 100,000.00 | 59,688.73   | 40,311.27  | En Proceso | 60%         |
| Las Colinas 1               | Badenes.                   | 140,000.00 | 61,380.00   | 78,620.00  | En Proceso | 44%         |
| Las Colinas 2               | IMBORNAL                   | 145,000.00 | 42,810.32   | 102,189.68 | En Proceso | 30%         |
| Las Colinas 2               | ELECTRIFICACION            | 100,000.00 | 29,700.00   | 70,300.00  | En Proceso | 30%         |
| Los 4 Caminos               | Lampara Completa.          | 100,000.00 | 29,492.10   | 70,507.90  | En Proceso | 29%         |
| Los 4 Caminos               | Imbornales.                | 100,000.00 | 29,700.00   | 70,300.00  | En Proceso | 30%         |
| Los Bomberito.              | Aceras Y Contenes.         | 250,000.00 | 73,198.85   | 176,801.15 | En Proceso | 29%         |
| Los Guandules               | Cementacion de Callejones. | 200,000.00 | 119,399.31  | 80,600.69  | En Proceso | 60%         |
| Los Guandules               | Donaciones.                | 60,000.00  | -           | 60,000.00  | Pendiente  | 0%          |
| Los Vicini (Casita)         | Aceras Y Contenes.         | 250,000.00 | 189,355.51  | 60,644.49  | En Proceso | 76%         |
| Luz Del Faro 2              | Contenes.                  | 150,000.00 | 44,550.00   | 105,450.00 | En Proceso | 30%         |
| Luz Del Faro 2              | Bacheo.                    | 100,000.00 | 29,700.00   | 70,300.00  | En Proceso | 30%         |
| Luz Del Faro1               | Electrificacion.           | 100,000.00 | 29,700.00   | 70,300.00  | En Proceso | 30%         |
| Luz Del Faro1               | Imbornales.                | 150,000.00 | 76,937.33   | 73,062.67  | En Proceso | 51%         |
| Miramar                     | Badenes.                   | 250,000.00 | 72,418.50   | 177,581.50 | En Proceso | 29%         |
| Naime 1                     | Terminacion del Camino.    | 225,000.00 | -           | 225,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Naime 2                     | Terminacion del Camino.    | 225,000.00 | -           | 225,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Naime 3                     | Aceras Y Contenes.         | 200,000.00 | 50,551.41   | 149,448.59 | En Proceso | 25%         |
| NUEVO AMANECER              | Bacheo.                    | 245,000.00 | 72,765.00   | 172,235.00 | En Proceso | 30%         |
| Ortiz                       | Badenes.                   | 125,000.00 | 36,865.12   | 88,134.88  | En Proceso | 29%         |
| Ortiz                       | Imbornales.                | 125,000.00 | 37,125.00   | 87,875.00  | En Proceso | 30%         |
| Palo De azúcar              | Imbornales.                | 200,000.00 | 59,192.10   | 140,807.90 | En Proceso | 30%         |
| Paraíso San Pedro           | Badenes.                   | 100,000.00 | 49,500.00   | 50,500.00  | En Proceso | 50%         |
| Paraíso San Pedro           | Imbornales y Filtrante     | 125,000.00 | 74,512.33   | 50,487.67  | En Proceso | 60%         |
| Pedro Justo Carrión 1       | Cancha.                    | 100,000.00 | 74,250.00   | 25,750.00  | En Proceso | 74%         |
| Pedro Justo Carrión 1       | Aceras y Contenes          | 150,000.00 | -           | 150,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Pedro Justo Carrión 2       | Bacheo en Tosca.           | 250,000.00 | 190,093.46  | 59,906.54  | En Proceso | 76%         |
| Pedro Justo Carrión 3       | Aceras y Contenes          | 250,000.00 | 198,515.26  | 51,484.74  | En Proceso | 79%         |
| Pérez Márquez               | Electrificacion.           | 200,000.00 | 59,400.00   | 140,600.00 | En Proceso | 30%         |
| Placer Bonito               | Señalización.              | 190,000.00 | 103,817.33  | 86,182.67  | En Proceso | 55%         |
| Placer Bonito               | Donaciones.                | 60,000.00  | -           | 60,000.00  | Pendiente  | 0%          |
| Plan Porvenir (Los Cajones) | Centro Comunal.            | 200,000.00 | 109,339.84  | 90,660.16  | En Proceso | 55%         |
| Pról. Placer Bonito         | Cementacion de Callejón.   | 200,000.00 | 51,949.97   | 148,050.03 | En Proceso | 26%         |
| Proyecto Kennedy            | Imbornales.                | 225,000.00 | -           | 225,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Proyecto los Reyes          | Electrificacion            | 250,000.00 | 74,250.00   | 175,750.00 | En Proceso | 30%         |
| Proyecto Porvenir 1         | Señalización.              | 100,000.00 | -           | 100,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Proyecto Porvenir 1         | Iluminacion.               | 100,000.00 | -           | 100,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Proyecto Porvenir 2         | Imbornales.                | 100,000.00 | 29,596.05   | 70,403.95  | En Proceso | 30%         |
| Proyecto Porvenir 2         | Aceras Y Contenes.         | 150,000.00 | 130,693.50  | 19,306.50  | En Proceso | 87%         |
| Punta De Garza              | Bacheo.                    | 225,000.00 | 66,825.00   | 158,175.00 | En Proceso | 30%         |
| Punta Pescadora 1           | Aceras Y Contenes.         | 250,000.00 | 170,293.50  | 79,706.50  | En Proceso | 68%         |
| Punta Pescadora 2           | Electrificacion.           | 235,000.00 | 69,795.00   | 165,205.00 | En Proceso | 30%         |
| Restauración 1              | Badenes.                   | 100,000.00 | 44,550.00   | 55,450.00  | En Proceso | 45%         |
| Restauración 1              | Donaciones.                | 150,000.00 | -           | 150,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Restauración 2              | Badenes.                   | 250,000.00 | 103,950.00  | 146,050.00 | En Proceso | 42%         |
| Retiro 23                   | Aceras Y Contenes.         | 200,000.00 | 51,949.97   | 148,050.03 | En Proceso | 26%         |
| San Antón                   | Bacheo.                    | 150,000.00 | 130,693.50  | 19,306.50  | En Proceso | 87%         |
| San Antón                   | Electrificacion.           | 100,000.00 | 69,300.00   | 30,700.00  | En Proceso | 69%         |
| Sarmiento 2                 | Imbornales.                | 100,000.00 | -           | 100,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Sarmiento 2                 | Alcantarillado.            | 100,000.00 | -           | 100,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Sector Bienvenido.          | Electrificacion.           | 100,000.00 | 29,700.00   | 70,300.00  | En Proceso | 30%         |
| Sector Bienvenido.          | Centro Comunal             | 150,000.00 | 42,697.49   | 107,302.51 | En Proceso | 28%         |
| Sector Cristo Rey           | Electrificacion.           | 150,000.00 | 44,550.00   | 105,450.00 | En Proceso | 30%         |
| Sector Cristo Rey           | Bacheo.                    | 100,000.00 | 29,700.00   | 70,300.00  | En Proceso | 30%         |
| URB. MALLÉN                 | Reparacion de Parque.      | 100,000.00 | -           | 100,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| URB. MALLÉN                 | Imbornales.                | 100,000.00 | -           | 100,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Urb. Oriental.              | ACERAS Y CONTENES.         | 225,000.00 | -           | 225,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Urb. Petropolis             | Imbornales                 | 200,000.00 | 59,192.10   | 140,807.90 | En Proceso | 30%         |
| Urbanización Marina.        | Aceras Y Contenes.         | 200,000.00 | 53,070.34   | 146,929.66 | En Proceso | 27%         |
| Urbanización Titán          | Reparacion Cisterna        | 225,000.00 | -           | 225,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Vega /Batey Central         | Badenes.                   | 200,000.00 | 56,430.00   | 143,570.00 | En Proceso | 28%         |
| Villa Maranatha.            | Imbornales                 | 250,000.00 | 73,990.12   | 176,009.88 | En Proceso | 30%         |
| Villa Providencia 2         | Aceras y Contenes.         | 200,000.00 | 54,803.74   | 145,196.26 | En Proceso | 27%         |
| Villa Azucarera 1           | Imbornales.                | 110,000.00 | 32,555.65   | 77,444.35  | En Proceso | 30%         |
| Villa Azucarera 1           | Badenes.                   | 110,000.00 | 31,036.50   | 78,963.50  | En Proceso | 28%         |
| Villa Azucarera 2           | Imbornales.                | 110,000.00 | 32,555.65   | 77,444.35  | En Proceso | 30%         |
| Villa Azucarera 2           | Badenes.                   | 110,000.00 | 32,670.00   | 77,330.00  | En Proceso | 30%         |
| Villa Bendición.            | Reparacion de la entrada.  | 130,000.00 | -           | 130,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Villa Bendición.            | Bacheo.                    | 100,000.00 | 28,596.16   | 71,403.84  | En Proceso | 29%         |
| Villa Blanca                | Centro Comunal.            | 240,000.00 | -           | 240,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Villa Cañera                | Aceras Y Contenes.         | 100,000.00 | 29,492.10   | 70,507.90  | En Proceso | 29%         |
| Villa Cañera                | Imbornales.                | 100,000.00 | 29,700.00   | 70,300.00  | En Proceso | 30%         |
| Villa Centro                | Badenes.                   | 230,000.00 | 102,960.00  | 127,040.00 | En Proceso | 45%         |
| Villa Cesariana             | Bacheo en Tosca.           | 250,000.00 | 74,250.00   | 175,750.00 | En Proceso | 30%         |
| Villa Coral                 | Electrificacion            | 230,000.00 | 68,310.00   | 161,690.00 | En Proceso | 30%         |
| Villa España                | Electrificacion.           | 140,000.00 | 41,580.00   | 98,420.00  | En Proceso | 30%         |
| Villa España                | Señalización.              | 100,000.00 | -           | 100,000.00 | Pendiente  | 0%          |
| Villa Hermosa               | Aceras Y Contenes.         | 220,000.00 | 57,251.56   | 162,748.44 | En Proceso | 26%         |
| Villa Magdalena             | Aceras y Contenes.         | 110,000.00 | 29,700.00   | 80,300.00  | En Proceso | 27%         |
| Villa Magdalena             | Badenes.                   | 100,000.00 | 26,451.31   | 73,548.69  | En Proceso | 26%         |
| Villa México                | Electrificacion.           | 225,000.00 | 66,825.00   | 158,175.00 | En Proceso | 30%         |
| Villa Municipal             | Cementacion de Callejón.   | 100,000.00 | 59,700.00   | 40,300.00  | En Proceso | 60%         |
| Villa Municipal             | Imbornales.                | 100,000.00 | 62,087.33   | 37,912.67  | En Proceso | 62%         |

| Sector              | Nombre de la Obras.         | Valor         | Total Ejec.  | Total Pte.    | Status     | % Ejecutado |
|---------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| Villa Olímpica 2    | Badenes.                    | 220,000.00    | 95,040.00    | 124,960.00    | En Proceso | 43%         |
| Villa Orilla        | Contenes.                   | 225,000.00    | 66,825.00    | 158,175.00    | En Proceso | 30%         |
| Villa Progreso 1    | Construccion de Imbornales. | 125,000.00    | 37,125.00    | 87,875.00     | En Proceso | 30%         |
| Villa Progreso 1    | Badenes                     | 125,000.00    | 36,865.12    | 88,134.88     | En Proceso | 29%         |
| Villa Progreso 2    | Contenes.                   | 125,000.00    | 32,661.57    | 92,338.43     | En Proceso | 26%         |
| Villa Progreso 2    | Electrificación.            | 125,000.00    | 37,125.00    | 87,875.00     | En Proceso | 30%         |
| Villa Providencia 1 | Aceras y Contenes.          | 200,000.00    | 54,051.90    | 145,948.10    | En Proceso | 27%         |
| Villa Velásquez     | Aceras Y contenes.          | 225,000.00    | -            | 225,000.00    | Pendiente  | 0%          |
| Villa Visan         | Iluminacion.                | 125,000.00    | 37,125.00    | 87,875.00     | En Proceso | 30%         |
| Villa Visan         | Señalización.               | 100,000.00    | -            | 100,000.00    | Pendiente  | 0%          |
| PP-2026             |                             | 30,000,000.00 | 8,867,524.32 | 21,132,475.68 |            |             |

|                             |                     |            |            |   |           |      |
|-----------------------------|---------------------|------------|------------|---|-----------|------|
| Batey Angelina              | Bacheo              | 489,000.00 | 489,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Batey Angelina              | Bacheo              | 250,000.00 | 250,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Batey Esperanza             | Reparación del Play | 313,200.00 | 313,200.00 | - | Terminada | 100% |
| Batey La Laura              | Iluminación         | 120,000.00 | 120,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Bo. Santa Clara             | Aceras Y Contenes   | 90,000.00  | 90,000.00  | - | Terminada | 100% |
| Boca Del Soco               | Aceras Y Contenes   | 160,000.00 | 160,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Brisas del Este             | Aceras Y Contenes   | 120,000.00 | 120,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Buenos Aires 2              | Aceras Y Contenes   | 96,000.00  | 96,000.00  | - | Terminada | 100% |
| Buenos Aires/El Patio       | Bacheo              | 245,000.00 | 245,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Callejón Ortiz              | Badenes             | 227,200.00 | 227,200.00 | - | Terminada | 100% |
| El Ocho                     | Aceras Y Contenes   | 80,000.00  | 80,000.00  | - | Terminada | 100% |
| El Peñon                    | Aceras Y Contenes   | 200,000.00 | 200,000.00 | - | Terminada | 100% |
| EL TOCONAL                  | Centro Comunal      | 211,200.00 | 211,200.00 | - | Terminada | 100% |
| Filipina                    | Aceras Y Contenes   | 200,000.00 | 200,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Independencia               | Aceras Y Contenes   | 211,200.00 | 211,200.00 | - | Terminada | 100% |
| Independencia               | Aceras Y Contenes   | 80,000.00  | 80,000.00  | - | Terminada | 100% |
| La Belleza 1                | Bacheo              | 65,764.71  | 65,764.71  | - | Terminada | 100% |
| La Primavera                | Drenaje Pluvial.    | 211,200.00 | 211,200.00 | - | Terminada | 100% |
| La Primavera                | Drenaje Pluvial.    | 160,000.00 | 160,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Los Bomberito.              | Aceras Y Contenes   | 180,000.00 | 180,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Los Transformadores         | Aceras Y Contenes   | 180,000.00 | 180,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Naime 1                     | Aceras Y Contenes   | 200,000.00 | 200,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Naime 2                     | Aceras Y Contenes   | 200,000.00 | 200,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Nuevo Amanecer              | Bacheo              | 145,000.00 | 145,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Pedro Justo Carrión 1       | Centro Comunal      | 271,200.00 | 271,200.00 | - | Terminada | 100% |
| Plan Porvenir (Los Cajones) | Plazoleta           | 211,200.00 | 211,200.00 | - | Terminada | 100% |
| Plan Porvenir (Los Cajones) | Cancha              | 80,000.00  | 80,000.00  | - | Terminada | 100% |
| Punta Percadora 1           | Aceras Y Contenes   | 200,000.00 | 200,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Punta Pescadora             | Bacheo              | 235,000.00 | 235,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Restauración 2              | Aceras Y Contenes   | 100,000.00 | 100,000.00 | - | Terminada | 100% |
| San Antón                   | Bacheo              | 1,146.23   | 1,146.23   | - | Terminada | 100% |
| San Antón                   | Bacheo              | 200,000.00 | 200,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Sector Bienvenido.          | Centro Comunal      | 343,200.00 | 343,200.00 | - | Terminada | 100% |
| Sector Bienvenido.          | Aceras Y Contenes   | 120,000.00 | 120,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Sector El Centro            | Aceras Y Contenes   | 160,000.00 | 160,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Urbanización Marina.        | Centro Comunal      | 160,000.00 | 160,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Urbanización Marina.        | Verja Perimetral    | 191,200.00 | 191,200.00 | - | Terminada | 100% |
| Urbanización Oriental       | Aceras Y Contenes   | 160,000.00 | 160,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Urbanización Oriental       | Badenes             | 235,200.00 | 235,200.00 | - | Terminada | 100% |
| Villa Cesarina              | Bacheo              | 170,000.00 | 170,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Villa Coral                 | Aceras Y Contenes   | 184,000.00 | 184,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Villa Faro                  | Bacheo              | 100,000.00 | 100,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Villa Faro 1                | Badenes             | 80,000.00  | 80,000.00  | - | Terminada | 100% |
| Villa Hermosa               | Aceras Y Contenes   | 131,200.00 | 131,200.00 | - | Terminada | 100% |
| Villa Hermosa               | Aceras Y Contenes   | 160,000.00 | 160,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Villa Magdalena             | Aceras Y Contenes   | 184,000.00 | 184,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Villa Olímpica 1            | Drenaje             | 291,200.00 | 291,200.00 | - | Terminada | 100% |
| Villa Orilla                | Aceras Y Contenes   | 180,000.00 | 180,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Villa Providencia 1         | Aceras Y Contenes   | 80,000.00  | 80,000.00  | - | Terminada | 100% |
| Villa Providencia 2         | Aceras Y Contenes   | 160,000.00 | 160,000.00 | - | Terminada | 100% |
| Villa Velásquez             | Cancha              | 158,400.00 | 158,400.00 | - | Terminada | 100% |

Pend. PP-2025

8,981,710.94

8,981,710.94


-

Total General

38,981,710.94

17,849,235.26

21,132,475.68

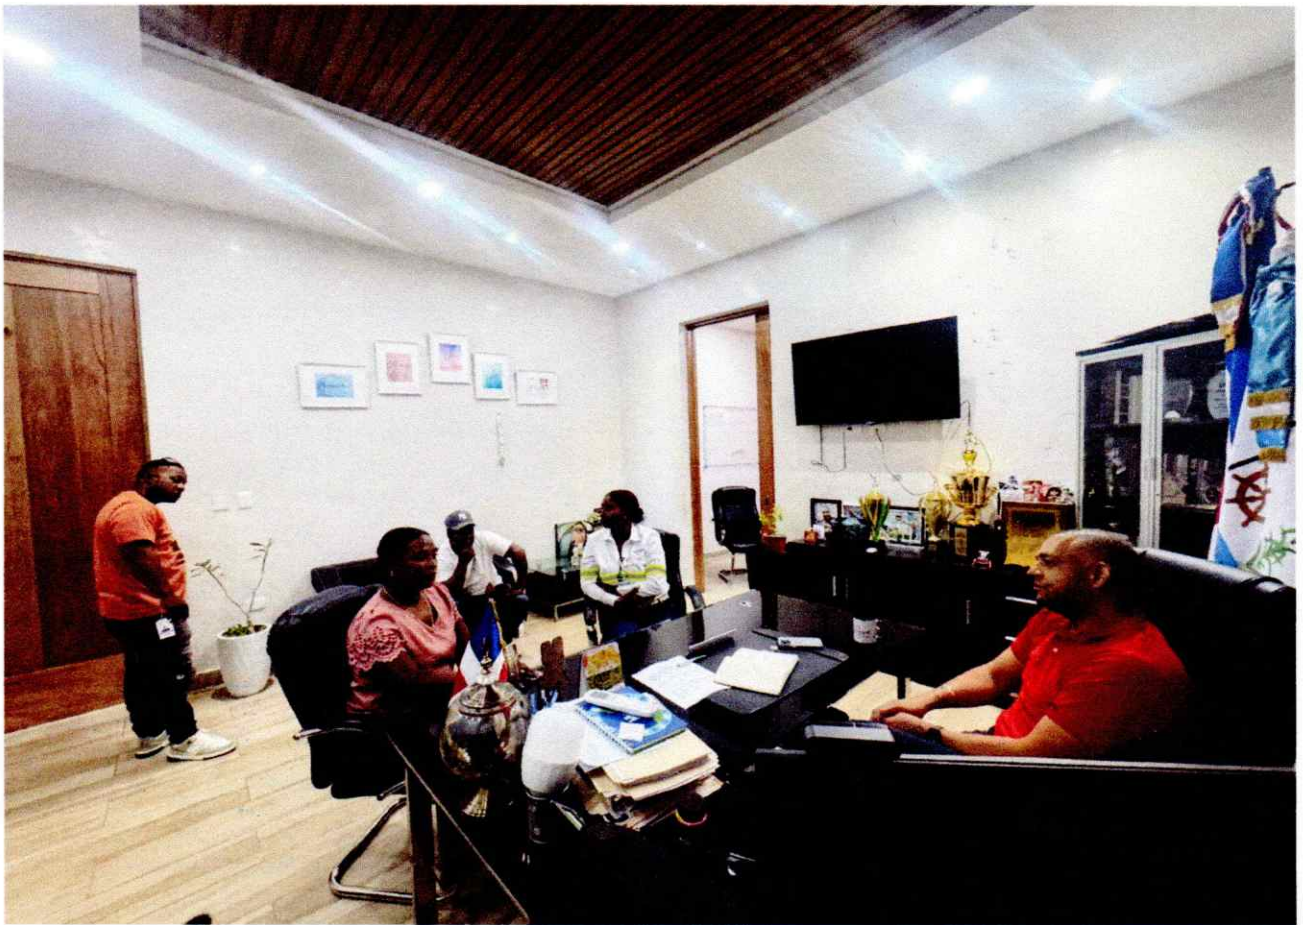





ALCALDÍA  
SAN PEDRO  
DE MACORÍS  
GESTIÓN 2020-2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS

Avenida Anacaona Moscoso #1, San Pedro de Macorís

Tel.: 1-809-529-7815, <https://ayuntamientosanpedro.gob.do/>



Fecha

26/6/2026

| ASISTENCIA A REUNION |                     |        |              |                |            |            |                     |
|----------------------|---------------------|--------|--------------|----------------|------------|------------|---------------------|
| No.                  | Nombre y Apellido   | Género | Institución  | Area           | Cargo      | Teléfono   | Firma               |
| 1                    | Freisis Encarnación | F      | Inta de Vaca | Villa Blanca   | Presidente | 8092579343 | Freisis Encarnación |
| 2                    | Julio Reyes         | M      | ' ' ' '      | Villa Hípólita | Presidente | 8299168012 |                     |
| 3                    | Alcenio Mota        | M      | ' ' ' '      | Angolina       | delegado   | 8296217154 |                     |
| 4                    | Julio Reyes         | M      | ' ' ' '      | El Pañón       | Delegado   | 829333457  |                     |
| 5                    | Arismendy Contrera  | M      | ' ' ' '      | Restauración   | Delegado   | 8298710499 |                     |
| 6                    | Jesica Ramirez      | F      | ' ' ' '      | San Antón      | Delegado   | 8297141508 |                     |
| 7                    | Santiago de la Cruz | M      | ' ' ' '      | Boteynuevo     | Delegado   | 8092677735 |                     |
| 8                    |                     |        |              |                |            |            |                     |
| 9                    |                     |        |              |                |            |            |                     |
| 10                   |                     |        |              |                |            |            |                     |
| 11                   |                     |        |              |                |            |            |                     |
| 12                   |                     |        |              |                |            |            |                     |
| 13                   |                     |        |              |                |            |            |                     |
| 14                   |                     |        |              |                |            |            |                     |
| 15                   |                     |        |              |                |            |            |                     |

*Lenny Yumilka Valdez*

Lenny Yumilka Valdez  
Coord. Presupuesto Participativo

