

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 - 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	115,750.00	76,080.00	191,830.00	0.00	191,830.00	8,170.00
01	0051		CARRETERA CEMENTERIO LOS CACAOS			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	115,750.00	76,080.00	191,830.00	0.00	191,830.00	8,170.00
			Proyecto 02			605,820.00	0.00	0.00	0.00	605,820.00	0.00	605,820.00	223,400.00	274,400.00	497,800.00	0.00	497,800.00	108,020.00
02	0051		REPARACION DE CAMINO VECINAL			605,820.00	0.00	0.00	0.00	605,820.00	0.00	605,820.00	223,400.00	274,400.00	497,800.00	0.00	497,800.00	108,020.00
			Proyecto 05			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
05	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD DEL BAD			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 06			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	170,675.39	170,675.39	0.00	170,675.39	129,324.61
06	0051		RECONSTRUCCION PARQUE COMUNIDAD EL GUINE			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	170,675.39	170,675.39	0.00	170,675.39	129,324.61
			Proyecto 07			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
07	0051		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LA SIEMBRA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
07	0052		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL FRANCISCO MA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
07	0053		CONSTRUCCION DE CENTROS O SALONES COMUNA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0054		REPARACION CENTRO COMUNAL LOS CANDONGUIT			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0055		REPARACION CENTRO COMUNAL LOS MINEROS			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 11			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
11	0051		CONSTRUCCION MURO COMUNIDAD DE TRES VERE			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
			Proyecto 13			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	86,506.02	0.00	86,506.02	0.00	86,506.02	163,493.98
13	0051		CONSTRUCCION ALMACEN			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	86,506.02	0.00	86,506.02	0.00	86,506.02	163,493.98
			Proyecto 15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,471.16	4,261,471.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,471.16
15	0051		CONSTRUCCION DE DE CEMENTERIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,471.16	4,261,471.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,471.16
			Proyecto 20			230,410.00	0.00	0.00	0.00	230,410.00	200,000.00	430,410.00	293,095.49	136,645.00	429,740.49	0.00	429,740.49	669.51
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS			230,410.00	0.00	0.00	0.00	230,410.00	200,000.00	430,410.00	293,095.49	136,645.00	429,740.49	0.00	429,740.49	669.51



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO


DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 - 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 25			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	54,500.00	55,880.00	110,380.00	0.00	110,380.00	189,620.00
25	0051		REPARACION O MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	54,500.00	55,880.00	110,380.00	0.00	110,380.00	189,620.00
TOTAL GENERAL						5,036,230.00	0.00	0.00	0.00	5,036,230.00	4,461,471.16	9,497,701.16	773,251.51	713,680.39	1,486,931.90	0.00	1,486,931.90	8,010,769.26

Faustina Mejía
Preparado por



[Signature]
Revisado por

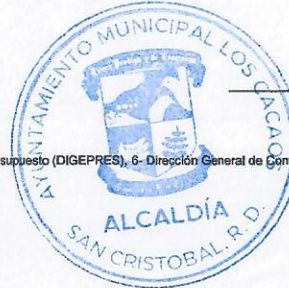

[Signature]
Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
