



# **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional  
Departamento de Estadísticas  
Enero 2025**



El Presupuesto Participativo Municipal 2024 (PPM-2024) de la ADN comprende las acciones e intervenciones a realizarse en las diferentes circunscripciones con el fin de mejorar la calidad de vida de los munícipes del Distrito Nacional.

Los fondos para invertir en el PPM-2024 fueron aprobados mediante la Resolución del Concejo Municipal número 67-2023 ascienden a un monto de RD\$150,000,000.00 (ciento cincuenta millones de pesos dominicanos con 00/100), con un tope máximo de RD\$3,000,000.00 (tres millones de pesos dominicanos con 00/100) por sector, a los fines de alcanzar cincuenta (50) sectores del Distrito Nacional.

La ejecución del PPM-2024 se inició con la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECP) de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) del proceso de COMPARACIÓN DE PRECIOS ADN-CCC-CP-2024-0014 “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PPM 2024.”, en marzo de 2024.

Este proceso, incluyó la totalidad de las 62 intervenciones aprobadas mediante el acta del cabildo abierto Resolución CA 01-2024, de fecha 29 de febrero de 2024, localizadas en los 50 sectores escogidos y consolidadas en 7 lotes.

En el proceso participaron 56 oferentes, demostrando el apego a los principios de transparencia y publicidad, de igualdad y libre competencia, equidad y participación. Finalmente, en fecha 12 de julio se realizó la adjudicación, mediante acto No. 32-2024 del Comité de Compras y Contrataciones de la ADN.

### BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Estado de situación de las Obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	17	34%
Obras en Proceso	26	52%
Obras sin iniciarse	7	14%
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

### BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto devengado	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	% de Ejecución
150,000,000.00	77,984,714.53	72,015,285.47	52%

### RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS Valores en RD\$

PROVEEDOR	LOTE	MONTO ADJUDICADO
Constructora Fixsa, SRL	1	16,741,963.47
Revicon, SRL	2	16,701,711.45
Consortio VS Magón, SRL	3	17,930,287.93
Construcciones Servicios y Diseños Civiles Dominic JAPT, SRL	4	17,174,956.51
Construcción y Transporte Prefabricados, EEC, SRL	5	15,210,397.11
Caecom, SRL	6	16,757,493.79
Constructora Burgos López, SRL	7	16,631,791.26
<b>Total</b>		<b>117,148,601.52</b>



**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
Nivel de avance de las obras incluidas en el año 2024  
Análisis de ejecución  
Al 31 de diciembre 2024

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO PPM 2024**  
Valores en RD\$

Programa	Proyecto	Obra	Denominación	Lote	Sector	Circunscripción	Presupuestado estimado	Proveedor	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2024	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin Iniciar
11	02	0078	Reconstrucción de aceras y contenes	1	30 de Mayo	1	2,999,322.33	Constructora Fixsa, SRL	2,391,709.06	X			
15	02	0051	Remozamiento de cancha deportiva	1	Atala	1	2,998,835.59		1,970,278.91		X		
17	03	0059	Canalización de aguas residuales	1	Enriquillo Km 8	1	2,988,493.01		1,440,811.76		X		
17	03	0052	Solución de drenaje	1	Honduras	1	2,996,407.13		1,437,917.19		X		
11	02	0080	Solución de drenaje y Pavimentación de peatonales	1	Luz Consuelo Norte	1	2,994,211.18		1,658,540.73			X	
17	03	0058	Canalización de aguas residuales y Construcción de pozo a mano	1	San Miguel	1	2,997,477.28		2,175,220.56	X			
17	03	0057	Solución de drenaje	1	Urbanización La Costa	1	2,998,515.72		1,054,261.63				X
<b>LOTE 1</b>					<b>7</b>		<b>20,973,262.24</b>		<b>12,128,739.86</b>				
11	01	0240	Reconstrucción de aceras y contenes	2	Ensanche Lugo	1	2,998,979.71	Revicon, SRL	2,385,958.78	X			
17	03	0056	Canalización de aguas residuales	2	Evaristo Morales	1	2,994,895.23		986,138.93			X	
12	05	0051	Colocación de luminarias y Reductores de velocidad	2	La Paz	1	2,996,872.63		2,385,958.78		X		
11	02	0079	Pavimentación de peatonales	2	La Yuca de Naco	1	2,999,610.56		2,183,644.46	X			
17	03	0055	Saneamiento de cañada	2	Manganagua	1	2,998,064.07		2,385,959.78		X		
17	03	0051	Canalización de aguas residuales y Construcción piso en hormigón	2	Mata Hambre	1	2,994,739.97		934,662.51			X	
11	01	0239	Reconstrucción de aceras y contenes	2	San Carlos	1	2,996,819.47		2,450,109.67	X			
<b>LOTE 2</b>					<b>7</b>		<b>20,979,981.64</b>		<b>13,712,432.88</b>				
17	03	0053	Solución de drenaje pluvial	3	Ensanche Quisqueya	1	2,985,914.29	Consorcio VS Magón, SRL	1,145,555.67		X		
17	03	0054	Solución de drenaje	3	Los Praditos	1	2,879,393.04		1,708,122.32				X
15	04	0052	Ampliación club Claretiano	3	El Claret	2	2,999,226.26		512,293.94				X
17	03	0061	Solución de drenaje y Colocación de luminaria	3	Ensanche La Fe	2	2,998,626.74		1,793,623.19	X			
11	01	0248	Reconstrucción de aceras y contenes	3	La Cementera	2	2,999,205.95		2,156,307.86	X			

Programa	Proyecto	Obra	Denominación	Lote	Sector	Circunscripción	Presupuestado estimado	Proveedor	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2024	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin Iniciar	
11	02	0082	Pavimentación de peatonales y Construcción de escalones	3	Puerto Isabela	2	2,999,789.70		1,641,712.48			X		
17	03	0060	Solución de drenaje	3	Vietnam (Los Píipes)	2	2,999,367.78		1,162,582.47			X		
<b>LOTE 3</b>					<b>7</b>		<b>20,861,523.76</b>		<b>10,120,197.94</b>					
11	01	0243	Reconstrucción de aceras y contenes	4	Arroyo Manzano	2	2,999,508.81	Construccione s Servicios y Diseños Civiles Dominic JAPT, SRL	2,045,551.55	X				
11	01	0241	Canalización de aguas residuales y Reconstrucción de aceras y contenes	4	El Totumo	2	2,995,297.90		429,373.91				X	
11	01	0246	Reconstrucción de aceras y contenes	4	Fundación	2	2,992,248.33		2,039,460.99		X			
11	01	0244	Reconstrucción de aceras y contenes	4	Isabela	2	2,998,574.53		2,158,583.40	X				
11	02	0081	Pavimentación de peatonales	4	La Hondonada	2	2,999,150.99		2,004,394.83	X				
17	03	0062	Solución de drenaje	4	Los Peralejos	2	2,958,388.37		429,373.91					X
11	01	0245	Construcción de aceras y contenes	4	Palma Real	2	2,997,941.22		429,373.91	X				
11	01	0249	Reconstrucción de aceras y contenes y Luminarias	4	San Diego	2	2,990,836.76		429,373.93					X
<b>LOTE 4</b>					<b>8</b>		<b>23,931,946.91</b>			<b>9,965,486.43</b>				
17	03	0063	Construcción de cañada	5	La Esperanza	2	2,989,726.85	Construcción y Transporte Prefabricados, EEC, SRL	1,455,987.04			X		
11	01	0247	Construcción de aceras y contenes	5	Loma del Chivo (Cristo Rey)	2	2,912,774.28		480,745.68			X		
11	01	0242	Reconstrucción de aceras y contenes	5	Los Ríos (Barrio Cuba)	2	2,998,654.54		1,509,677.99			X		
11	02	0084	Pavimentación de peatonales	5	La Ciénaga de Los Guandules	3	2,993,294.81		1,245,449.95		X			
11	01	0258	Reconstrucción de aceras y contenes	5	Mejoramamiento Social	3	2,999,315.15		1,350,854.12	X				
11	01	0259	Construcción aceras y contenes	5	Villa Francisca	3	2,999,517.95		1,367,858.27				X	
11	01	0257	Construcción de aceras y contenes	5	Villa María	3	2,999,747.56		2,999,747.56	X				
<b>LOTE 5</b>					<b>7</b>		<b>20,893,031.14</b>		<b>10,410,320.61</b>					
15	04	0054	Remodelación de la Escuela San Ignacio	6	Guachupita	3	2,993,616.21	Caecom, SRL	1,259,749.85		X			

Programa	Proyecto	Obra	Denominación	Lote	Sector	Circunscripción	Presupuestado estimado	Proveedor	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2024	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin Iniciar
11	02	0083	Pavimentación de peatonales	6	Gualey	3	2,998,380.12		2,273,714.85	X			
17	03	0065	Canalización de aguas residuales	6	La Ciénaga	3	2,998,656.93		2,121,685.39		X		
11	01	0252	Construcción de aceras peatonales	6	La Zurza	3	2,955,649.91		2,130,677.01		X		
11	01	0254	Construcción de aceras peatonales y Construcción de escalones	6	Las Cañitas	3	2,994,469.80		1,783,932.68	X			
17	03	0064	Solución de drenaje	6	Matadero de Capotillo	3	2,996,407.13		2,122,672.24			X	
11	01	0253	Construcción de badenes, Solución de drenaje y Construcción de aceras y contenes	6	Simón Bolívar	3	2,999,889.68		2,244,067.95		X		
<b>LOTE 6</b>					<b>7</b>		<b>20,937,069.78</b>		<b>13,936,499.95</b>				
12	05	0052	Alumbrado de calles y Puerta en peatonales	7	27 de Febrero	3	2,998,054.38	Constructora Burgos López, SRL	1,592,370.37			X	
11	01	0256	Reconstrucción de aceras y contenes	7	Ensanche Espaillat	3	2,999,387.60		1,565,827.55			X	
11	01	0251	Reconstrucción de aceras y contenes	7	Ensanche Luperón	3	2,959,735.14		2,192,216.46	X			
11	01	0255	Reconstrucción de aceras y contenes	7	María Auxiliadora	3	2,999,033.07		1,913,746.72		X		
11	01	0250	Construcción de aceras y contenes	7	Villa Consuelo	3	2,999,169.85		2,122,962.11	X			
15	03	0051	Construcción de grada en el club 2000	7	Villa Juana	3	2,996,463.69		1,758,872.38			X	
15	04	0053	Ampliación club los Pioneros	7	Villas Agrícolas	3	2,990,212.11		475,194.01				X
<b>LOTE 7</b>					<b>7</b>		<b>20,942,055.84</b>		<b>11,621,189.60</b>				
					<b>50</b>		<b>\$ 149,518,871.31</b>		<b>\$ 77,984,714.53</b>				

- 17 obras finalizadas
- 26 obras en proceso
- 7 obras sin iniciar



*Yissell Carrasco*

Lcda. Yissell Carrasco Rivas  
Departamento de Estadísticas  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



# ANEXOS

## a) EVIDENCIAS DE PAGO

### a.1) Cubicaciones No. 1

PROVEEDOR	LOTE	MONTO ADJUDICADO	1RA CUBICACION	# CHEQUE
Constructora Fixsa, SRL	1	16,741,963.47	5,023,122.76	14956
Revicon, SRL	2	16,701,711.45	6,233,070.53	14909
Consortio VS Magón, SRL	3	17,930,287.93	3,739,627.10	14934
Construcciones Servicios y Diseños Civiles Dominic JAPT, SRL	4	17,174,956.51	3,304,230.41	14928
Construcción y Transporte Prefabricados, EEC, SRL	5	15,210,397.11	3,481,436.14	14890
Caecom, SRL	6	16,757,493.79	3,910,152.74	14939
Constructora Burgos López, SRL	7	16,631,791.26	3,925,314.52	14910
<b>Total</b>		<b>117,148,601.52</b>	<b>29,616,954.20</b>	

### a.3) Cubicaciones No. 2

PROVEEDOR	LOTE	MONTO ADJUDICADO	2DA CUBICACION	# CHEQUE
Constructora Fixsa, SRL	1	16,741,963.47	3,757,224.41	14948
Revicon, SRL	2	16,701,711.45	4,139,020.09	14961
Consortio VS Magón, SRL	3	17,930,287.93	2,794,513.25	14950
Construcciones Servicios y Diseños Civiles Dominic JAPT, SRL	4	17,174,956.51	3,226,264.72	14957
Construcción y Transporte Prefabricados, EEC, SRL	5	15,210,397.11	3,886,805.05	14966
Caecom, SRL	6	16,757,493.79	6,674,848.45	14946
Constructora Burgos López, SRL	7	16,631,791.26	4,369,516.83	14949
<b>Total</b>		<b>117,148,601.52</b>	<b>28,848,192.80</b>	

b) FOTOGRAFÍAS<sup>1</sup>

LOTE 1

SECTOR HONDURAS – CONSTRUCCION DE COLECTOR




SAN MIGUEL KM 8 ½ - CONSTRUCCION DE POZO A MANO





<sup>1</sup> Fuente: Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias

**30 DE MAYO – CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**

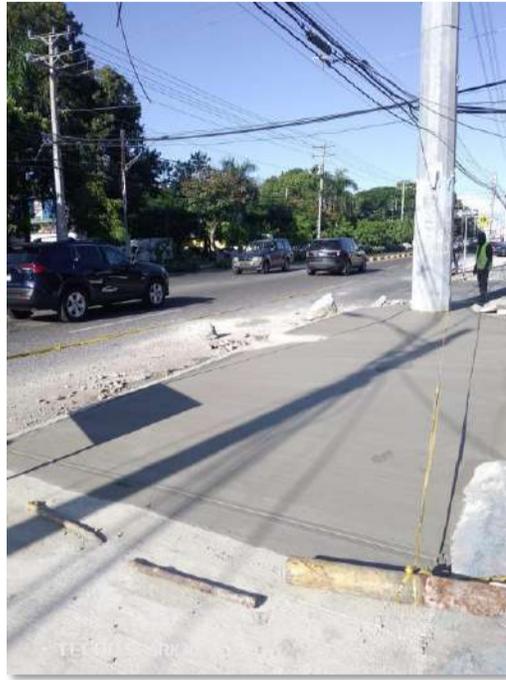

**LOTE 2**

**ENSANCHE LUGO – CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**

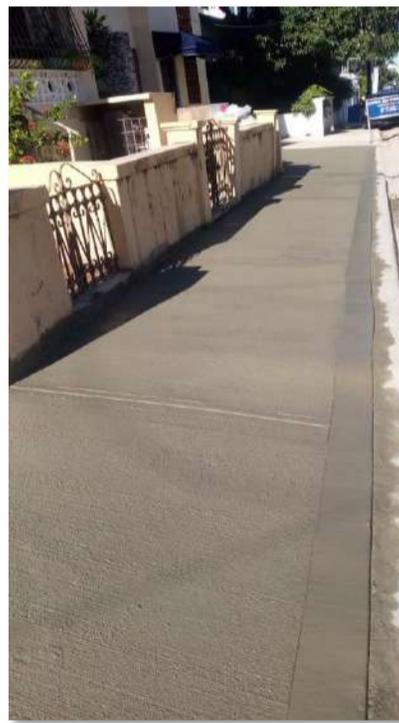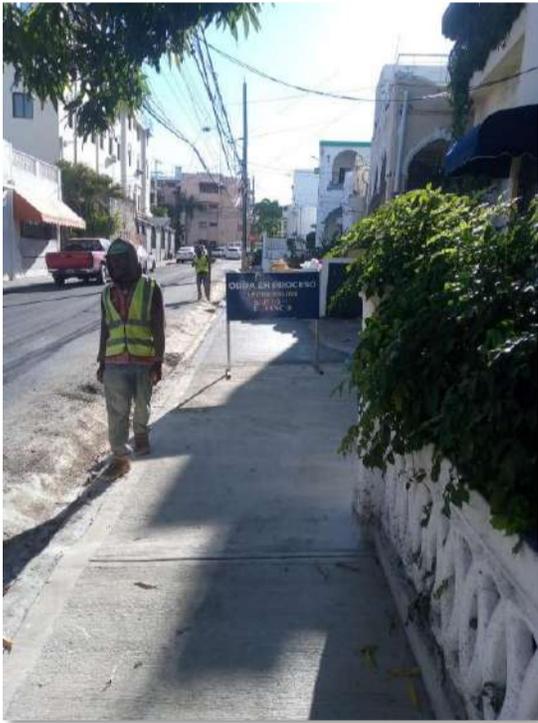

LA YUCA DEL NACO – PAVIMENTACION DE CALLEJONES



ENSANCHE LA PAZ - COLOCACION DE LUMINARIAS LED



ENSANCHE LA PAZ - COLOCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD



### LOTE 3

#### ENSANCHE LA FE – SOLUCION DE DRENAJE



#### PUERTO ISABEL II – PROCESO DE DEMOLICION ACERAS



**BOTE DE TIERRA**



**LOTE 4**

**LA HONDONADA – PAVIMENTACION DE CALLEJONES**



**LA ISABELA – COSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**



**ARROYO MANZANO – CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**



**LOTE 5**


**MEJORAMIENTO SOCIAL – CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**



VILLA MARIA – CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES



LA CIENAGA DE LOS GUANDULES – PAVIMENTACION DE PEATONALES

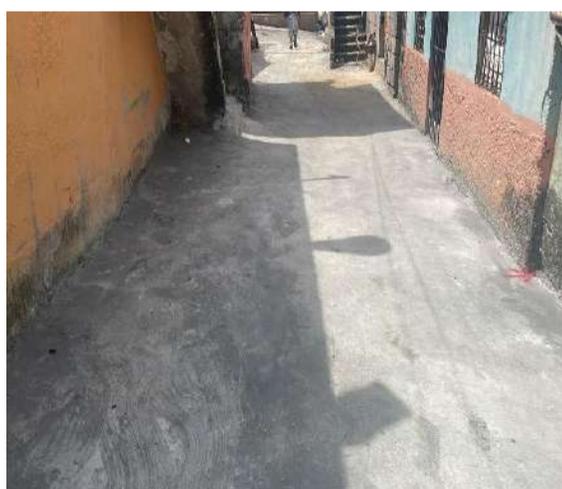




## LOTE 6

### LA ZURZA- CONSTRUCCION DE ESCALONES



LAS CAÑITAS – CONSTRUCCION DE ESCALONES Y REMOZAMIENTO DE PISO

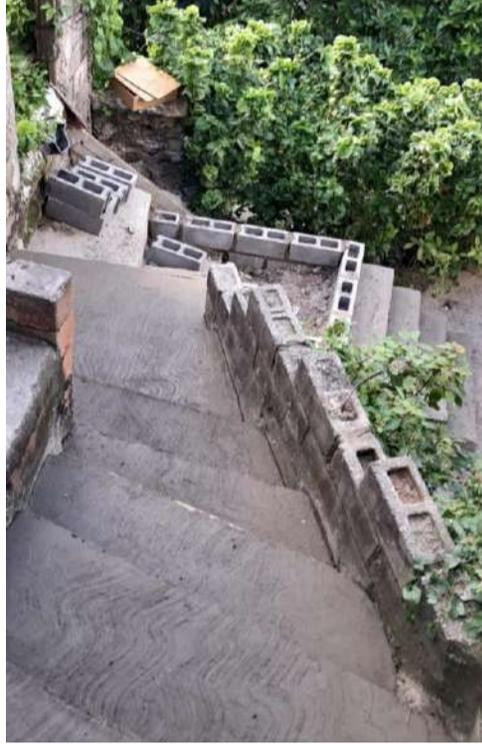

LOTE 7

ENSANCHE LUPERON – CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES



VILLA CONSUELO – CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES



*Yissell Carrasco*



Lcda. Yissell Carrasco Rivas  
Departamento de Estadísticas  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
