



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2025

**PERÍODO
OCTUBRE – DICIEMBRE 2025**

**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Departamento de Estadísticas
Enero 2026**



El Presupuesto Participativo Municipal 2025 (PPM-2025) de la alcaldía comprende las acciones e intervenciones a realizarse en las diferentes circunscripciones con el fin de mejorar la calidad de vida de los munícipes del Distrito Nacional.

Los fondos para invertir en el PPM-2025 fueron aprobados mediante la Resolución del Concejo Municipal número 55-2024 ascienden a un monto de RD\$150,000,000.00 (ciento cincuenta millones de pesos dominicanos con 00/100), con un tope máximo de RD\$3,000,000.00 (tres millones de pesos dominicanos con 00/100) por sector, a los fines de alcanzar cincuenta (50) sectores del Distrito Nacional.

Mediante el cabildo abierto ratificado en la Resolución CA-01/2025 se procedió a aprobar la propuesta del proceso realizado para el Presupuesto Participativo 2025, procediendo a la aprobación del **Plan de Inversión Municipal (PIM)** .

El mismo contó con la presencia de la alcaldesa Sra. Carolina Mejía; el presidente del Concejo Municipal Youany Moya; la secretaria del Concejo Betsy Cespedes; la secretaría general Elizabeth Mateo; el director de Desarrollo Comunitario Raymond Rodríguez, así como otros directores y concejales de la ADN y los delegados que representan las diferentes barriadas.

La ejecución del PPM-2025 se inició con la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECP) de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) del proceso de COMPARACIÓN DE PRECIOS ADN-CCC-CP-2025-0004 **"PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM) 2025"**, en marzo de 2025.

Finalmente, el 30 de mayo de 2025 se procedió a adjudicar el proceso mediante el acto de adjudicación 19/2025, resultando la elección de 3 oferentes de los 13 que habían sido habilitados para participar en dicho proceso; es importante destacar que se recibieron 28 ofertas.

BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Estado de situación de las Obras	Cantidad	Porcentaje
Obras ejecutadas	16	32%
Obras en Proceso	17	34%
Obras pendientes	17	34%
Total	50	100%

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
150,000,000.00	85,719,232.01	64,280,767.99	57%

INVERSIÓN POR CIRCUNSCRIPCIÓN

Acta del Cabildo Abierto Resolución CA 01-2025

Demarcación	Montos en RD\$	Porcentaje
C1	47,929,787.18	32%
C2	47,386,898.91	32%
C3	53,837,340.42	36%
Total	149,154,026.51	100%

RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS

Acta de adjudicación No. 19/2025

Nombre del Oferente	Lote	Monto RD\$
Consorcio ENV Innovaproject (COINSIVISA)	1	49,248,094.03
Construcciones Servicios y Diseños Civiles Dominic JAPT SRL	2	44,369,146.86
CPU Servicios, S. R. L.	3	23,091,760.60
Total		116,709,001.49



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
Nivel de avance obras año 2025
Análisis de ejecución
Período octubre-diciembre 2025

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PPM 2025



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025
PERIODO OCTUBRE – DICIEMBRE 2025

OBRAS PROGRAMADAS		PRESUPUESTO					NIVEL DE AVANCE				Observación
Estructura Programática	Denominación del proyecto	Estimado	Acumulado al T3	Ejecutado T4	Total Ejecutado	Diferencia (TJ - Estimado)	100%	Más 80%	Menos 50%	Sin Iniciar	
1203040053	PPM25-C1-30 DE MAYO-Remozamiento parque 30 de Mayo y Drenaje Pluvial	3,003,232.89	613,874.74	2,019,117.52	2,632,992.26	370,240.63		X			Se completó al 100% remozamiento del Parque
11010264	PPM25-C1-ATALA-Construcción de aceras contenes y badenes	3,000,964.16	546,455.35	-	546,455.35	2,454,508.81				X	
11010265	PPM25-C1-EL PORTAL-Construcción de aceras y contenes	3,000,584.89	407,812.17	2,104.50	409,916.67	2,590,668.22				X	
17030066	PPM25-C1-ENRIQUILLO KM 8.5-Solución drenaje pluvial y pavimentación en callejón Mambrú	2,999,226.95	585,634.11	1,766,757.81	2,352,391.92	646,835.03				X	
11010266	PPM25-C1-INVI NORTE-Construcción de aceras y contenes	2,988,658.00	406,130.76	179,503.35	585,634.11	2,403,023.89	X				
11010267	PPM25-C1-SAN MIGUEL KM8-Pavimentación de peatonales	3,007,366.41	1,823,028.07	(1,415,215.90)	407,812.17	2,599,554.24	X				
1203040054	PPM25-C1-URBANIZACION OFELIA-Remozamiento parque Ofelia	2,994,931.45	543,308.40	1,462,176.82	2,005,485.22	989,446.23	X				
11010268	PPM25-C1-CIUDAD NUEVA-Construcción de aceras contenes y badenes	2,999,957.91	409,916.67	1,548,416.27	1,958,332.94	1,041,624.97				X	
11010269	PPM25-C1-ENSANCHE QUISQUEYA-Construcción de aceras y contenes Alumbrado Público y Bacheo	2,999,506.81	434,882.77	1,407,365.51	1,842,248.28	1,157,258.53		X			Pendiente alumbrado publico
17030067	PPM25-C1-LA JAVILLA-Solución drenaje pluvial	2,996,554.84	1,842,248.28	-255,539.66	1,586,708.62	1,409,846.22		X			
17030068	PPM25-C1-MATA HAMBRE-Solución drenaje pluvial y Construcción de aceras y contenes	2,998,191.24	1,085,686.88	-32,527.68	1,053,159.20	1,945,032.04			X		Pendiente construcción de aceras y contenes
17030069	PPM25-C1-LOS PRADITOS-Solución drenaje pluvial	2,971,851.32	1,086,708.62	-1,021.74	1,085,686.88	1,886,164.44	X				
11010270	PPM25-C1-MANGANAGUA- Construcción aceras y contenes y Remozamiento y equipamiento Centro Comunitario	2,998,775.67	459,158.29	192,270.09	651,428.38	2,347,347.29		X			Se completó al 100% equipamiento del Centro Comunitario

OBRAS PROGRAMADAS		PRESUPUESTO					NIVEL DE AVANCE				Observación
Estructura Programática	Denominación del proyecto	Estimado	Acumulado al T3	Ejecutado T4	Total Ejecutado	Diferencia (TJ - Estimado)	100%	Más 80%	Menos 50%	Sin Iniciar	
11010271	PPM25-C1-MIRADOR SUR-Construcción de aceras y contenes y Alumbrado Público	2,995,962.58	429,268.48	908,907.84	1,338,176.32	1,657,786.26			X		Pendiente construcción de aceras y contenes
11010272	PPM25-C1-ENSANCHE NACO-Construcción de aceras y contenes	3,000,584.89	407,812.17	1,815,215.90	2,223,028.07	777,556.82				X	
11010273	PPM25-C1-SAN GERONIMO-Construcción Badenes Colocación Bolardos y Remozamiento parque San Ignacio-Área infantil	2,973,437.17	472,400.21	2,159,180.35	2,631,580.56	341,856.61			X		Pendientes badenes y bolardos
17030070	PPM25-C2-EL CALICHE-LOS RIOS-Solución drenaje pluvial Escalones Badenes y Pavimentación de Peatonales	2,996,861.12	1,568,385.18	200,000.00	1,768,385.18	1,228,475.94	X				
11010274	PPM25-C2-LA YAGUITA - JARDINES DEL NORTE-Construcción de aceras contenes y badenes	2,996,372.36	410,237.60	2,442,179.19	2,852,416.79	143,955.57		X			
11010275	PPM25-C2-LOS RIOS SIN PISO-BARRIO CUBA-Pavimentación de peatonales y Alumbrado Publico	2,942,195.04	809,813.50	-367,013.29	442,800.21	2,499,394.83	X				
11010276	PPM25-C2-LOS RAMIREZ-ARROYO HONDO-Pavimentación de Peatonales y Terminación Centro Comunitario	2,992,868.91	432,304.71	1,917,534.14	2,349,838.85	643,030.06		X			Pendiente pavimentación por obstrucción de pozo séptico en la zona
11010277	PPM25-C2-LOS PROCERES-Construcción de aceras contenes y badenes	2,998,827.01	414,680.38	1,054,654.46	1,469,334.84	1,529,492.17				X	
11010278	PPM25-C2-SANTA LUCIA - LOS RIOS-Pavimentación de peatonales	2,951,441.18	1,215,832.27	756,155.72	1,971,987.99	979,453.19	X				
11010279	PPM25-C2-KM 11 - AUT. DUARTE-Construcción de aceras y contenes y Drenaje Pluvial	2,976,099.96	442,800.21	1,905,362.62	2,348,162.83	627,937.13				X	
11010280	PPM25-C2-LOS GALINDOS - ARROYO HONDO-Construcción de aceras y contenes	2,998,770.30	407,130.37	358,515.05	765,645.42	2,233,124.88	X				
11010281	PPM25-C2-LOS PERALEJOS-Construcción de badenes y Alumbrado Público	2,646,335.71	380,303.37	34,377.01	414,680.38	2,231,655.33		X			Se completó al 100% alumbrado público
11010282	PPM25-C2-LOS GIRASOLES-Construcción de aceras y contenes	2,995,358.19	406,575.58	817,545.16	1,224,120.74	1,771,237.45				X	
11010283	PPM25-C2-PALMA REAL-Construcción de badenes, aceras y bacheo y Drenaje Pluvial	2,991,627.08	1,416,956.01	65,513.63	1,482,469.64	1,509,157.44		X			
17030071	PPM25-C2-PALMA REAL PARTE ATRÁS-Solución drenaje pluvial y Badenes	2,989,914.39	485,847.21	1,200,000.00	1,685,847.21	1,304,067.18		X			

OBRAS PROGRAMADAS		PRESUPUESTO					NIVEL DE AVANCE				Observación
Estructura Programática	Denominación del proyecto	Estimado	Acumulado al T3	Ejecutado T4	Total Ejecutado	Diferencia (TJ - Estimado)	100%	Más 80%	Menos 50%	Sin Iniciar	
17030072	PPM25-C2-LAS FLORES DE CRISTO REY-Solución drenaje pluvial	2,960,977.83	1,469,334.84	1,128,624.42	2,597,959.26	363,018.57	X				
1203040055	PPM25-C2-ISABEL DE TORRES-Remozamiento Parque La Glorieta	2,982,452.17	588,900.74	1,334,790.32	1,923,691.06	1,058,761.11	X				
11010284	PPM25-C2-PERANTUEN-Construcción de aceras, contenes y badenes	3,002,612.79	411,155.58	2,211,946.83	2,623,102.41	379,510.38	X				
11010285	PPM25-C2-PUERTO ISABELA 1-Remozamiento Parque Infantil	2,964,184.87	535,972.27	1,979,860.00	2,515,832.27	448,352.60	X				
1203010051	PPM25-C3-ENSANCHE CAPOTILLO-Construcción de escalones en Cañada Capotillo	2,999,686.08	432,298.48	2,023,105.21	2,455,403.69	544,282.39				X	
11010286	PPM25-C3-LA ZURZA-Construcción de aceras y contenes	3,003,913.23	408,379.13	1,733,168.25	2,141,547.38	862,365.85				X	
17030073	PPM25-C3-VILLAS AGRICOLAS-Solución drenaje Pluvial	2,979,074.48	486,568.17	1,445,730.31	1,932,298.48	1,046,776.00				X	
17030074	PPM25-C3-24 DE ABRIL-Solución Drenaje Pluvial y Alumbrado Público	2,990,840.06	463,117.32	(50,039.05)	413,078.27	2,577,761.79	X				
11010287	PPM25-C3-MEJORAMIENTO SOCIAL-Construcción de aceras y contenes	3,006,571.56	409,043.41	926,986.50	1,336,029.91	1,670,541.65	X				
17030075	PPM25-C3-SIMON BOLIVAR-Solución drenaje pluvial y Construcción de escalones en cañada el Cachimbo	2,993,796.51	442,185.03	2,073,033.46	2,515,218.49	478,578.02				X	
1203050053	PPM25-C3-VILLA CONSUELO-Alumbrado Público y Mantenimiento drenaje pluvial	2,924,094.29	434,764.74	1,491,048.69	1,925,813.43	998,280.86			X		Se completó al 100% alumbrado público
17040051	PPM25-C3-VILLA FRANCISCA-Mantenimiento drenaje pluvial y Construcción de aceras y contenes	3,012,350.02	522,556.71	1,944,720.59	2,467,277.30	545,072.72	X				Se realizó cambio de drenaje pluvial a aceras y contenes
17030076	PPM25-C3-VILLA JUANA-Solución drenaje pluvial y Construcción de aceras y contenes	3,015,315.61	532,798.91	1,822,230.72	2,355,029.63	660,285.98			X		Se completó al 100% la construcción de aceras y contenes
11010288	PPM25-C3-VILLA MARIA-Construcción de aceras y contenes y Alumbrado Público	2,993,856.10	409,883.14	451,294.69	861,177.83	2,132,678.27	X				
11010289	PPM25-C3-27 DE FEBRERO-Cierre de callejones y Construcción de aceras y contenes	2,994,808.67	536,364.98	2,167,507.91	2,703,872.89	290,935.78			X		Se completó al 100% la construcción de aceras y contenes

OBRAS PROGRAMADAS		PRESUPUESTO					NIVEL DE AVANCE				Observación
Estructura Programática	Denominación del proyecto	Estimado	Acumulado al T3	Ejecutado T4	Total Ejecutado	Diferencia (TJ - Estimado)	100%	Más 80%	Menos 50%	Sin Iniciar	
11010290	PPM25-C3-ENSANCHE ESPAILLAT- Construcción de aceras contenes y badenes y Drenaje Pluvial	2,972,587.49	413,078.27	1,568,175.79	1,981,254.06	991,333.43				X	
11010291	PPM25-C3-ENSANCHE LUPERON-Construcción de aceras y contenes y Drenaje Pluvial	2,987,148.11	436,029.91	463,767.98	899,797.89	2,087,350.22			X		
1203010052	PPM25-C3-GUALEY-Construcción de escalones y Pavimentación de peatonales	3,005,467.33	425,813.43	894,894.74	1,320,708.17	1,684,759.16				X	
11010292	PPM25-C3-GUACHUPITA-Remozamiento callejón y Casa Comunitaria Bonavide	2,997,011.82	541,248.28	2,117,475.81	2,658,724.09	338,287.73				X	
17030077	PPM25-C3-LA CIENAGA-Solución drenaje pluvial	2,982,852.32	467,277.30	1,565,521.61	2,032,798.91	950,053.41				X	
11010293	PPM25-C3-LAS CAÑITAS-Pavimentación de peatonales Construcción escalones y Equipamiento CECOET	2,973,381.97	461,790.69	1,523,530.70	1,985,321.39	988,060.58			X		Se realizó el equipamiento CECOET
11010294	PPM25-C3-LOS GUANDULES-Pavimentación peatonales y Construcción de baden y escalones y Colocación pasamanos	3,004,584.77	485,475.03	1,501,093.14	1,986,568.17	1,018,016.60				X	
	Total general	149,154,026.51	31,259,228.72	54,460,003.29	85,719,232.01	63,434,794.50	16	9	8	17	

Yissel Carrasco

Lcda. Yissel Carrasco Rivas
Encargada Departamento de Estadísticas
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



Anexos

a) Relacion de pagos enero-diciembre 2025


Nombre del oferente	Lote	Monto adjudicado	20%	1ra cubicación	2da cubicación	Total (RD\$)	% cubicación
Consortio ENV Innovaproject	1	49,248,094.03	9,849,618.81	7,917,428.42	18,007,612.86	35,774,660.09	72.64%
Construcciones, Servicios y Diseños Civiles Dominic JAPT, S. R. L.	2	44,369,146.86	8,873,829.37	8,784,175.13	10,465,957.48	28,123,961.98	63.39%
CPU Servicios, S. R. L.	3	23,091,760.60	4,618,352.12	9,192,793.78	8,009,464.04	21,820,609.94	94.50%
Total		116,709,001.49	23,341,800.30	25,894,397.33	36,483,034.38	85,719,232.01	73.45%

b) Trabajos en proceso por lote

Lote 1



Lote 2

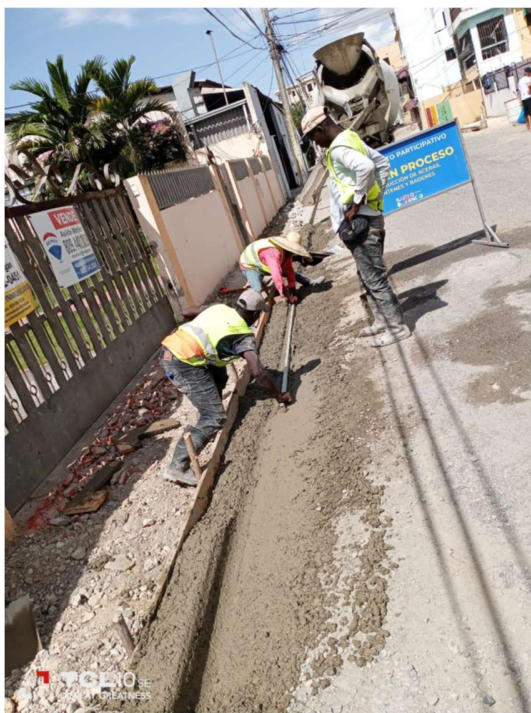

Lote 3



Yissel Carrasco

Lcda. Yissel Carrasco Rivas
Encargada Departamento de Estadísticas
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

