

AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE San José de Ocoa  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL



INFORME DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PERÍODO 01 / 12 AÑO 2025

En el Municipio de San José de Ocoa Provincia San José de Ocoa a los 11 días del mes de febrero del año 2026, el Ayuntamiento Municipal presenta el informe de ejecución de las propuestas contenidas en el cronograma de ejecución del Presupuesto Participativo Municipal para el periodo 01 / 12 del año 2025, los integrantes del Comité de Seguimiento Municipal se reúnen con las autoridades donde se procedió abordar los siguientes puntos de agenda:


1. Apertura palabra de autoridad sobre objetivo de la reunión.
2. Nivel de ejecución (Planeamiento Urbano / Ingeniería / Equipo Técnico);
3. Presentación reporte presupuestario balance gastos (Área Financiera);
4. Firma de acuerdos y compromisos.


Los miembros del comité seguimiento municipal, expresan a la alcaldía las siguientes observaciones:

- 1- las obras no ejecutadas, llevar al próximo Presupuesto, si no se abilitan.
- 2- vivienda avanzada los aportes significativos llevar control estricto y seguimiento para su ejecución
- 3- limitar los recursos (solo 10 Planchas de zinc)

Los resultados de esta reunión el comité de seguimiento se compromete a socializarlos con los diferentes representantes de la sociedad civil; Asociación Juntas de Vecinos; miembros de Juntas de Vecinos a través de los delegados representantes de las distintas comunidades. Por lo que se anexa el listado de asistencia comité seguimiento, invitados y representantes ayuntamiento.

Firman en conformidad con el presente informe:

  
Alcaldía

  
Comité de Seguimiento

  
Regidores testigo participante:



Regidor bancada

Betania Soto Al

Marcos Baier

Regidor bancada

Melito Alcantara



**MUNICIPIO \_\_\_\_\_**  
**COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM**  
**LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO**

**LUGAR \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_**

| NOMBRE COMPLETO       | INSTITUCION           | CARGO                | TELEFONO     | CORREO ELECTRONICO |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| Rafael Mena           | ayuntamiento          | PPM                  | 829-3164458  |                    |
| Clemente Delos Santos | Comite de seguimiento |                      | 347-932-9125 |                    |
| Betania Soto H        | ayuntamiento          | Regidora             | 809-911-1611 |                    |
| Ennis Fajardo         | Comite de seguimiento |                      | 0130000732-3 |                    |
| J-- J.-J.-d-          | Ayuntamiento          | Presidente           | 809-696-4782 |                    |
| Bernarda A. Anke      | Junta de Vecinos      | Presidenta           | 809-863-7676 |                    |
| Luis Miguel Chacón    | Ayuntamiento          | En. Planificación    | 829-933-9881 |                    |
| Rafael Alcantara      | ayuntamiento          | Regidor              | 809-447-9537 |                    |
| Miguelito Viter       | San Antonio           | Miembro              | 809-3553345  |                    |
| Edwin Sánchez         | Alcaldía              | Planificación Urbana | 829-289-7091 |                    |
| Morces Luis Baer      | Ayuntamiento          | Regidor              | 849-876-558  |                    |
|                       |                       |                      |              |                    |
|                       |                       |                      |              |                    |

*[Firma]*

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO  
AYUNTAMIENTO



**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL**

**AÑO 2025**

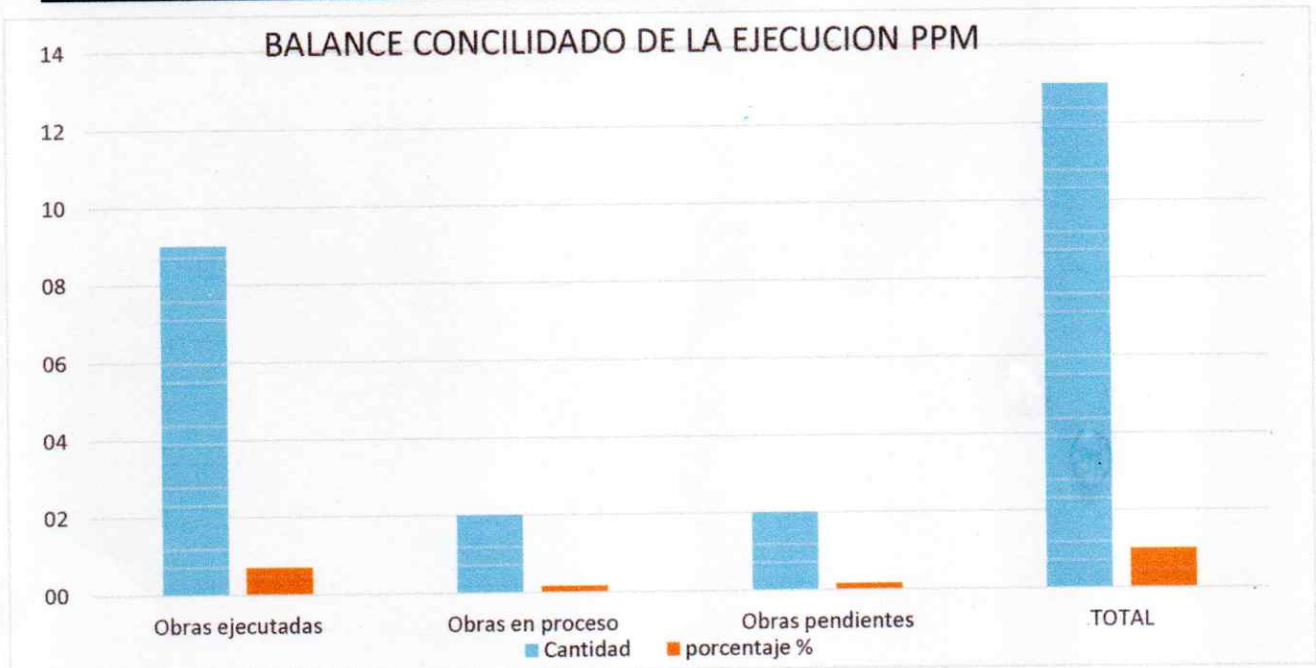
**CANTIDAD RD\$ 10,239,815.44**

| N° | OBRAS PROGRAMADAS                                      | UBICACIÓN               | PRESUPUESTO          |                       | % DE AVANCE | ESTADO     |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|------------|
|    |                                                        |                         | PRESUPUESTO ESTIMADO | PRESUPUESTO EJECUTADO |             |            |
| 01 | Vaciado de calle y construccion callejones             | sector San Francisco    | 444,322.78           | 444,322.78            | 100%        | finalizado |
| 02 | Construccion de aceras y contenes                      | Calle Ezequiel Pimentel | 565,626.60           | 565,626.60            | 100%        | finalizado |
| 03 | Vaciado de Callejon                                    | Sector Tamarindo        | 545,361.86           | 434,361.86            | 80%         | en proceso |
| 04 | Vaciado de Callejon 3ra. Etapa                         | Sector Sabana Gde.      | 499,453.20           | 499,453.20            | 100%        | finalizado |
| 05 | Construccion de Canaleta y Contenes                    | Comunidad el Limon      | 1,500,000.00         | 351,600.00            | 23%         | en proceso |
| 06 | Rotulacion de Calles                                   | Municipio de Ocoa       | 800,000.00           | 0.00                  | 0%          | pendiente  |
| 07 | Reparacion y acondicionamiento de vias de comunicaci3n | Municipio de Ocoa       | 500,000.00           | 500,000.00            | 100%        | finalizado |
| 08 | Construccion de aceras y contenes                      | Sector San Luis         | 684,051.00           | 0.00                  | 0%          | pendiente  |
| 09 | Construccion de aceras y contenes                      | Pueblo Abajo            | 1,000,000.00         | 1,000,000.00          | 100%        | finalizado |
| 10 | Construccion de aceras y contenes                      | las yessicas            | 1,080,987.50         | 1,080,987.50          | 100%        | finalizado |
| 11 | Reparacion e Instalacion de Semaforos                  | Municipio de Ocoa       | 201,000.00           | 201,000.00            | 100%        | finalizado |
| 12 | Construccion de Vivienda                               | Municipio de Ocoa       | 800,000.00           | 800,000.00            | 100%        | finalizado |
| 13 | Barrio San luis                                        |                         | 1,507,474.80         | 1,507,474.80          | 100%        | finalizado |
|    |                                                        |                         |                      |                       |             |            |

## ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO


### 1. Balance consolidado de la ejecucion del Presupuesto Participativo año 2025

| Estado de situacion de la las obras | Cantidad  | porcentaje % |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| Obras ejecutadas                    | 09        | 69%          |
| Obras en proceso                    | 02        | 15%          |
| Obras pendientes                    | 02        | 15%          |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>13</b> | <b>100%</b>  |



### 2. Balance de ejecucion del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal año 2025

| Fondo de Disponibilidad Financiera | Monto de las obras ejecutadas y en proceso | Diferencia de Inversion ejecutada y FDF | porcentaje de ejecucion % |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 10,239,815.44                      | 7,384,826.74                               | 2,854,988.70                            | 72%                       |

  
 Rafael Menendez  
 Enc. Depto. PPM

