



Acta de Reunión de Rendición de Cuentas del nivel de avances de las obras del Presupuesto Participativo Municipal con los miembros del Comité de Seguimiento y Control del PPM.

Primer Semestre 2026 (ENERO-JUNIO)

En el municipio de San Pedro de Macorís.

A los seis (6) días de mes de julio del año 2026, siendo las 10:00 am, en el despacho del alcalde Raymundo Ortiz, estando reunidos los miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal, así como la señora Lenny Yumilka Valdez, encargada del departamento de Asuntos Comunitarios y el alcalde municipal, Ingeniero Raymundo Ortiz, con la siguiente agenda:

Único: Hacer entrega de la matriz de avance de las obras del presupuesto participativo del año 2026.

El Comité de Seguimiento tienen como finalidad supervisar que las obras del Presupuesto Participativo Municipal se realicen en el orden de prioridad establecidos, con la mayor calidad, eficiencia y transparencia posibles, tomando en cuenta el estudio de prefactibilidad y presupuestos previamente elaborados.

Desarrollo de la agenda:

- La reunión inició a las 10:27 am del día 3 de julio del año 2026.
- Hizo uso de palabra la encargada de Asuntos Comunitarios y coordinadora del presupuesto participativo, Sra. Yumilka Valdez, quien luego de dar las palabras de bienvenida, hizo entrega de la matriz de avances de las obras.
- Se destacó la terminación de 51 obras en el primer trimestre del año 2026, iniciadas en el mes de diciembre del año 2025, por un monto de RD\$8,981,710.94, correspondientes al Presupuesto Participativo 2025.
- Se detalló el nivel de avance de la ejecución del Presupuesto Participativo del año 2026, consistente en la ejecución del inicio y nivel



ALCALDÍA SAN PEDRO DE MACORÍS

GESTIÓN 2024-2028



de avance de 133 obras de un total de 185 contempladas para este año, lo cual representa un porcentaje de un 72%.

- La presidenta del Comité de Seguimiento destacó los avances en la ejecución del presupuesto participativo, así como detalló las observaciones y hallazgos en las supervisiones y seguimiento de las obras realizadas en los diferentes sectores, las cuales, previamente, fueron entregados a la Dirección de Planeamiento Urbano, para los fines de corrección, en los casos que los ameritaban.
- Finalmente, el alcalde Raymundo Ortiz agradeció la participación de los miembros del Comité de Seguimiento, así como reafirmó su compromiso de ejecutar los presupuestos participativos faltantes del año 2026, para lo cual, según informó, se están confeccionando el Pliego de Condiciones, así como las especificaciones técnicas para el debido proceso de contratación de dichas obras, al tenor de lo establecido en la ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas.
- La reunión finalizó a las 11:52 am.



Lenhy Yumilka Valdez

Lenhy Yumilka Valdez

Enc. Depto. de Asuntos Comunitarios

Freisis Encarnación

Freisis Encarnación

Presidente Comité Seguimiento



Raymundo Ortiz

Raymundo Ortiz
Alcalde Municipal





Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís
Rendición de Cuentas de la ejecución de las obras del Presupuesto Participativo Municipal
Primer Semestre (Enero-Junio) 2026

Sector	Nombre de la Obras.	Valor	Total Ejec.	Total Pte.	Status	% Ejecutado
24 de abril	Badenes	225,000.00	126,824.94	98,175.06	En Proceso	56%
Altos de San Pedro	Rotulación.	250,000.00	-	250,000.00	Pendiente	0%
Bajo Manhattan	Aceras y Contenes.	200,000.00	51,949.97	148,050.03	En Proceso	26%
Barrio el Centro	Rep. Centro Comunal	220,000.00	-	220,000.00	Pendiente	0%
Batey Alemán	Remosamiento de Parque.	175,000.00	-	175,000.00	Pendiente	0%
Batey Alemán	Donaciones.	75,000.00	-	75,000.00	Pendiente	0%
Batey Angelina	Parque	200,000.00	59,194.93	140,805.07	En Proceso	30%
Batey Angelina	Donaciones	50,000.00	-	50,000.00	Pendiente	0%
Batey Esperanza	Rep. De Parque.	130,000.00	-	130,000.00	Pendiente	0%
Batey Esperanza	Rep.de Cancha.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Batey Inocencia	Contenes.	240,000.00	167,323.50	72,676.50	En Proceso	70%
Batey Monte Cristi	Parque.	250,000.00	-	250,000.00	Pendiente	0%
Batey Nuevo	Reparacion de Parque	200,000.00	-	200,000.00	Pendiente	0%
Batey Nuevo	Donaciones.	50,000.00	-	50,000.00	Pendiente	0%
Batey Olivares	Bacheo.	245,000.00	72,302.83	172,697.17	En Proceso	30%
Bo Evangelina Rodríguez	Arreglo de parque.	225,000.00	-	225,000.00	Pendiente	0%
Bo. La Puerta	Imbornales.	210,000.00	62,151.70	147,848.30	En Proceso	30%
Bo. 30 de mayo	Imbornales.	200,000.00	59,162.10	140,837.90	En Proceso	30%
Bo. Azul	Badenes	125,000.00	61,875.00	63,125.00	En Proceso	50%
Bo. Azul	Donaciones.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Bo. Blanco 1	Cementación de Callejones.	125,000.00	77,123.96	47,876.04	En Proceso	62%
Bo. Blanco 1	Aceras Y Contenes.	100,000.00	59,700.00	40,300.00	En Proceso	60%
Bo. Blanco 2	Cementación de Callejones.	225,000.00	126,824.78	98,175.22	En Proceso	56%
Bo. El Brisar	Bacheo.	125,000.00	37,125.00	87,875.00	En Proceso	30%
Bo. El Brisar	Donación.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Bo. Enriquillo	Aceras Y Contenes.	225,000.00	-	225,000.00	Pendiente	0%
Bo. Filipina	Aceras Y Contenes.	250,000.00	198,515.26	51,484.74	En Proceso	79%
Bo. Hazim	Bacheo en Caliente.	225,000.00	-	225,000.00	Pendiente	0%
Bo. Japón	Aceras y Contenes.	150,000.00	130,693.50	19,306.50	En Proceso	87%
Bo. Japón	Imbornales.	100,000.00	57,087.33	42,912.67	En Proceso	57%
Bo. Juan Pablo Duarte	Badenes.	250,000.00	103,950.00	146,050.00	En Proceso	42%
Bo. Kennedy	Imbornales	250,000.00	-	250,000.00	Pendiente	0%
Bo. La Belleza 1	Electrificación.	250,000.00	74,250.00	175,750.00	En Proceso	30%
Bo. La Belleza 2	Electrificación.	250,000.00	74,250.00	175,750.00	En Proceso	30%
Bo. La Cervecería	Badenes.	200,000.00	59,400.00	140,600.00	En Proceso	30%
Bo. La Cervecería	Donaciones.	50,000.00	-	50,000.00	Pendiente	0%
Bo. Las Caobas	Badenes.	130,000.00	35,194.50	94,805.50	En Proceso	27%
Bo. Las Caobas	Imbornales.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
Bo. Las Flores	Imbornales.	100,000.00	57,087.33	42,912.67	En Proceso	57%
Bo. Las Flores	Badenes.	150,000.00	74,250.00	75,750.00	En Proceso	50%
Bo. Las Piedra	Filtrantes.	120,000.00	75,639.85	44,360.15	En Proceso	63%
Bo. Las Piedra	Cementación de Callejón.	100,000.00	59,700.00	40,300.00	En Proceso	60%
Bo. Lindo 1	Imbornales	250,000.00	73,990.12	176,009.88	En Proceso	30%
Bo. Lindo 2	Contenes.	250,000.00	74,250.00	175,750.00	En Proceso	30%
Bo. Loma del Cochero	Badenes.	220,000.00	62,073.00	157,927.00	En Proceso	28%
Bo. Los Maestros	Reparacion de Parque.	225,000.00	-	225,000.00	Pendiente	0%
Bo. Los Transformadores	Aceras.	225,000.00	60,369.81	164,630.19	En Proceso	27%
Bo. México 1	Imbornales.	150,000.00	76,936.99	73,063.01	En Proceso	51%
Bo. México 1	Iluminación.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
Bo. México 2	Imbornales	250,000.00	141,637.63	108,362.37	En Proceso	57%
Bo. México 3	Badenes.	250,000.00	72,418.50	177,581.50	En Proceso	29%
Bo. México 4	Badenes	250,000.00	72,418.50	177,581.50	En Proceso	29%
Bo. Puerto Rico.	Imbornales.	200,000.00	119,367.95	80,632.05	En Proceso	60%
Bo. Santa Clara	Imbornales	100,000.00	57,087.33	42,912.67	En Proceso	57%
Bo. Santa Clara	Aceras Y Contenes.	125,000.00	32,709.32	92,290.68	En Proceso	26%
Bo. Sarmiento 1	Badenes.	200,000.00	-	200,000.00	Pendiente	0%
Boca Del Soco	Aceras Y Contenes.	150,000.00	130,693.50	19,306.50	En Proceso	87%
Boca Del Soco	Donaciones.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
BRISAS DEL ESTE	Contenes.	200,000.00	52,992.11	147,007.89	En Proceso	26%
BRISAS DEL ESTE	Iluminación.	45,000.00	13,365.00	31,635.00	En Proceso	30%
Buenos Aires 1	Construcion de Badenes.	120,000.00	55,440.00	64,560.00	En Proceso	46%
Buenos Aires 1	Donaciones.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Buenos Aires 2	Donaciones.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Buenos Aires 2	Badenes.	110,000.00	28,215.00	81,785.00	En Proceso	26%
Buenos Aires y El Patio	Bacheo.	170,000.00	50,490.00	119,510.00	En Proceso	30%
Buenos Aires y El Patio	Electrificación	75,000.00	22,275.00	52,725.00	En Proceso	30%
Cascara Jicara	Cementación de Callejones.	245,000.00	142,764.24	102,235.76	En Proceso	58%
El Golfo	Aceras Y Contenes.	250,000.00	66,706.36	183,293.64	En Proceso	27%
El Ocho	Aceras Y Contenes.	230,000.00	58,556.52	171,443.48	En Proceso	25%
El Peñón	Mini Acueducto.	250,000.00	-	250,000.00	Pendiente	0%
El Silencio	Aceras y Contenes	190,000.00	49,435.74	140,564.26	En Proceso	26%
El Silencio	Donaciones.	60,000.00	-	60,000.00	Pendiente	0%
EL TOCONAL	Contruccion centro Comunal.	200,000.00	-	200,000.00	Pendiente	0%
Independencia	Aceras y Contenes.	200,000.00	54,690.56	145,309.44	En Proceso	27%
Ing. Santa Fe	Terminación de Parque.	120,000.00	-	120,000.00	Pendiente	0%
Ing. Santa Fe	Cementación de Callejones.	120,000.00	-	120,000.00	Pendiente	0%
INVI-CEA	Cementación de Callejones.	125,000.00	77,124.94	47,875.06	En Proceso	62%
INVI-CEA	Aceras Y contenes.	100,000.00	59,700.00	40,300.00	En Proceso	60%
Jardines del Este	Bacheo	220,000.00	65,430.00	154,570.00	En Proceso	30%
JOSE BLANCHE.	Electrificación.	245,000.00	72,765.00	172,235.00	En Proceso	30%
LA ARENA/ PUEBLO NUEVO.	Badenes.	130,000.00	32,373.00	97,627.00	En Proceso	25%
LA ARENA/ PUEBLO NUEVO.	Señalización.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%

Sector	Nombre de la Obras.	Valor	Total Ejec.	Total Pte.	Status	% Ejecutado
La Laura	Terminación de parque.	150,000.00	-	150,000.00	Pendiente	0%
La Laura	Bacheo	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
La Playa	Centro Comunal.	200,000.00	-	200,000.00	Pendiente	0%
La Playa	Donaciones.	50,000.00	-	50,000.00	Pendiente	0%
La Primavera	Drenaje Pluvial.	100,000.00	56,862.37	43,137.63	En Proceso	57%
La Primavera	Badenes.	100,000.00	28,215.00	71,785.00	En Proceso	28%
La Roca	Señalización.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
La Roca	Imbornales.	100,000.00	29,596.05	70,403.95	En Proceso	30%
Las Colinas 1	Lamparas.	100,000.00	59,688.73	40,311.27	En Proceso	60%
Las Colinas 1	Badenes.	140,000.00	61,380.00	78,620.00	En Proceso	44%
Las Colinas 2	IMBORNALES	145,000.00	42,810.32	102,189.68	En Proceso	30%
Las Colinas 2	ELECTRIFICACION	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
Los 4 Caminos	Lampara Completa.	100,000.00	29,492.10	70,507.90	En Proceso	29%
Los 4 Caminos	Imbornales.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
Los Bomberito.	Aceras Y Contenes.	250,000.00	73,198.85	176,801.15	En Proceso	29%
Los Guandules	Cementación de Callejones.	200,000.00	119,399.31	80,600.69	En Proceso	60%
Los Guandules	Donaciones.	60,000.00	-	60,000.00	Pendiente	0%
Los Viciñi (Casita)	Aceras Y Contenes.	250,000.00	189,355.51	60,644.49	En Proceso	76%
Luz Del Faro 2	Contenes.	150,000.00	44,550.00	105,450.00	En Proceso	30%
Luz Del Faro 2	Bacheo.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
Luz Del Faro1	Electrificación.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
Luz Del Faro1	Imbornales.	150,000.00	76,937.33	73,062.67	En Proceso	51%
Miramar	Badenes.	250,000.00	72,418.50	177,581.50	En Proceso	29%
Naime 1	Terminación del Camino.	225,000.00	-	225,000.00	Pendiente	0%
Naime 2	Terminación del Camino.	225,000.00	-	225,000.00	Pendiente	0%
Naime 3	Aceras Y Contenes.	200,000.00	50,551.41	149,448.59	En Proceso	25%
NUEVO AMANECER	Bacheo.	245,000.00	72,765.00	172,235.00	En Proceso	30%
Ortiz	Badenes.	125,000.00	36,865.12	88,134.88	En Proceso	29%
Ortiz	Imbornales.	125,000.00	37,125.00	87,875.00	En Proceso	30%
Palo De azúcar	Imbornales.	200,000.00	59,192.10	140,807.90	En Proceso	30%
Paraíso San Pedro	Badenes.	100,000.00	49,500.00	50,500.00	En Proceso	50%
Paraíso San Pedro	Imbornales y Filtrante	125,000.00	74,512.33	50,487.67	En Proceso	60%
Pedro Justo Carrión 1	Cancha.	100,000.00	74,250.00	25,750.00	En Proceso	74%
Pedro Justo Carrión 1	Aceras y Contenes	150,000.00	-	150,000.00	Pendiente	0%
Pedro Justo Carrión 2	Bacheo en Tosca.	250,000.00	190,093.46	59,906.54	En Proceso	76%
Pedro Justo Carrión 3	Aceras y Contenes	250,000.00	198,515.26	51,484.74	En Proceso	79%
Pérez Márquez	Electrificación.	200,000.00	59,400.00	140,600.00	En Proceso	30%
Placer Bonito	Señalización.	190,000.00	103,817.33	86,182.67	En Proceso	55%
Placer Bonito	Donaciones.	60,000.00	-	60,000.00	Pendiente	0%
Plan Porvenir (Los Cajones)	Centro Comunal.	200,000.00	109,339.84	90,660.16	En Proceso	55%
Pról. Placer Bonito	Cementación de Callejón.	200,000.00	51,949.97	148,050.03	En Proceso	26%
Proyecto Kennedy	Imbornales.	225,000.00	-	225,000.00	Pendiente	0%
Proyecto los Reyes	Electrificación	250,000.00	74,250.00	175,750.00	En Proceso	30%
Proyecto Porvenir 1	Señalización.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Proyecto Porvenir 1	Iluminación.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Proyecto Porvenir 2	Imbornales.	100,000.00	29,596.05	70,403.95	En Proceso	30%
Proyecto Porvenir 2	Aceras Y Contenes.	150,000.00	130,693.50	19,306.50	En Proceso	87%
Punta De Garza	Bacheo.	225,000.00	66,825.00	158,175.00	En Proceso	30%
Punta Pescadora 1	Aceras Y Contenes.	250,000.00	170,293.50	79,706.50	En Proceso	68%
Punta Pescadora 2	Electrificación.	235,000.00	69,795.00	165,205.00	En Proceso	30%
Restauración 1	Badenes.	100,000.00	44,550.00	55,450.00	En Proceso	45%
Restauración 1	Donaciones.	150,000.00	-	150,000.00	Pendiente	0%
Restauración 2	Badenes.	250,000.00	103,950.00	146,050.00	En Proceso	42%
Retiro 23	Aceras Y Contenes.	200,000.00	51,949.97	148,050.03	En Proceso	26%
San Antón	Bacheo.	150,000.00	130,693.50	19,306.50	En Proceso	87%
San Antón	Electrificación.	100,000.00	69,300.00	30,700.00	En Proceso	69%
Sarmiento 2	Imbornales.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Sarmiento 2	Alcantarillado.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Sector Bienvenido.	Electrificación.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
Sector Bienvenido.	Centro Comunal	150,000.00	42,697.49	107,302.51	En Proceso	28%
Sector Cristo Rey	Electrificación.	150,000.00	44,550.00	105,450.00	En Proceso	30%
Sector Cristo Rey	Bacheo.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
URB. MALLÉN	Reparación de Parque.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
URB. MALLÉN	Imbornales.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Urb. Oriental.	ACERAS Y CONTENES.	225,000.00	-	225,000.00	Pendiente	0%
Urb. Petropolis	Imbornales	200,000.00	59,192.10	140,807.90	En Proceso	30%
Urbanización Marina.	Aceras Y Contenes.	200,000.00	53,070.34	146,929.66	En Proceso	27%
Urbanización Titán	Reparación Cisterna	225,000.00	-	225,000.00	Pendiente	0%
Vega /Batey Central	Badenes.	200,000.00	56,430.00	143,570.00	En Proceso	28%
Villa Maranatha.	Imbornales	250,000.00	73,990.12	176,009.88	En Proceso	30%
Villa Providencia 2	Aceras y Contenes.	200,000.00	54,803.74	145,196.26	En Proceso	27%
Villa Azucarera 1	Imbornales.	110,000.00	32,555.65	77,444.35	En Proceso	30%
Villa Azucarera 1	Badenes.	110,000.00	31,036.50	78,963.50	En Proceso	28%
Villa Azucarera 2	Imbornales.	110,000.00	32,555.65	77,444.35	En Proceso	30%
Villa Azucarera 2	Badenes.	110,000.00	32,670.00	77,330.00	En Proceso	30%
Villa Bendición.	Reparación de la entrada.	130,000.00	-	130,000.00	Pendiente	0%
Villa Bendición.	Bacheo.	100,000.00	28,596.16	71,403.84	En Proceso	29%
Villa Blanca	Centro Comunal.	240,000.00	-	240,000.00	Pendiente	0%
Villa Cañera	Aceras Y Contenes.	100,000.00	29,492.10	70,507.90	En Proceso	29%
Villa Cañera	Imbornales.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
Villa Centro	Badenes.	230,000.00	102,960.00	127,040.00	En Proceso	45%
Villa Cesariana	Bacheo en Tosca.	250,000.00	74,250.00	175,750.00	En Proceso	30%
Villa Coral	Electrificación	230,000.00	68,310.00	161,690.00	En Proceso	30%
Villa España	Electrificación.	140,000.00	41,580.00	98,420.00	En Proceso	30%
Villa España	Señalización.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Villa Hermosa	Aceras Y Contenes.	220,000.00	57,251.56	162,748.44	En Proceso	26%
Villa Magdalena	Aceras y Contenes.	110,000.00	29,700.00	80,300.00	En Proceso	27%
Villa Magdalena	Badenes.	100,000.00	26,451.31	73,548.69	En Proceso	26%
Villa México	Electrificación.	225,000.00	66,825.00	158,175.00	En Proceso	30%
Villa Municipal	Cementación de Callejón.	100,000.00	59,700.00	40,300.00	En Proceso	60%
Villa Municipal	Imbornales.	100,000.00	62,087.33	37,912.67	En Proceso	62%

Sector	Nombre de la Obras.	Valor	Total Ejec.	Total Pte.	Status	% Ejecutado
Villa Olímpica 2	Badenes.	220,000.00	95,040.00	124,960.00	En Proceso	43%
Villa Orilla	Contenes.	225,000.00	66,825.00	158,175.00	En Proceso	30%
Villa Progreso 1	Construcción de Imbornales.	125,000.00	37,125.00	87,875.00	En Proceso	30%
Villa Progreso 1	Badenes	125,000.00	36,865.12	88,134.88	En Proceso	29%
Villa Progreso 2	Contenes.	125,000.00	32,661.57	92,338.43	En Proceso	26%
Villa Progreso 2	Electrificación.	125,000.00	37,125.00	87,875.00	En Proceso	30%
Villa Providencia 1	Aceras y Contenes.	200,000.00	54,051.90	145,948.10	En Proceso	27%
Villa Velásquez	Aceras Y contenes.	225,000.00	-	225,000.00	Pendiente	0%
Villa Visan	Iluminación.	125,000.00	37,125.00	87,875.00	En Proceso	30%
Villa Visan	Señalización.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
PP-2026		30,000,000.00	8,867,524.32	21,132,475.68		


Batey Angelina	Bacheo	489,000.00	489,000.00	-	Terminada	100%
Batey Angelina	Bacheo	250,000.00	250,000.00	-	Terminada	100%
Batey Esperanza	Reparación del Play	313,200.00	313,200.00	-	Terminada	100%
Batey La Laura	Iluminación	120,000.00	120,000.00	-	Terminada	100%
Bo. Santa Clara	Aceras Y Contenes	90,000.00	90,000.00	-	Terminada	100%
Boca Del Soco	Aceras Y Contenes	160,000.00	160,000.00	-	Terminada	100%
Brisas del Este	Aceras Y Contenes	120,000.00	120,000.00	-	Terminada	100%
Buenos Aires 2	Aceras Y Contenes	96,000.00	96,000.00	-	Terminada	100%
Buenos Aires/El Patio	Bacheo	245,000.00	245,000.00	-	Terminada	100%
Callejón Ortiz	Badenes	227,200.00	227,200.00	-	Terminada	100%
El Ocho	Aceras Y Contenes	80,000.00	80,000.00	-	Terminada	100%
El Peñon	Aceras Y Contenes	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
EL TOCONAL	Centro Comunal	211,200.00	211,200.00	-	Terminada	100%
Filipina	Aceras Y Contenes	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
Independencia	Aceras Y Contenes	211,200.00	211,200.00	-	Terminada	100%
Independencia	Aceras Y Contenes	80,000.00	80,000.00	-	Terminada	100%
La Belleza 1	Bacheo	65,764.71	65,764.71	-	Terminada	100%
La Primavera	Drenaje Pluvial.	211,200.00	211,200.00	-	Terminada	100%
La Primavera	Drenaje Pluvial.	160,000.00	160,000.00	-	Terminada	100%
Los Bomberito.	Aceras Y Contenes	180,000.00	180,000.00	-	Terminada	100%
Los Transformadores	Aceras Y Contenes	180,000.00	180,000.00	-	Terminada	100%
Naime 1	Aceras Y Contenes	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
Naime 2	Aceras Y Contenes	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
Nuevo Amanecer	Bacheo	145,000.00	145,000.00	-	Terminada	100%
Pedro Justo Carrión 1	Centro Comunal	271,200.00	271,200.00	-	Terminada	100%
Plan Porvenir (Los Cajones)	Plazoleta	211,200.00	211,200.00	-	Terminada	100%
Plan Porvenir (Los Cajones)	Cancha	80,000.00	80,000.00	-	Terminada	100%
Punta Percadora 1	Aceras Y Contenes	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
Punta Pescadora	Bacheo	235,000.00	235,000.00	-	Terminada	100%
Restauración 2	Aceras Y Contenes	100,000.00	100,000.00	-	Terminada	100%
San Antón	Bacheo	1,146.23	1,146.23	-	Terminada	100%
San Antón	Bacheo	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
Sector Bienvenido.	Centro Comunal	343,200.00	343,200.00	-	Terminada	100%
Sector Bienvenido.	Aceras Y Contenes	120,000.00	120,000.00	-	Terminada	100%
Sector El Centro	Aceras Y Contenes	160,000.00	160,000.00	-	Terminada	100%
Urbanización Marina.	Centro Comunal	160,000.00	160,000.00	-	Terminada	100%
Urbanización Marina.	Verja Perimetral	191,200.00	191,200.00	-	Terminada	100%
Urbanización Oriental	Aceras Y Contenes	160,000.00	160,000.00	-	Terminada	100%
Urbanización Oriental	Badenes	235,200.00	235,200.00	-	Terminada	100%
Villa Cesarina	Bacheo	170,000.00	170,000.00	-	Terminada	100%
Villa Coral	Aceras Y Contenes	184,000.00	184,000.00	-	Terminada	100%
Villa Faro	Bacheo	100,000.00	100,000.00	-	Terminada	100%
Villa Faro 1	Badenes	80,000.00	80,000.00	-	Terminada	100%
Villa Hermosa	Aceras Y Contenes	131,200.00	131,200.00	-	Terminada	100%
Villa Hermosa	Aceras Y Contenes	160,000.00	160,000.00	-	Terminada	100%
Villa Magdalena	Aceras Y Contenes	184,000.00	184,000.00	-	Terminada	100%
Villa Olímpica 1	Drenaje	291,200.00	291,200.00	-	Terminada	100%
Villa Orilla	Aceras Y Contenes	180,000.00	180,000.00	-	Terminada	100%
Villa Providencia 1	Aceras Y Contenes	80,000.00	80,000.00	-	Terminada	100%
Villa Providencia 2	Aceras Y Contenes	160,000.00	160,000.00	-	Terminada	100%
Villa Velásquez	Cancha	158,400.00	158,400.00	-	Terminada	100%


Pend. PP-2025

8,981,710.94	8,981,710.94	-
--------------	--------------	---

Total General

38,981,710.94	17,849,235.26	21,132,475.68
---------------	---------------	---------------

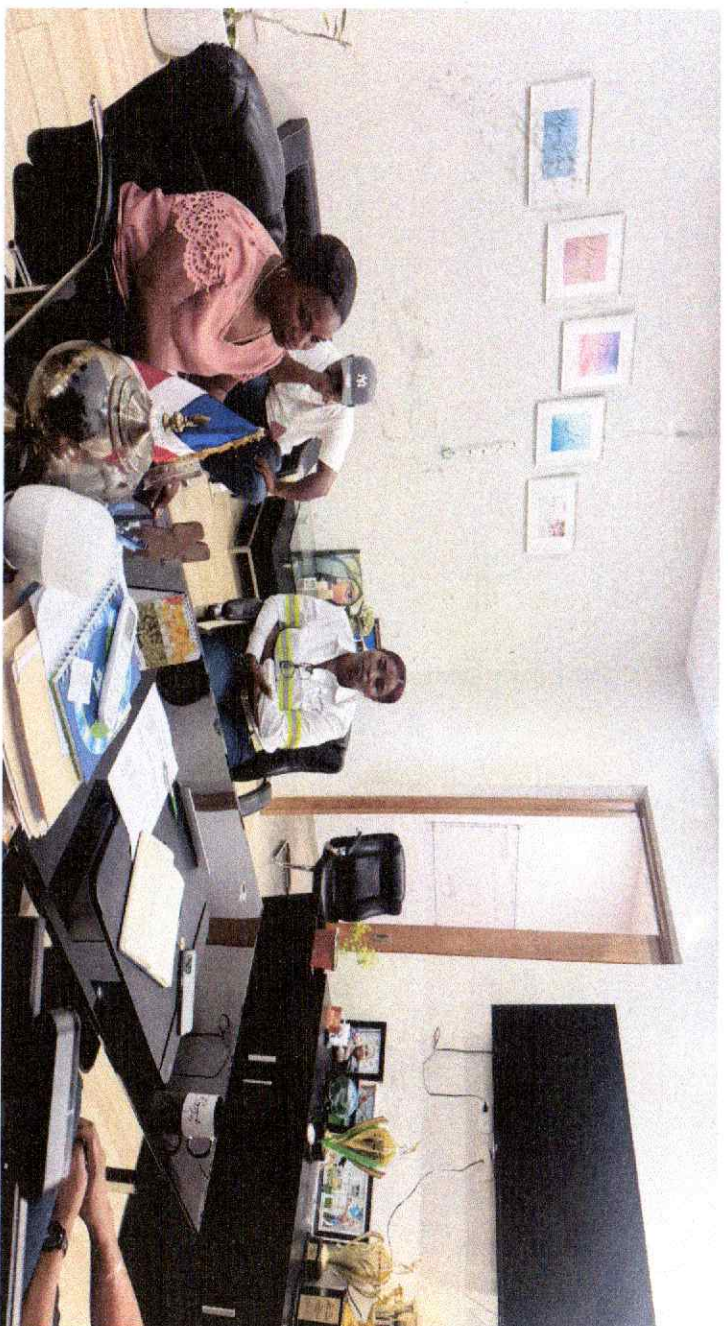

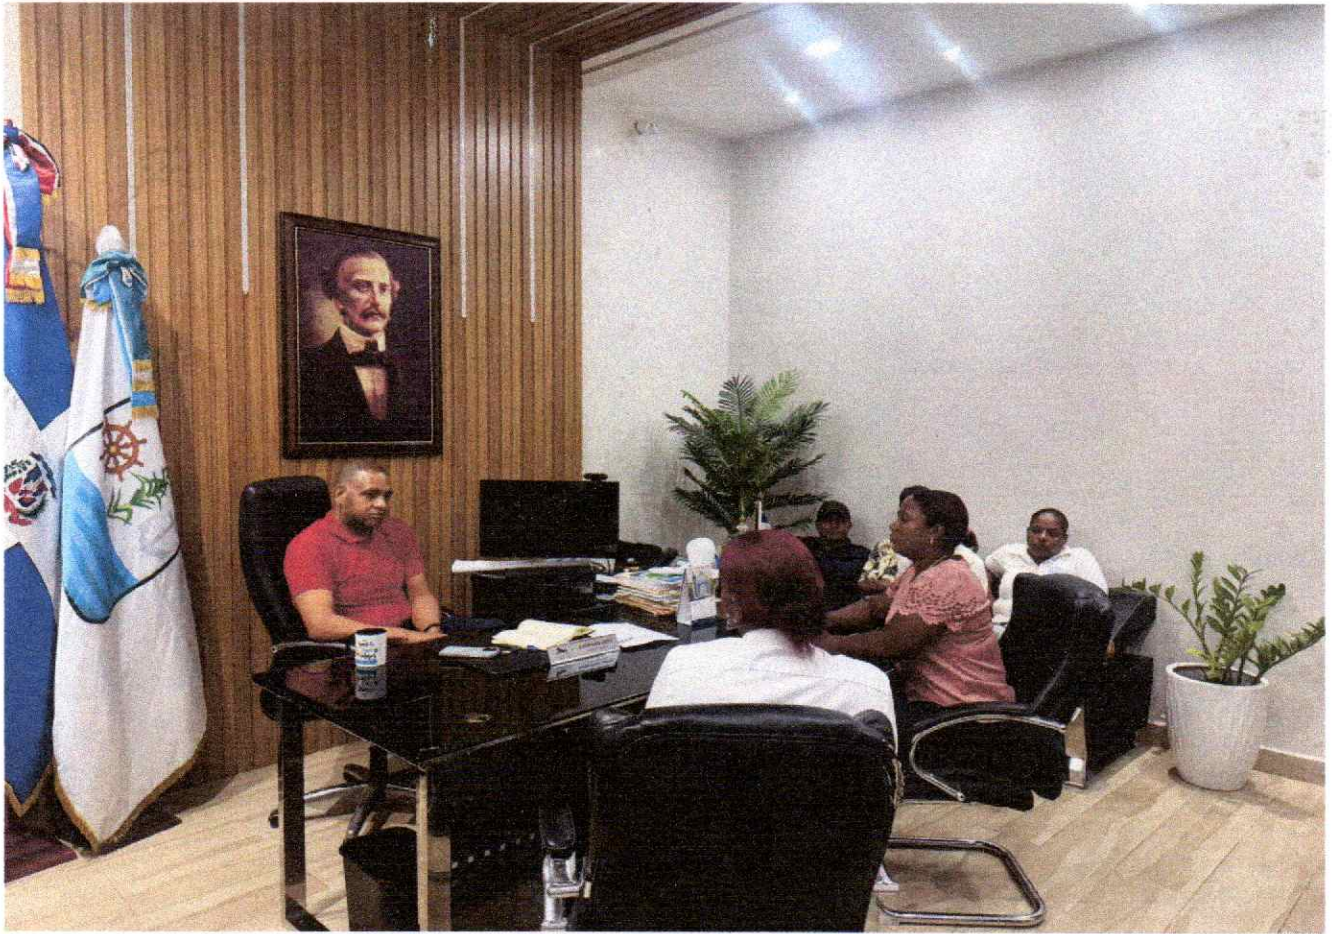



ALCALDÍA
SAN PEDRO
DE MACORÍS
GESTIÓN 2020-2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORÍS


Avenida Anacaona Moscoso #1, San Pedro de Macorís

Tel.: 1-809-529-7815, <https://ayuntamientosanpedro.gob.do/>



Fecha 26/6/2026

ASISTENCIA A REUNION							
No.	Nombre y Apellido	Género	Institución	Area	Cargo	Teléfono	Firma
1	Freisis Encarnación	F	Santa de Vitoria	Villa Blanca	Presidente	8092579343	Freisis Encarnación
2	Julio Reyes	M	' ' '	Villa Olímpica	Presidente	8299168012	
3	Alcemió Mota	M	' ' '	Angelina	Delegado	8296217154	
4	Julio Goyos	M	' ' '	D. Pañón	Delegado	829333457	
5	Arismeyda Contrera	M	' ' '	Restauración	Delegado	8298710499	
6	Jesica Romero	F	' ' '	San Antón	Delegado	8297141508	
7	Santiago de la Cruz	M	' ' '	Poblenuevo	Delegado	8092579735	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							


Lenny Yumilka Valdez
Coord. Presupuesto Participativo




Freisis Encarnación
Ptes Comité de Seguimiento

