



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
RNC430009059

17/7/2026

Informe de rendición de cuenta semestral al comité de seguimiento y grupos vulnerables presupuesto participativo 2026
Ayuntamiento San Antonio De Guerra
Periodo: enero –junio 2026
Fecha de presentación: junio 2026

1. Introducción

2.

Este informe tiene como objetivo presentar los resultados de la ejecución de los proyectos del presupuesto participativo identificados para responder a las necesidades específicas de grupos vulnerables en el municipio de San Antonio de Guerra durante el primer semestre del 202. Se busca garantizar la transparencia y rendición de cuentas ante el comité de seguimiento y control municipal y los colectivos específicos involucrados.

3. Contexto

El presupuesto participativo es una herramienta que permite a la comunidad participar en la toma de decisiones sobre la asignación de los recursos públicos. En este semestre, se priorizaron proyectos que abordan las necesidades de grupos vulnerables, incluyendo mujeres jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

4. Proyectos Identificados y Estado de Ejecución

A continuación, se detallan los proyectos identificados, sus presupuestos asignados, nivel y comentarios relevantes:



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA

RNC430009059

Reporte semestral al comité de seguimiento especificado de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros) De la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2026.

Enero -junio 2026

1ER Semestre 2026

Obras las	Ubicación	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACI ON
		ESTIMADO	EJECUTADO	Termina100%	Menos 80%	mas50%	sin	
Aceras y contenes	Nuevo paraíso	RD\$300,000.00	RD\$				x	
Arreglo de caminos	Nicanor	RD\$250,000.00	RD\$250,000.00	x				
Eliminación de cañada o drenaje	Doña Julia	RD\$200,000.00	RD\$ 0.00				x	
Arreglo de caminos	Los martes	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00	x				
Aceras y contenes	Marcos del rosario	RD\$350,000.00	RD\$0.00				x	
Aceras y contenes	Proyecto guerra	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00			x		
Contenes	cocoba	RD\$ 200,000.00	RD\$0.00				x	
Aceras y contenes	La nueva esperanza	RD\$ 200,000.00	RD\$0.00				x	
Aceras y contenes	Quinto centenario	RD\$200.000.00	RD\$200,000.00		x			

Contenes	Fao 2	RD\$ 200,000.00	RD\$0.00				x	
Contenes	San Antonio	RD\$ 300,000.00	RD\$ 300,000.00			x		
Continuación del multiuso	El capacito	RD\$3000,000.00	RD\$0.00				x	
Filtrantes	Buro	RD\$200.000.00	RD\$0.00				x	
Arreglo de calle	Valentin	RD\$200.000.00	RD\$200.000.00	x				
Lámparas	Las parras	RD\$250.000.00	RD\$0.00				x	
Carpas y sillas	Santa María	RD\$250.000.00	RD\$ 0.00				x	
Aceras y contenes	Las barias	RD\$300.000.00	RD\$0.00				x	
Contenes	La joya	RD\$500.000.00	RD\$500.000.00	x				
Contenes	Tierra blanca	RD\$300.000.00	RD\$0.00				x	
Electrificación-lámparas	El Alto	RD\$200.000.00	RD\$0.00				x	
Reparación de viviendas	El Cachón	RD\$200.000.00	RD\$0.00				x	
Arreglo de calle	El torro naco	RD\$200.000.00	RD\$200.000.00	x				
Arreglo de calles	El mamon	RD\$350.000.00	RD\$350.000.00	x				
Continuación del multiuso	Bani concordia	RD\$300.000.00	RD\$0.00				x	
Arreglo de camino	El viso	RD\$300.000.00	RD\$300.000.00	x				
Aceras y contenes	Toro abajo	RD\$350.000.00	RD \$0.00				x	
Reparación de capilla	Bella vista	RD\$400.000.00	RD\$0.00				x	
Carpa, sillas y carderos	Mata caimito	RD\$300.000.00	RD\$ 0.00				x	
Arreglo de calles	Las piña	RD\$300.000.00	RD\$300.000.00	x				

Arreglo de calles	La pluma	RD\$300.000.00	RD\$ 0.00	x				
Aceras y contenes	cajuilito	RD\$300.000.00	RD\$300.000.00	x				
Arreglo de calles	Los Berroa	RD\$200.000.00	RD\$200.000.00	x				
Sillas y lona para carpas	El coquito	RD\$200.000.00	RD\$0.00				x	
Total		9,000,000.00%	3,700,000.00	27.27%	3.33%	9.09%	60.61%	100%

FRANCISCO ROJAS GARCIA

30 DE JULIO 2026

SELLO DEL AYUNTAMIENTO

Alcalde

Fecha

ADRIANA REYES MEJIA

30 DE JULIO

SELLO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Coordinador comité de seguimiento 2026

Fecha



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA

RNC430009059

5. Análisis de Ejecución:

- TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO: 9,000,000.00
- TOTAL OBRAS EJECUTAS: 9 (27.27%)
- TOTAL DE OBRAS EN PROCESO: 4 (12.12%)
- TOTAL OBRAS PENDIENTES: 20 (60.61%)

El análisis muestra que, a la fecha se ha ejecutado el 27.27% del presupuesto asignado, con un total de \$3,700,000.00 en obras completadas. Se identifican varias obras pendientes que requieren atención prioritaria en el próximo semestre.

6. Comentarios y recomendaciones

- Fortalecer la comunidad: Es fundamental mejorar la comunicación entre el ayuntamiento y los colectivos para asegurar que las necesidades de los grupos vulnerables sean adecuadamente representadas y atendidas.
 - Monitoreo continuo: Se recomienda establecer un sistema de monitoreo continuo para las obras en proceso y pendientes, asegurando que se cumplan a los plazos establecidos.
- Capacitación y sensibilización: se sugiere realizar talleres de capacitación y sensibilización sobre el uso del presupuesto participativo, especialmente dirigidos a grupos vulnerables.

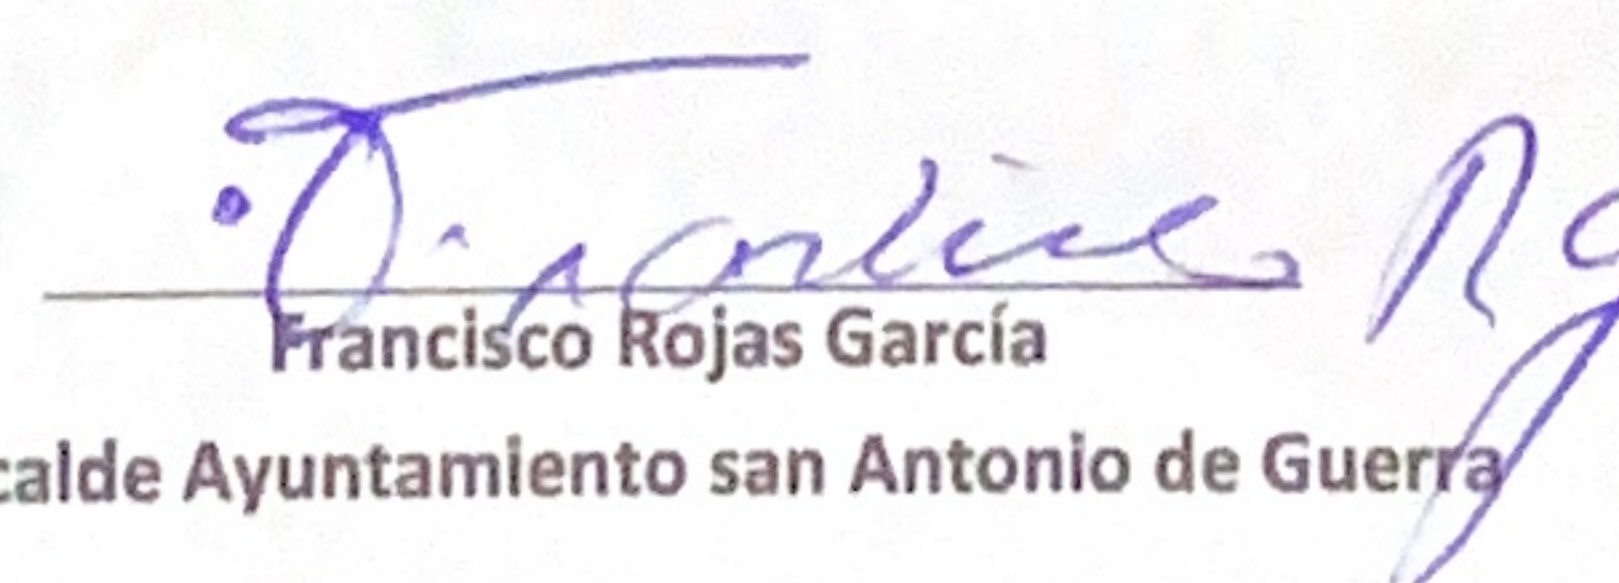
7. Conclusiones

El primer semestre de 2026 ha sido un periodo de avances significativo en la ejecución de proyectos del presupuesto participativo en San Antonio de Guerra. Sin embargo, es crucial continuar trabajando en las obras pendientes y fortalecer la participación de los grupos vulnerables en el proceso de toma de decisiones.

Elaborado por: Felipe Bautista Encargado de presupuesto participativo

Fecha de elaboración: junio 2026

Ayuntamiento de San Antonio de Guerra.


Francisco Rojas García
Alcalde Ayuntamiento san Antonio de Guerra





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026
PRIMER SEMESTRE DE EJECUCIÓN AÑO 2026
CIERRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Menos 80%	Más 50%	Sin iniciar	
1 Aceras y Contenes	Nuevo Paraíso	RD\$300,000.00	RD\$				X	
2 Arreglo de calles	Nicanor	RD\$250,000.00	RD\$250,000.00	X				
3 Eliminación de Cañada o Drenaje	Doña Julia	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
4 Arreglo de Caminos	Los Martes	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00	X				
5 Aceras y Contenes	Marcos del Rosario	RD\$350,000.00	RD\$0.00				X	
6 Aceras y Contenes	Proyecto Guerra	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00			X		
7 Contenes	Corcobada	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
8 Aceras y Contenes	La Nueva Esperanza	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
9 Aceras y Contenes	Quinto Centenario	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00		X			
# Contenes	Fao 2	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
# Contenes	San Antonio	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00			X		
# Continuación Multiuso	El Capacito	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X	
# Filtrantes	Buro	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
# Arreglo de Calles	Valentin	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X				
# Lamparas	Las Parras	RD\$250,000.00	RD\$0.00				X	
# Carpa y Sillas	Santa Maria	RD\$250,000.00	RD\$0.00				X	
# Aceras y Contenes	Las Barías	RD\$300,000.00	RD\$				X	
# Contenes	La Joya	RD\$500,000.00	RD\$500,000.00	X				
# Contenes	Tierra Blanca	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X	
# Electrificación - Lamparas	El Alto	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
# Reparación de Viviendas	El Cachon	RD\$200,000.00	RD\$0.00				X	
# Arreglo de calles	El Toro Naco	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X				
# Arreglo de Caminos	El Mamon	RD\$350,000.00	RD\$350,000.00	X				
# Continuación de Multiuso	Bani Concordia	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X	
# Arreglo de Camino	El Viso	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00	X				
# Aceras y Contenes	Toro Abajo	RD\$350,000.00	RD\$0.00				X	
# Reparación de Capilla	Bella Vista	RD\$400,000.00	RD\$0.00				X	
# Carpa, Sillas y Calderos	Mata Caimito	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X	
# Arreglo de Caminos	Las Piñas	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00	X				
# Arreglo de Camino	La Pluma	RD\$300,000.00	RD\$0.00				X	
# Aceras y Contenes	Cajuilito	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00			X		
# Arreglo de Camino	Los Berroas	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X				
# Sillas y Lonas para Carpa	El Coquito	RD\$200,000.00	RD\$				X	
TOTAL		RD\$9,000,000.00	RD\$3,700,000.00	27.27%	3.33%	9.09%	60.61%	100%



FRANCISCO ROJAS CARCRA

30 DE JUNIO 2026

Fecha

SELLO DE AYUNTAMIENTO

ADRIANA REYES MEJIA
Presidente Comité Seguimiento 2026

30 DE JUNIO 2026

Fecha

SELLO COMITÉ DE SEGUIMIENTO



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO 2026/JUNIO 2026

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, Año 2026

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	9	27.27%
Obras en proceso	4	12.12%
Obras pendientes	20	60.61%
TOTAL	33	100.00%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo 2026:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución
RDS\$9,000,000.00	RDS\$3,700,000.00	RDS\$5,300,000.00	27.27%



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
RNC430009059

FOTOS REUNION PRIMER SEMETRE PPM26





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA

RNC: 430-00905-9

Fecha



LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	TELEFONO
Adriano Chaves	Presidente	809 322 5546
Gregorio Moya	Secretario	829-6581239
Shanna Bellard	Miembro	849-383-4235
Auria Martinez	///	829-606-6326
Espejo	///	849 270 6580
Juana Castillo Sosa	miembro	829-298-9090
Nelson A. Guillermo	Miembro	808-905-0291
ERIKA GONZALEZ ROYA	miembro	829-566-4496
Yokusta Sunkema	miembro	829-794-9460
Renato Loran	Berrera Fabian	809 203 3697
Yenia A. Garcia	Miembro	829 489 -7863
Maria Marten	miembro	849. 350. 4299
José A. Pichardo	Miembro	849 385 05 26
Karolin Bautista	Secretaria	809-979-9275
Yarimar Perdomo	miembro	809-409-2891

[illegible]
