

FECHA:

28/06/2024

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** Hospital José De Jesús Jiménez Almonte

Área: Mantenimiento

Nombre de la Actividad: Seguimiento al plan de mantenimiento de preventivo en el EES

Código POA (Si aplica): HMJJA4.1.1.4.02

INTRODUCCIÓN

Este informe de mantenimiento detalla todos los mantenimientos preventivos y correctivos que se llevaron a cabo en la infraestructura y equipos en el centro hospitalario para brindar efectivamente todos los servicios que se ofertan, a la vez evitar la interrupción en la producción de estos servicios.

OBJETIVO DEL INFORME

Presentar los mantenimientos ejecutados a los equipos e infraestructura del Hospital José de Jesús Jiménez Almonte (Ensanche Libertad), garantizando la calidad en servicios de salud brindados eficientemente.

METODOLOGIA (Si aplica)

Informe escrito. Y como soporte, levantamiento de la información de: los formularios de solicitud de servicio de mantenimiento, petición de trabajo de mantenimiento, de equipos, formulario de inspección diaria a la planta eléctrica, incidencias tecnológicas, fotos, inspección de mobiliario e inspección a la infraestructura.

DESARROLLO / HALLAZGOS

A continuación presentamos los mantenimientos ejecutados en el mes de junio del 2024 en el centro:

1. Emergencias. Equipo: Reparación y revisión del laringoscopio. Se sustituyó el bombillo.



2. Internamiento, cirugía, rayos x: retoque de pintura de a los pie de suero..



Pies de suero, con retoque de pintura aplicado:



3. Infraestructura:

Inspección y recarga de extintores, realizado por el Patronato de Bomberos de Santiago en las siguientes áreas: Vacuna, Tuberculosis, pasillo del sótano, Sala de espera de consulta, internamiento, cirugía, laboratorio, los cuales tenían fecha de vencimiento en el mes de julio del 2024.





3.1 Trabajos eléctricos en diferentes áreas: Sustitución de toma corrientes en salas de internamiento tres y cinco, cambios de tictacs de las escaleras y zócalos.





3.2 Comedor. Cambio de llave al lavamanos:



3.3 Odontología: Cambio de breaker en la caja.



3.4 Azotea: revisión de desagües y desobstrucción de las mismas.



3.5 Baño salón de conferencias: destape de lavamanos.



4. Despensa: Mantenimiento correctivo a freezer. Sustitución de alambre quemado y limpieza del evaporador.




5. Emergencias. Mantenimientos profundos con hidrolavadora a los aires acondicionados.



Odontología. Mantenimiento profundo de limpieza con hidrolavadora



Farmacia Interna:

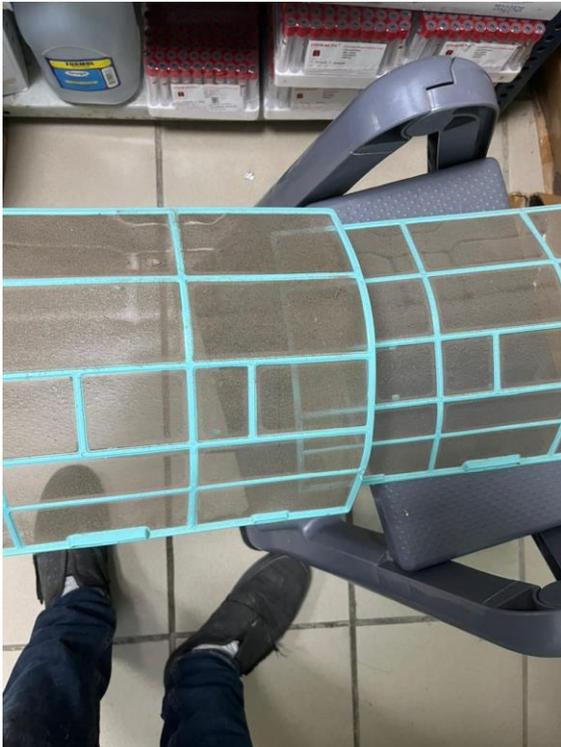

Asimismo se realizó:

- Inspección diaria a la planta eléctrica verificando su funcionalidad, y se abasteció el nivel de combustible al tanque de la planta.
- Inspección y dosificación de cloro a la cisterna.
- Inspección y mantenimiento al Ascensor.
- Inspección al inversor y las 16 baterías.
- Mantenimientos a los soportes tecnológicos reportados.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Reducir el número de averías, continuar con los mantenimientos planificados para salvaguardar la infraestructura y mantener la vida útil de los equipos en estado óptimo.

RECOMENDACIONES

- Continuar con la concientización del uso adecuado y con conciencia tanto de los equipos como de las instalaciones del centro a los usuarios internos y externos del hospital.
- Seguir con la ejecución del plan programado.
- Es indispensable el nombramiento de al menos dos o personas más para el área de mantenimiento, ya que solo contamos con dos personas que no dan abasto con los mantenimientos programados y los que surgen día a día que se deben corregir de manera casi inmediata.

ANEXOS (Si aplica)

Instrucciones de llenado:

***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Federico Madera
Enc. De Mantenimiento

Elaborado por
(Nombre y apellido)

Lugar de destino:	Hosp. José de Jesús Jiménez	Fecha de visita:	25-6-2024
Personal visitante:	Federico Urdueña	Propósito de la asignación:	Preventivo correctivo

Área	Mobiliario	Cumple/No cumple	Condición del mobiliario
------	------------	------------------	--------------------------

Imágenes	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
	Bancadas	C	
Esterilización	Sillas secretariales	N/A	
Internamiento	Mesas de Comer	C	Faltan algunas
	Sillon Acompañante	C	Faltan sillas
	Mesa de Noche	C	
Laboratorio	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
	Bancadas	C	
Neonatología, UCIN	Sillas secretariales		
	Escritorios		
	Bancadas		
Quirófanos/ Partos	Bancadas	C	Falta sala parto quirófano
	Sillas secretariales	C	
Emergencia	Bancadas	C	
	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	Faltan algunos
Unidad de Cuidados Intensivos	Sillas secretariales	N/A	
Odontología	Sillas secretariales	C	
Cocina	Sillas	C	
	Mesas	C	
Consultorios	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
	Bancadas	C	

Federico Urdueña



Fecha: 19, 6, 2024

Informaciones Generales


Establecimiento de Salud: Hospital Jesu' de Jesús Jiménez Aburto
 Servicio Regional de Salud: Norcentral Provincia: Santiago
 Nombre Enc. De Mantenimiento: Federico Madera Teléfono: 809-55-8086

	Bueno	Regular	Malo	N/A
01. Accesibilidad a personas discapacitadas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02. Accesibilidad ambulancia área emergencia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03. Condición aceras perimetrales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04. Condición almacén de alimentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05. Condición áreas asépticas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06. Condición revestimiento fachada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07. Condición de baños	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 Existencia búmpers y esquineros	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09. Condición de cisterna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Condición caseta de desechos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Condición caseta de planta eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Cocina: Limpieza, Olor y Condición	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Condición de pisos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Control de plagas y animales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Condiciones de aires acondicionados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Disposición de desechos/mobiliario inservible	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Disposición y estado de zafacones	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Disposición del cableado eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Canalización aguas pluviales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Canalización aguas residuales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Condición de mobiliarios	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Condición área de parqueos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 Condición de las ventanas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 Condición de puertas y llavines	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25 Condición área esterilización	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Bueno	Regular	Malo	N/A
26. Condición protección hierro, puertas y ventanas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Iluminación exterior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. Iluminación interior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29. Iluminación acceso a emergencia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Condición y limpieza área lavandería	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31. Condición letreros identificativos/informativos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32. Limpieza en techos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33. Limpieza área exterior en general	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34 Limpieza área interior en general	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35 Condición de áreas verdes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
36 Condición y limpieza área morgue	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37 Existencia olores desagradables en el ambiente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38 Condición de pintura exterior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39 Condición de pintura interior	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40 Condición de sistema contra incendios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41 Ruta de evacuación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42 Ruta para desechos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43 Rutas de acceso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44 Suministro de agua en general	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45 Condición de verja perimetral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
46 Filtraciones	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47 Condición de plafón en general	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Resultados	
Total bueno	35
Total regular	10
Total malo	0

Firma Supervisor: Federico Madera





Lugar de destino: <i>Hsp. José de San Martín</i> Personal visitante: <i>Fabián Ramírez</i>	Fecha de visita: <i>28/09/2024</i> Propósito de la asignación: <i>Inspección</i>
---	---

De la estructura:				
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	C		
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	C		ger nivel
3	Terminación de paredes, Pañete	C		ger nivel
4	Presencia de insectos en edificación	C		ger nivel
5	Terminación de Techos	C		ger nivel
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	C	<i>Revisado Baños</i>	ger nivel
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	<i>N/A</i>		u u
8	Funcionamiento planta eléctrica	C		ger nivel
9	Funcionamiento de UPS	C		ger nivel
10	Terminación general de piso	C		ger nivel
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de Área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	C		u t
12	Señalización institucional	C		
13	Señalización Ruta de evacuación	C		ger nivel
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	C		ger nivel
15	Disponibilidad de Parqueos	C		
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	C		
17	Revisión de Líquenos en Equipos de Aires Acondicionados	C		u 0
18	Revisión de Sistema de Cámaras	C		u d
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	C		
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	C		
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	C		ger nivel
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	<i>N/A</i>	<i>Revisado</i>	ger nivel
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	<i>N/A</i>		
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LED's e Iluminación General	C		u u
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	C		
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se instalan los Equipos Médicos	<i>N/A</i>		ger nivel
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	<i>N/A</i>		
28	Revisión de Salida de Gases	<i>N/A</i>		
29	Revisión de Caseta de Gases	<i>N/A</i>		
30	Revisión de Data	<i>N/A</i>		
31	Condiciones Sala de Espera	C		ger nivel
32	Condiciones Baños	C		
33	Limpieza Continua	C		
34	Áreas Exteriores	C		



FABRIZIO AN




Formulario Inspección de Infraestructura Física

DADM-FO-008 Versión: 02
Fecha de aprobación: 17/01/2019

Lugar de destino: <i>Hosp. Jose A. Barrantes</i>	Fecha de visita: <i>25/6/2024</i>
Personal visitante: <i>Francisco Indaco</i>	Propósito de la asignación:

De la estructura:				
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	C		
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	C		2 ^{do} Nivel
3	Terminación de paredes, Pañete	C		
4	Presencia de insectos en edificación	C		
5	Terminación de Techos	C		
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	C	<i>Baranda Bulto</i>	2 ^{do} Nivel
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	N/A		
8	Funcionamiento planta eléctrica	C		
9	Funcionamiento de UPS	N/A		
10	Terminación general de piso	N/A	<i>cargue</i>	
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	C		2 ^{do} Nivel
12	Señalización institucional	C		
13	Señalización Ruta de evacuación	C		2 ^{do} Nivel
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	C		2 ^{do} Nivel
15	Disponibilidad de Parquesos	N/A		
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	C		
17	Revisión de Líquenos en Equipos de Aires Acondicionados	C		2 ^{do} Nivel
18	Revisión de Sistema de Cámaras	C		
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	C		2 ^{do} Nivel
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	C		2 ^{do} Nivel
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	C		
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	N/A	<i>ver sistema de ventanas</i>	2 ^{do} Nivel
23	Revisión de Aplicación de Aseptico	N/A	<i>ver sistema de aseptico</i>	2 ^{do} Nivel
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LED's e Iluminación General	C		
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	C		2 ^{do} Nivel
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	N/A		
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	C		2 ^{do} Nivel
28	Revisión de Salida de Gases	N/A		
29	Revisión de Caseta de Gases	N/A		
30	Revisión de Data	N/A		
31	Condiciones Salas de Espera	C		
32	Condiciones Baños	C		
33	Limpieza Continua	N/A		
34	Áreas Exteriores	N/A		2 ^{do} Nivel



Francisco Indaco



Lugar de destino:	HOP. José S. Junco	Fecha de visita:	26/6/2024
Personal visitante:	Federico Madariaga	Propósito de la asignación:	CONTRUCCION PREVENTIVO

De la estructura:				
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	N/C	fundada	
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	C		3er Nivel
3	Terminación de paredes, Pañete	C		
4	Presencia de insectos en edificación	C		
5	Terminación de Techos	C		
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	C	Baranda	3er Nivel
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	N/A		
8	Funcionamiento planta eléctrica	C		4 4
9	Funcionamiento de UPS	C		
10	Terminación general de piso	C		
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	N/A		3er Nivel
12	Señalización institucional	C		
13	Señalización Ruta de evacuación	C		
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	C		4 4
15	Disponibilidad de Parques	N/A		
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	C		3er Nivel
17	Revisión de Líquidos en Equipos de Aires Acondicionados	C		
18	Revisión de Sistema de Cámaras	C		
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	C		4 4
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	C		3er Nivel
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	N/A		
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	C		
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	N/A		4 4
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	C	Cambios Capataces	3er Nivel
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	C		4 4
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	N/A		3er Nivel
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	C		
28	Revisión de Salida de Gases	N/A		
29	Revisión de Caseta de Gases	N/A		3er Nivel
30	Revisión de Data	N/A		
31	Condiciones Salas de Espera	C		3er Nivel
32	Condiciones Baños	C		
33	Limpieza Continua	C		
34	Áreas Exteriores	N/A		

Federico Madariaga







Formulario Inspección de Infraestructura Física

DADM-FO-008 Versión: 02
Fecha de aprobación: 17/01/2019

Lugar de destino:	Hosp. Jose B. Limberg	Fecha de visita:	27/01/2024
Personal visitante:	Fabián Rodríguez	Propósito de la asignación:	completar plan de mantenimiento

De la estructura:

No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	N/C	cuando	
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	C		4to nivel
3	Terminación de paredes, Pañete	C		
4	Presencia de insectos en edificación	C		(((
5	Terminación de Techos	C		
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	C	faltan barandas	4to nivel
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	N/A		
8	Funcionamiento planta eléctrica	C		4to nivel
9	Funcionamiento de UPS	N/A		
10	Terminación general de piso	C		
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	N/A		4to nivel
12	Señalización institucional	C		
13	Señalización Ruta de evacuación	C		
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	C		4to nivel
15	Disponibilidad de Parqueos	C		
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	C		4to nivel
17	Revisión de Líquenos en Equipos de Aires Acondicionados	C		4to nivel
18	Revisión de Sistema de Cámaras	C		4to nivel
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	C		
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	C		4to nivel
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	N/A		4to nivel
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	C		4to nivel
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	N/C		
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	C		4to nivel
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	C		4to nivel
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se instalan los Equipos Médicos	N/A		4to nivel
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	N/A		4to nivel
28	Revisión de Salida de Gases	N/A		
29	Revisión de Caseta de Gases	N/A		
30	Revisión de Data	N/A		
31	Condiciones Salas de Espera	N/A		4to nivel
32	Condiciones Baños	C		
33	Limpieza Continua	C		
34	Áreas Exteriores	N/A		

PROSTROO con



Lugar de destino:	Fecha de visita:
Personal visitante:	Propósito de la asignación:

De la estructura:				
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	N/C	N/C	Sotano
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	C		Sotano
3	Terminación de paredes, Pañete	C		U 4
4	Presencia de insectos en edificación	C		Sotano
5	Terminación de Techos	C		Sotano
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	C		U 4
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	C		Sotano
8	Funcionamiento planta eléctrica	C		Sotano
9	Funcionamiento de UPS	C		Sotano
10	Terminación general de piso	C		U 4
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de Área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	N/A		Sotano
12	Señalización institucional	C		Sotano
13	Señalización Ruta de evacuación	C		U 4
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	C		U 4
15	Disponibilidad de Parquesos	N/A		Sotano
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	N/C	inundación	Sotano
17	Revisión de Líquenos en Equipos de Aires Acondicionados	C		Sotano
18	Revisión de Sistema de Cámaras	C		Sotano
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	C		U 6
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	C		U 11
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	N/A		Sotano
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	C		Sotano
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	N/A		U 6
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LED's e Iluminación General	C		Sotano
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	C		Sotano
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se instalan los Equipos Médicos	N/A		U 9
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	C		Sotano
28	Revisión de Salida de Gases	N/A		Sotano
29	Revisión de Caseta de Gases	N/A		Sotano
30	Revisión de Data	N/A		Sotano
31	Condiciones Salas de Espera	C		Sotano
32	Condiciones Baños	C		Sotano
33	Limpieza Continua	C		Sotano
34	Áreas Exteriores	N/A		U 1

Filtración proveniente de fuera del hospital invade el sotano.



REGISTRO QUE SE LLENA FUERA DEL HOSPITAL E INUNDA EL SOTANO



