

FECHA: Octubre 2024

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (HGENSA).

Área: Servicios Generales y Mantenimiento.

Nombre de la Actividad: Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS

Código POA (Si aplica): 4.1.1.4.02

INTRODUCCIÓN

En el presente informe mostramos las evidencias de los mantenimientos tanto preventivos como correctivos, realizados en el 2do semestre del año 2024, por la Gerencia de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital General y de Especialidades.

OBJETIVO DEL INFORME

Mostrar las evidencias de la realización de las actividades programadas, dando a conocer la metodología, el desarrollo y los resultados de las mismas.

De igual forma puntualizar las actividades que fueron pospuestas y las razones por las cuales fueron pospuestas, o adelantadas.

METODOLOGIA (Si aplica)

Tomamos en cuenta el tiempo pautado entre mantenimientos según el plan de mantenimiento de equipos e infraestructura 2024.

Los puntos a tomar en cuenta al realizar dichas actividades.

El activo humano para realizar dichas actividades, contemplando compañías externas como personal de mantenimiento.

DESARROLLO / HALLAZGOS

Seguimiento a la implementación del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura.
4.1.1.4.02

Octubre 2024:

-Verificación de baterías del generador #1

*Revisión del estado.

*Examen de los bornes, engrase.

*Revisar el estado de carga (voltaje).

-Verificación de baterías del generador #2

*Revisión del estado

*Examen de los bornes, engrase.

*Revisión el estado de carga (voltaje).



Mantenimiento del generador #1.

Este mantenimiento estaba programado para las 2674, sin embargo se reprogramó para 2609.9 hrs. Ya que estamos generando con este solo generador.


Actividades realizadas:

Cambio de filtros de aceite del motor, aire, y combustible.

Cambio del refrigerante existente y rellenar.

Sacar el aceite existente y rellenar.

Verificación y apriete.
Prueba de aislamiento térmica.

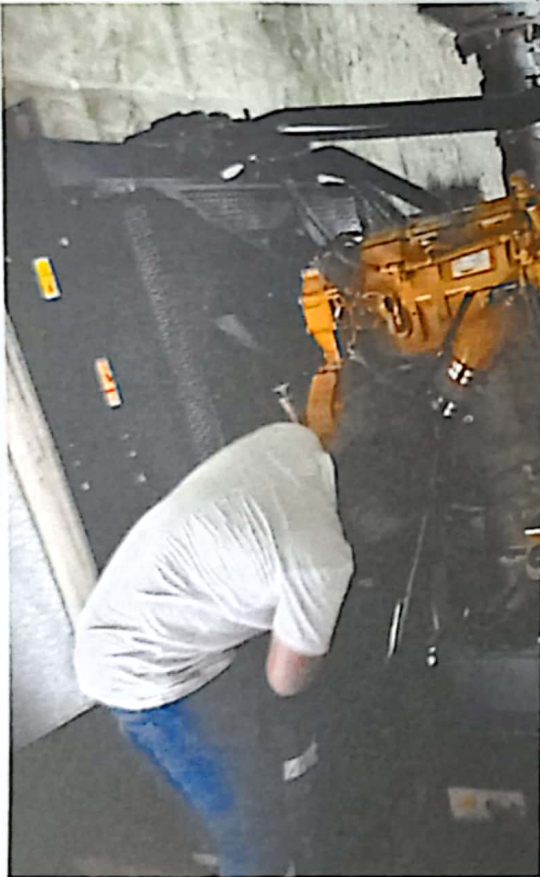

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Para realizar el mantenimiento preventivo tanto de equipos como infraestructura debemos contar con todos los insumos necesarios, tanto materiales como colaboradores, de lo contrario sería imposible realizar un seguimiento y ejecución efectiva, de acuerdo a estos parámetros.

RECOMENDACIONES

ANEXOS (Si aplica)

Anexamos listado de participación

Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Natanael Mejía

Elaborado por
(Nombre y apellido)



